

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 146192
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elektricien@jellegysmans.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5726358
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 18/01/2022

Afdeling: ELE

Keuring elektrisch
N° 44

JANUARI 2022



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

GYSEMANS JELLE
TOREKENSVELDEN 33
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 526 MICHIELS ERWIN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN CAMP Adres: BOSSTRAAT 42 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861
Installateur/verantw. werk: Naam: GYSEMANS JELLE Adres: TOREKENSVELDEN 33 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861 B.T.W.:
Adres installatie: VAN CAMP BOSSTRAAT 44B ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Nog toe te wijzen Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 14/01/2022 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/01/2047

Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Te voorzien DNB Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 12

Zie schema in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,16 MOhm Spreidingsweerstand: 23,7 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
- De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
- De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 146192
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elektricien@jellegysmans.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5569415
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/03/2021

Klant / Opdrachtgever:

GYSEMANS JELLE
TOREKENSVELDEN 33
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS (Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie (uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 526 MICHIELS ERWIN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: VAN CAMP Adres: BOSSTRAAT 44A ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861
Installateur/verantw. werk: Naam: GYSEMANS JELLE Adres: TOREKENSVELDEN 33 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861 B.T.W.:
Adres installatie: VAN CAMP BOSSTRAAT 44A ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 2861 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: N/A Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
Kies een item.

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 23/03/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/03/2046 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 25A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: / doorsnede: / mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/30mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 14

Zie schema in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 2,74 MOhm Spreidingsweerstand: 1,7 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE-en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.


De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

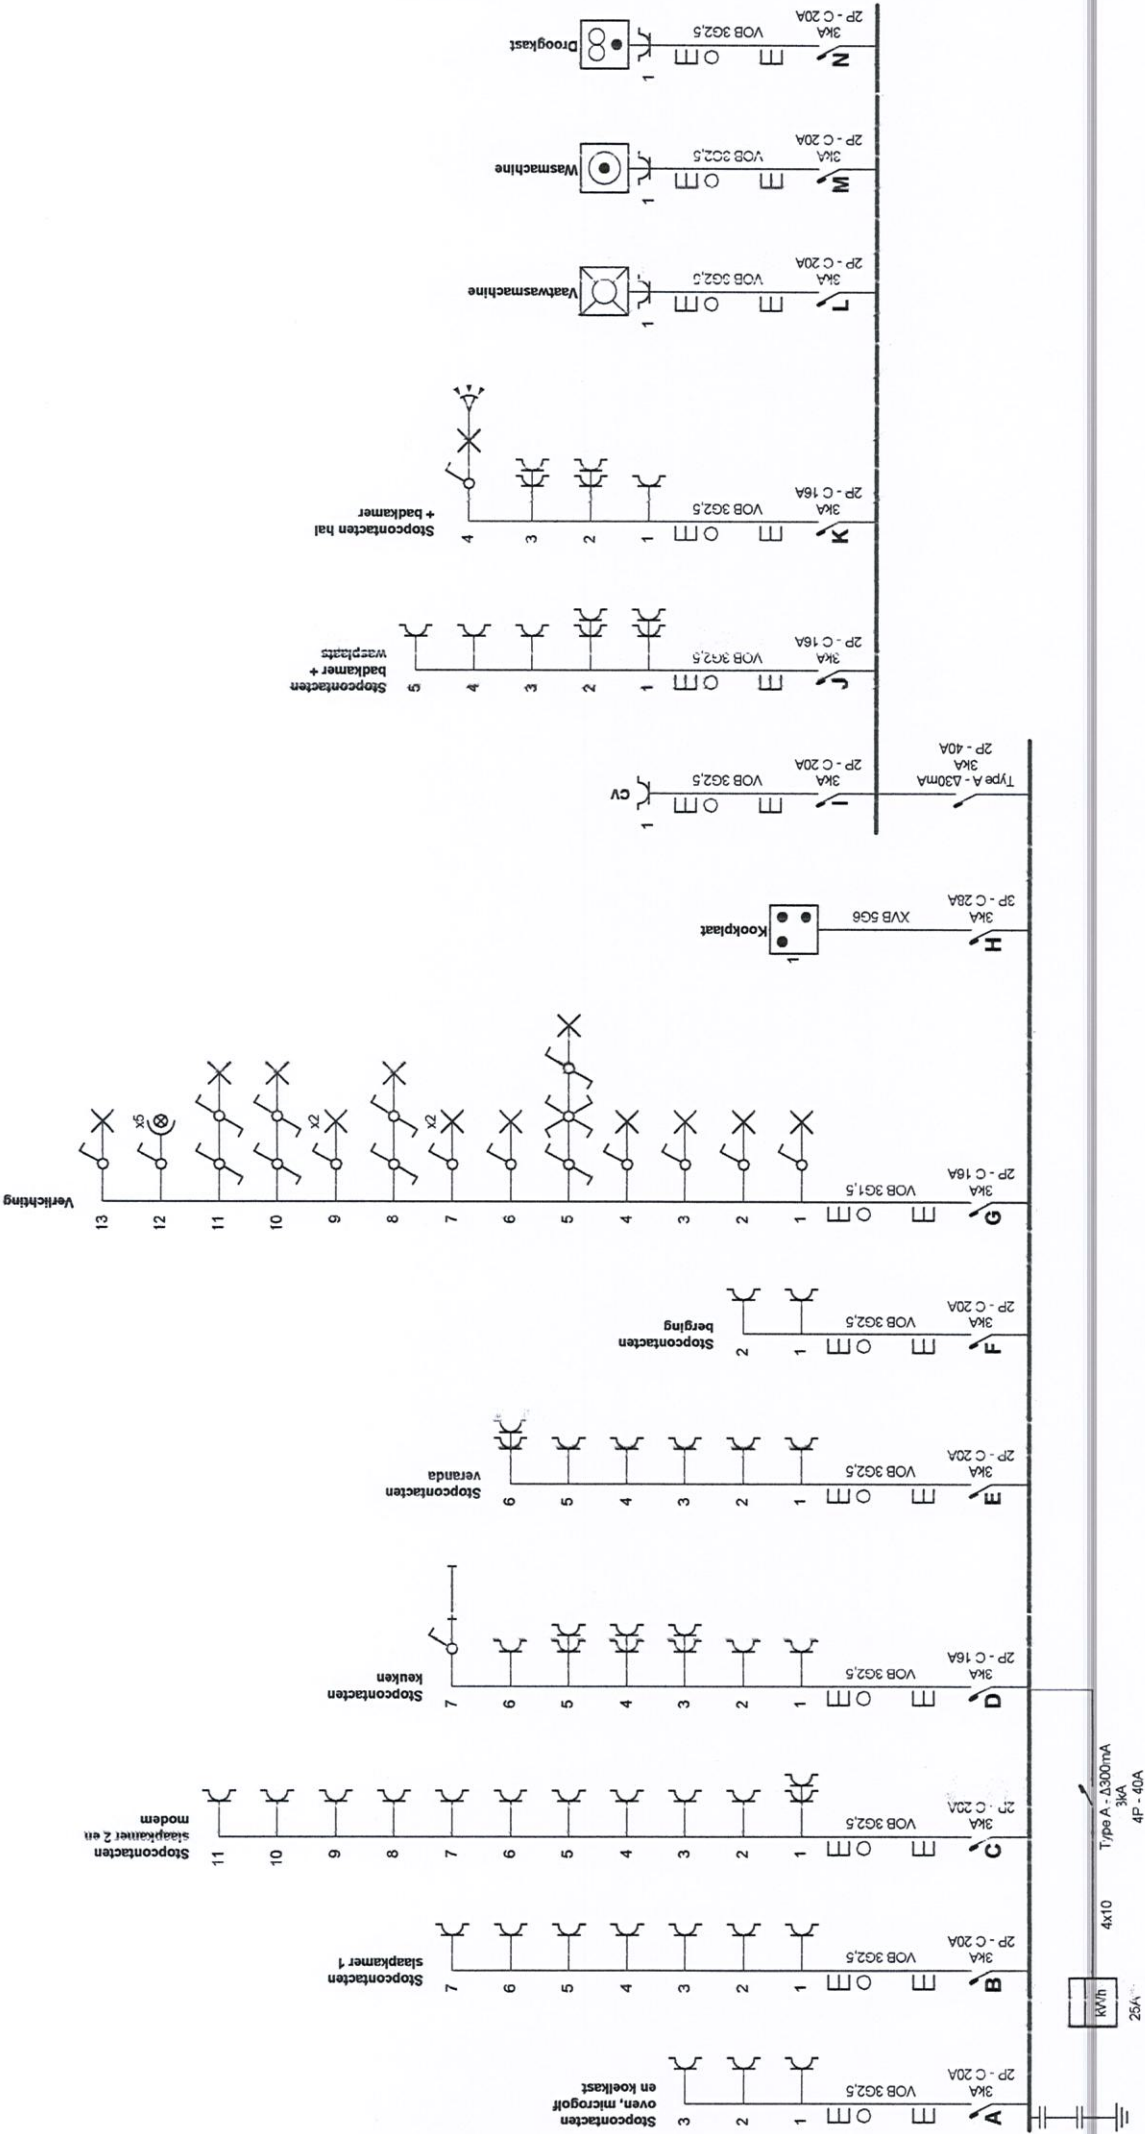


Erkend Organisme
OCB

Plaats van de elektrische installatie
Kris Van Camp en zoon BVBA
Bosstraat 42 Bus A
2861 Onze Lieve Vrouw Waver
0827.660.607

Installateur
Jelle Gysemans BV
Derelei 2
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
GSM: 0479 98 10 38
e-mail: elektricien@jellegysemans.be
BTW BE 0764.363.562

ELEKTRICIEN
jelle gysemans

p. 1/2
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

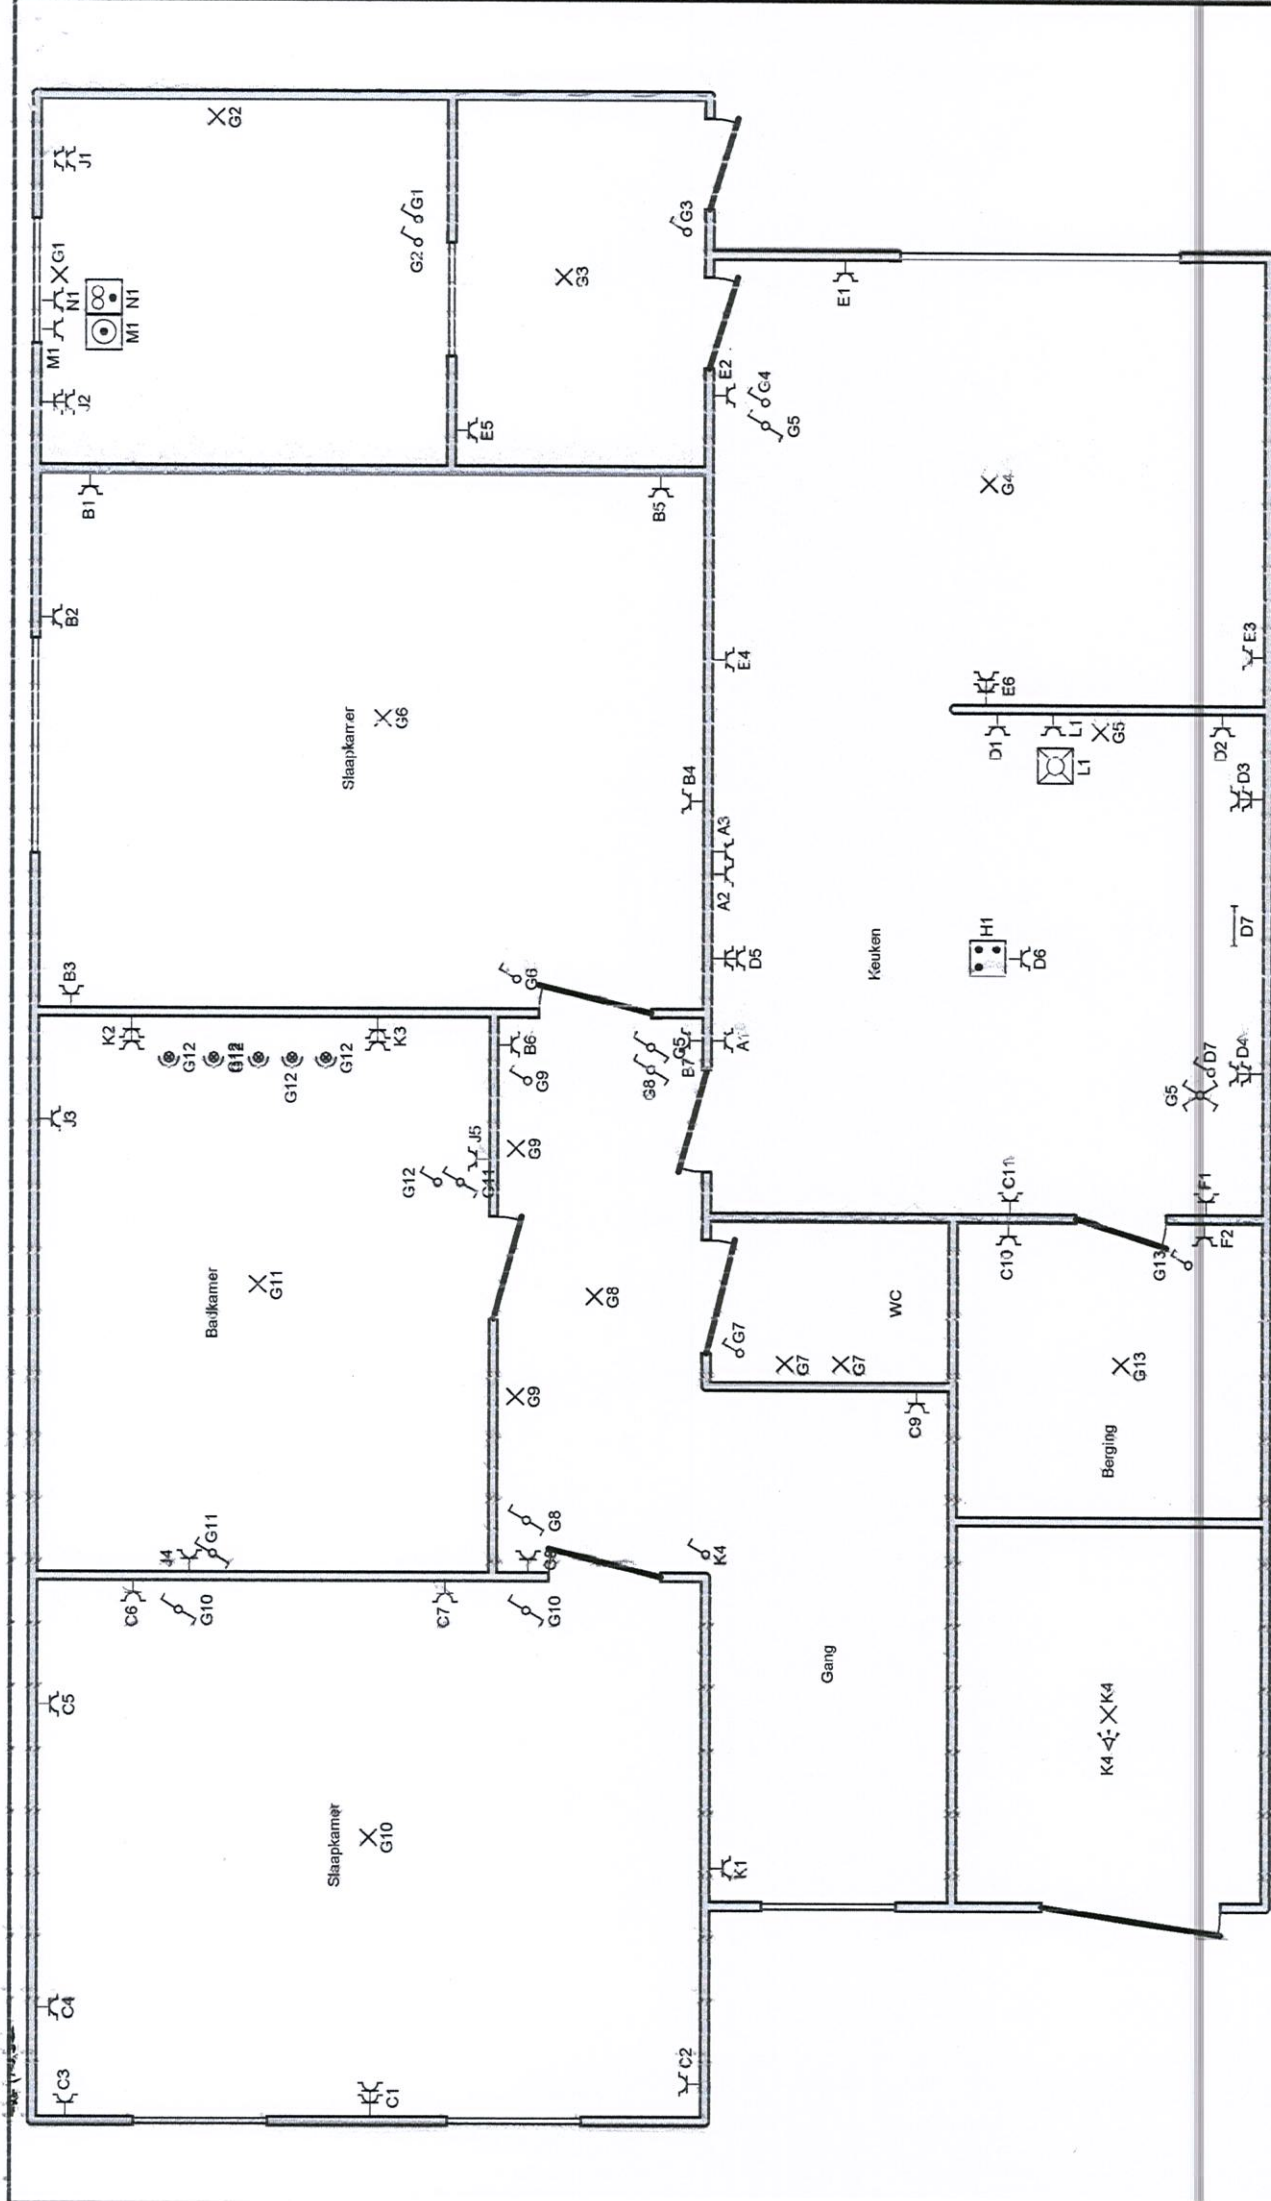

Erkend Organisme OCB	Plaats van de elektrische installatie Kris Van Camp en zoon BVBA Bosstraat 42 Bus A 2861 Onze Lieve Vrouw Waver 0827.690.607	Installateur Jelle Gysemans BV Perelei 2 2861 Onze Lieve Vrouw Waver GSM: 0479 98 10 38 e-mail: elektricien@jellegysemans.be BTW BE 0764.363.562	p. 2/2 Situatieschema 3 x 400V + N ~ 50Hz
	ELEKTRICIEN Jelle Gysemans 		
