

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: bram.apers@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4543685
Voorl. verslagnr.:
Datum: 29/06/2015



Klant / Opdrachtgever:
ABE BVBA
LISPERSTRAAT 56 BUS 1
2500 LIER

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: Antwerpsesteenweg 351 bus 3 LIER 2500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 29/06/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2040 Onderzoeker: OP DE BEECK STIJN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 1404716 Stand I: 4,7 Stand II: 1,5
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 11,77 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 63A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 398 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 10

Ok, zie schema's.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen.


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Stijn Op de Beeck
0493/240.129
stijn.opdebeeck@ocb.be

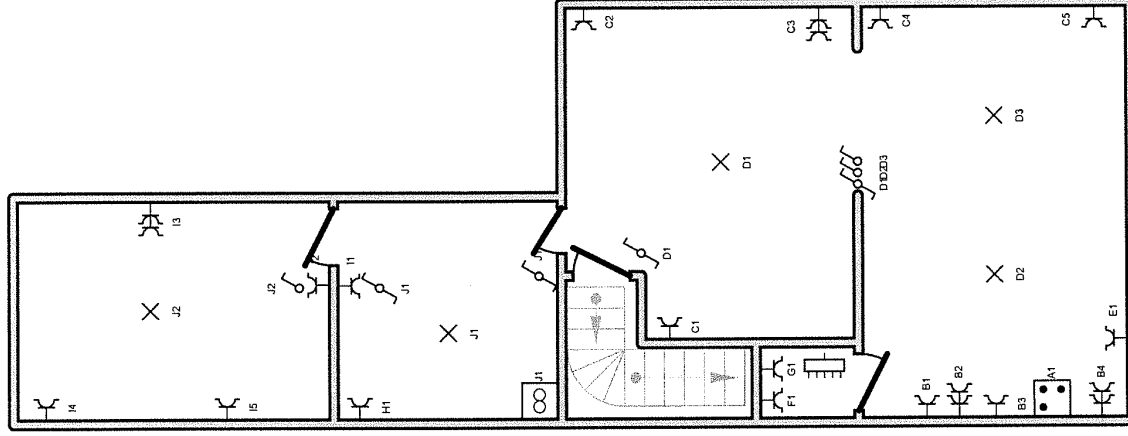

Erkend Organisme
 O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpseslenweg 351 Bus 3
 2500 Lier


Installateur
 ABE B.V.B.A.
 Lisperstraat 56 bus 1
 2500 Lier
 Tel.: 03 480 68 67 GSM: 0498 50 68 67
 e-mail: bram.apers@telenet.be
 BTW BE 0478.767.551

p. 2/2

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker OP DE BEECK Stijn
 Datum 29/06/2015
 PV nr. 4543685
 Handtekening

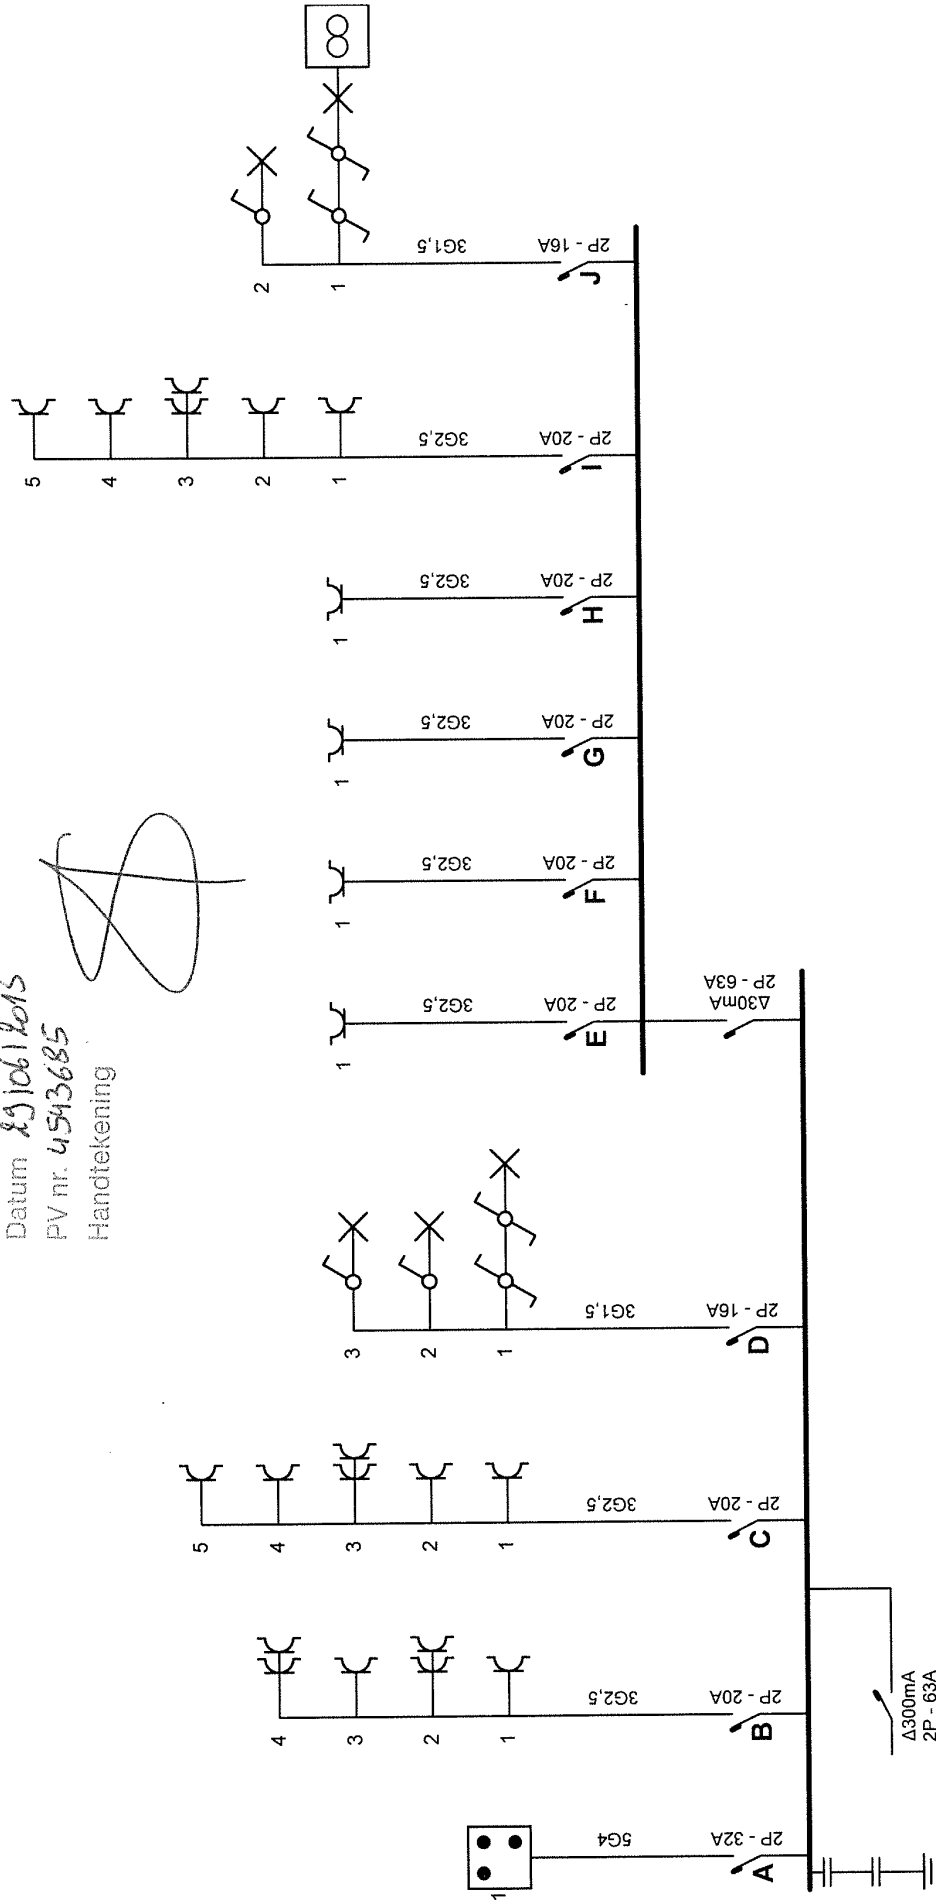

Erkend Organisme

O.C.B.
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 03 451 37 00
 Fax: 03 451 37 10
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Antwerpsenweg 351 Bus 3
 2500 Lier

Installateur

ABE B.V.B.A.
 Lisperstraat 56 bus 1
 2500 Lier
 Tel.: 03 480 68 67 GSM: 0498 50 68 67
 e-mail: bram.apers@telenet.be
 BTW BE 0478.767.551

p. 1/2 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz
