



Beter gekeurd

Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN

EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0346-180829-01 Datum van het onderzoek : 29/08/18
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : KAREL VAN BOSSTRAETEN
LEUVENSEBAAN 178
2580 PUTTE

EIGENAAR : KAREL VAN BOSSTRAETEN
Adres : LEUVENSEBAAN 178
2580 PUTTE

OPDRACHTGEVER : BUELENS DRIES
Adres : HOGE BRUGSTRAAT 33
2220 HEIST-OP-DEN-BERG

INSTALLATEUR : BUELENS DRIES
Adres : HOGE BRUGSTRAAT 33
2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Visualisatie van de installatie

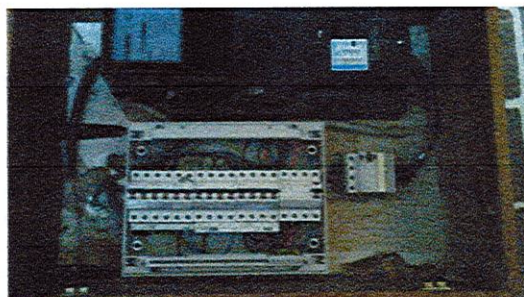

BTW of IK :

EAN : Teller nr. 84886322-98 Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Verkoop wooneenheid /	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Voor & Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 6 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	39 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	4	Aantal eindstroombanen :	17
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 276bis,

VMA - 44

MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 23,1 Ohm RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING:

bord1 : 1x diff 40A / 300mA 4p, 1x diff 40A / 30mA 4p, 1x C10A 2p, 1x C16A 2p, 1x C20A 2p, 2x C25A 4p
bord2 : 4x C16A 2p, 2x C20A 2p, 1x C25A 4p
bord3 : 2x 20A 2p, 3x 10A 2p, 1x 16A 2p
bord4 : 1x C16A 2p

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 Herkeuring na verkoop ATK RN/18/170-NO
- 2 Garage : geen elektriciteit.
- 3 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd o.a. badkamer.

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/08/2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0346 GERT FOBELETS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,....;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentialen verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroming en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van een jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VMA - 44

Verslagnummer 0346-180829-01



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Belekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2


Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 29/08/2043.

STAP 4

BTv Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.





Plaats van de elektrische installatie
Karel van bosstreeten
Leuvensebaan 178
2580 Putte

Installateur
BDS Elektriciteitswerken
Hoge Brugstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0473 60 10 76
e-mail: dries@bd-s.be
BTW BE 0503 990 521

p. 1/5
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

BTV-346
23/8/2018

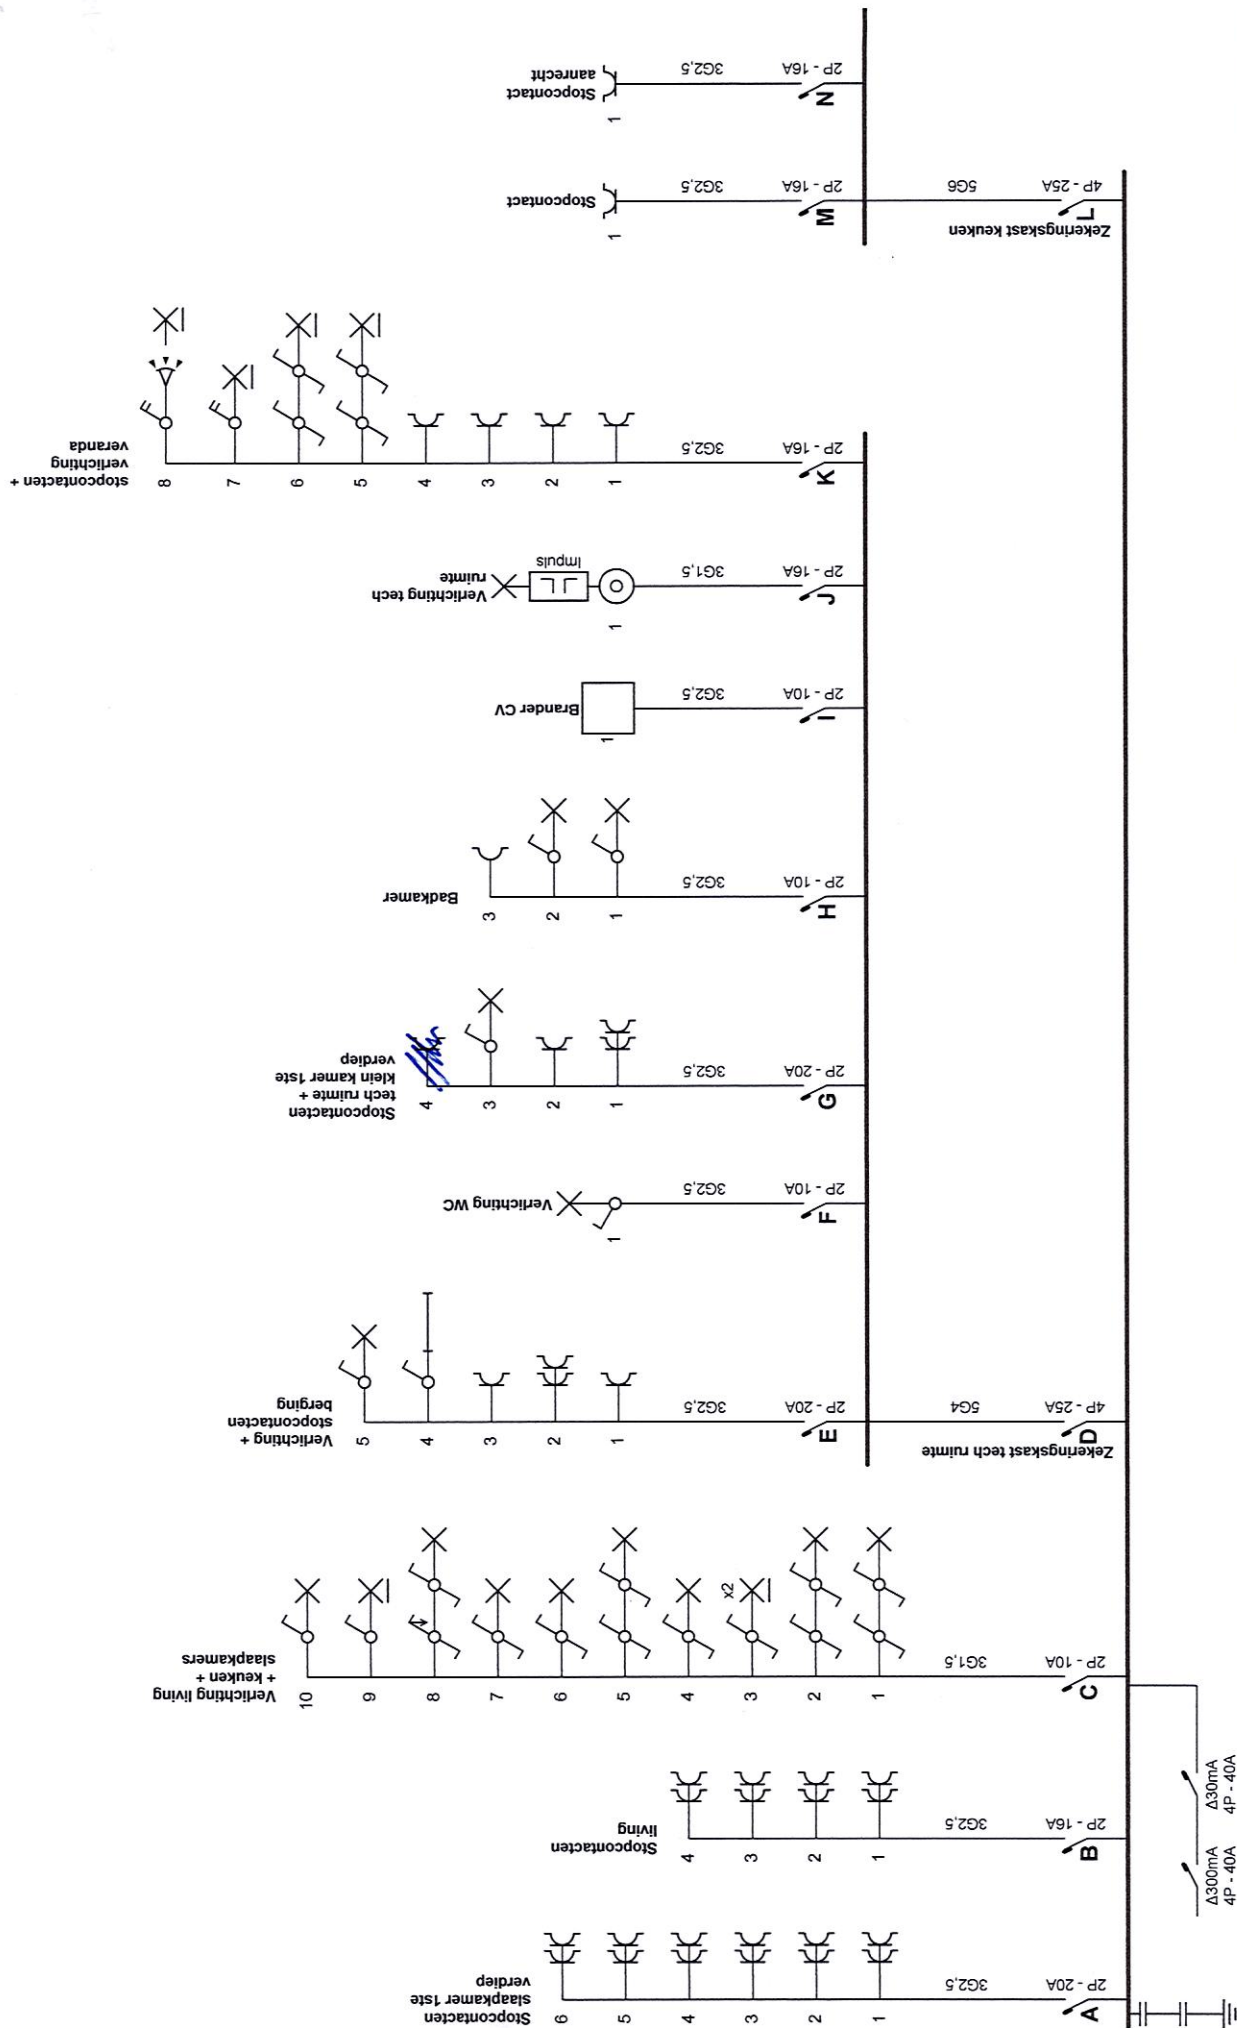

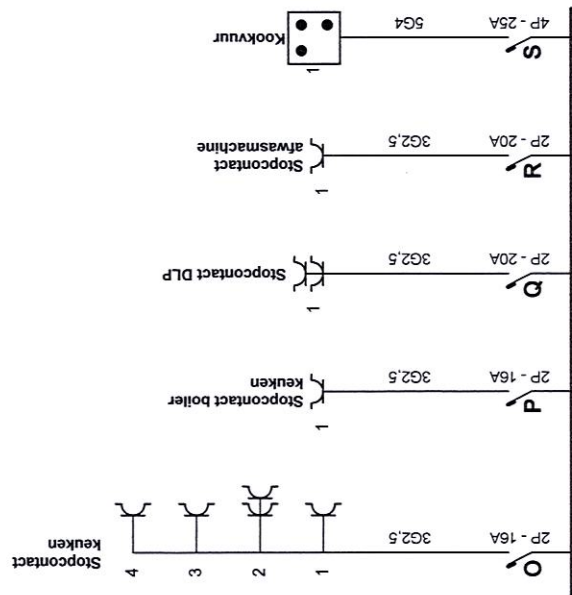


Plaats van de elektrische installatie
Karel van bosstreaten
Leuvensebaan 178
2580 Putte

Installateur
BDS Elektriciteitswerken
Hoge Brugstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0473 60 10 76
e-mail: dries@bd-s.be
BTW BE 0503.990.521



p. 2/5
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

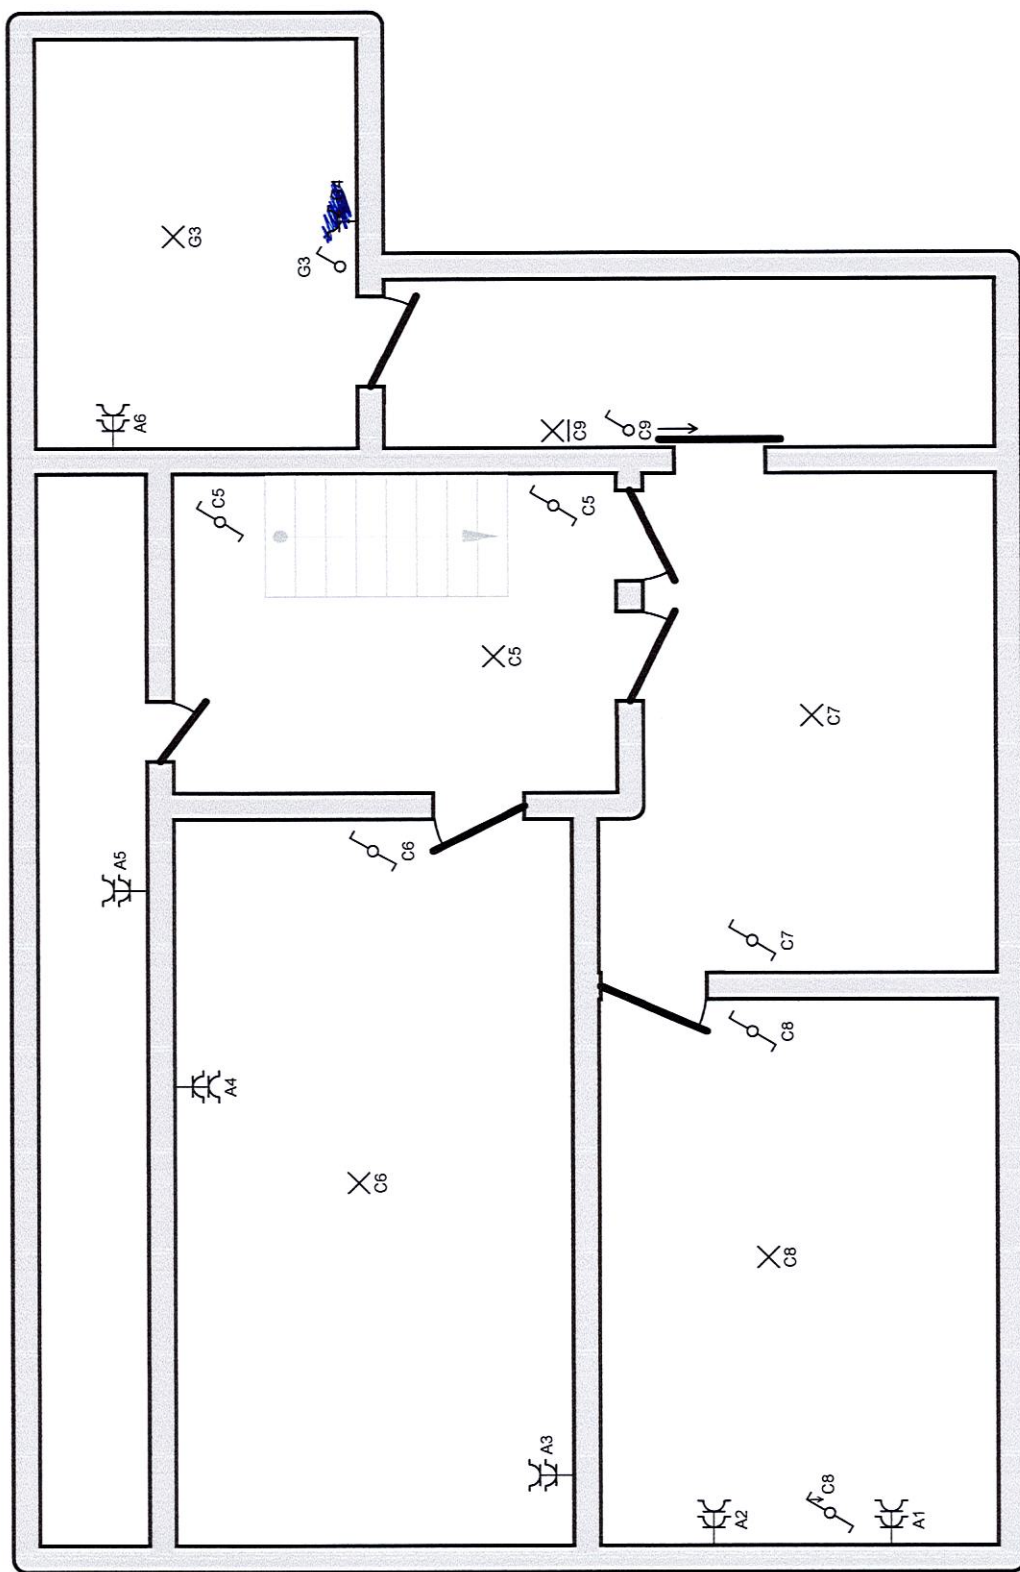

Plaats van de elektrische installatie
 Karel van Bostreuten
 Leuvensebaan 178
 2580 Putte

Installateur
 BDS Elektriciteitswerken
 Hoge Brugstraat 33
 2220 Heist-op-den-Berg
 GSM: 0473 60 10 76
 e-mail: dries@bd-s.be
 BTW BE 0503.990.521



BDS

p. 4/5
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Stopcontacten slaapkamer 1ste verdiep
- B** Stopcontacten living
- C** Verlichting living + keuken + slaapkamers
- D** Zekeringskast tech ruimte
- E** Verlichting + stopcontacten berging
- F** Verlichting WC
- G** Stopcontacten tech ruimte + klein kamer 1ste verdiep
- H** Badkamer
- I** Brander CV
- J** Verlichting tech ruimte
- K** stopcontacten + verlichting veranda
- L** Zekeringskast keuken
- M** Stopcontact
- N** Stopcontact aanrecht
- O** Stopcontact keuken
- P** Stopcontact boiler keuken
- Q** Stopcontact DLP
- R** Stopcontact afwasmachine
- S** Kookvuur

Plaats van de elektrische installatie
Karel van bosstreaten
Leuvensebaan 178
2580 Putte

Installateur
BDS Elektriciëtswerken
Hoge Brugstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0473 60 10 76
e-mail: dries@bd-s.be
BTW BE 0503.990.521



p. 5/5
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz
