



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/04/2023

Inspecteur: Hasan Özdemir

Mentor:

Installateur: Dirk Wagemans

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481261

Datum verslag: 09/04/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1084852

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Oude Kasteellaan
Huisnummer	44
Busnummer	
Postcode	2820
Gemeente	Bonheiden
Land	België

Eigenaar

Naam	Wagemans Dirk
Straatnaam	Oude Kasteellaan
Huisnummer	44
Busnummer	
Postcode	2820
Gemeente	Bonheiden
Land	België

Installateur

Naam	Dirk Wagemans
BTW nr.	/
Telefoonnummer	+32 476 75 24 55
E-mail	dirkwagemans@yahoo.co.uk

Type : woning

EAN : 541448820058051342

Teller Nr.: : 1SAG3105250764

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 25+8+12

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,863 MΩ

RE: 21 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	32	Bord 1	2	6
1	C	25	Bord 1	2	4
10	C	20	Bord 1	2	2,5
12	C	16	Bord 1	2	1,5
8	C	20	Bord 2	2	2,5
1	C	32	Bord 3	2	6
6	C	20	Bord 3	2	2,5
5	C	16	Bord 3	2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	OK		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/4/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hasan Özdemir



ÖZDEMİR HASAN
ACEG VZW - #218

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/4/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



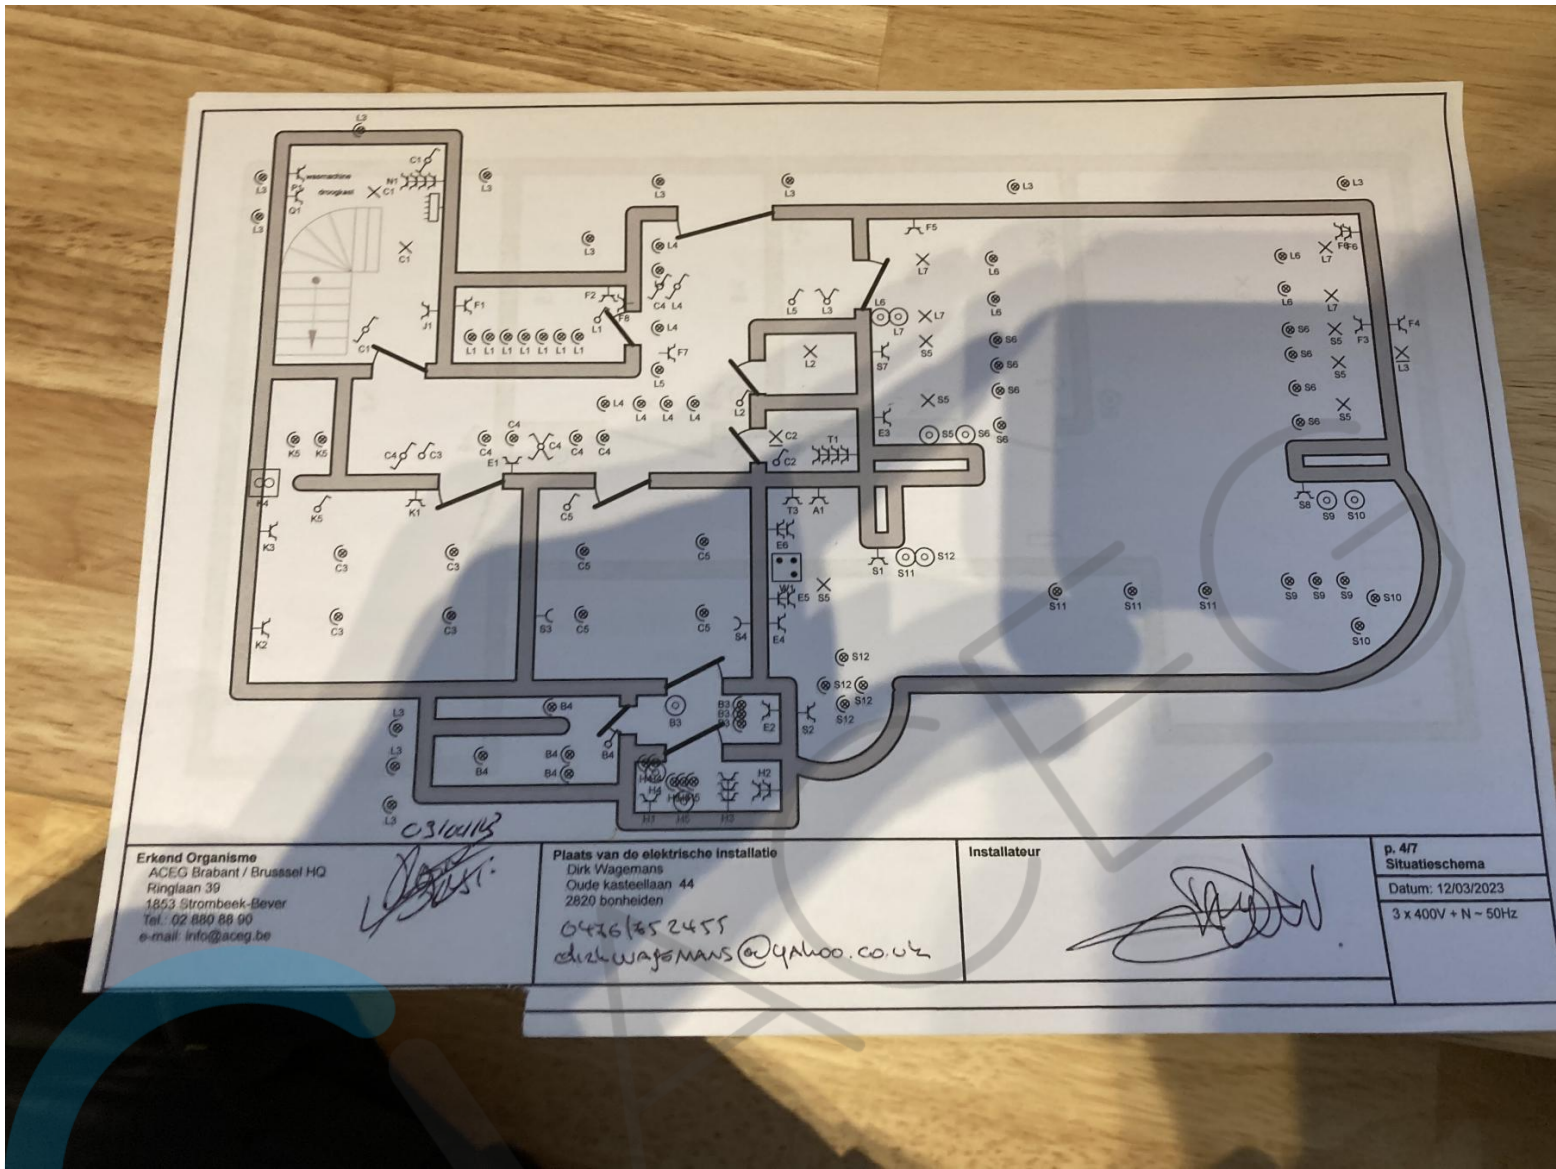

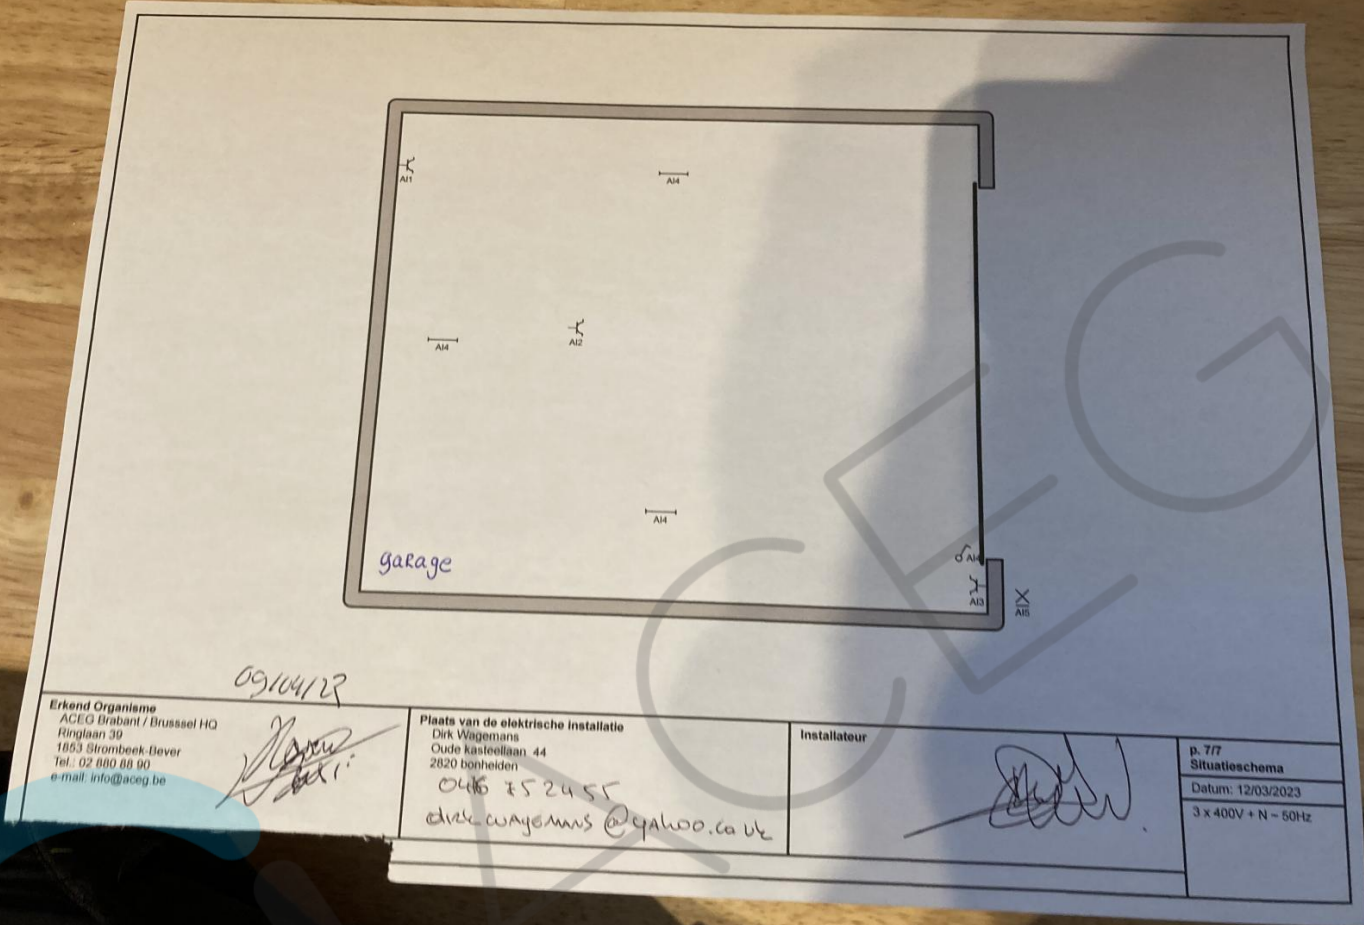

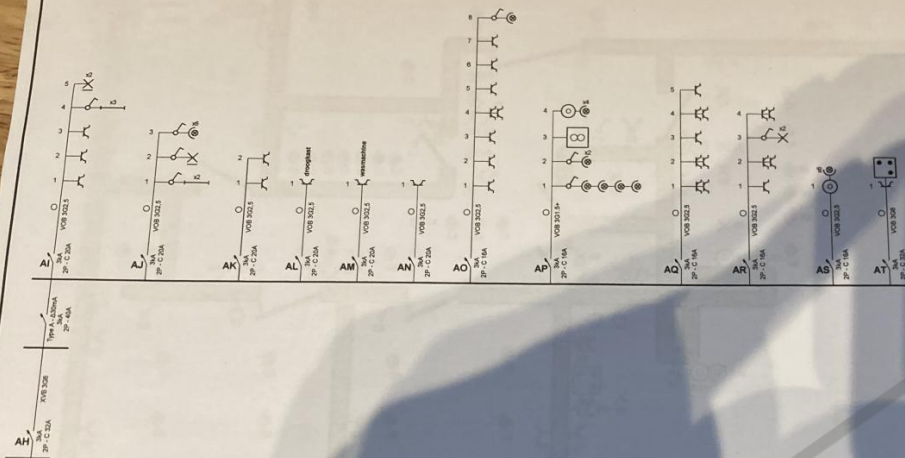

CS164123


Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
Dirk Wagemans
Oude kasteellaan 44
2820 Bonheiden

0426 7524 55
dirkwagemans@yahoo.co.uk

Installateur

p. 3/7
Eendraadschema
Datum: 12/03/2023
3 x 400V + N ~ 50Hz

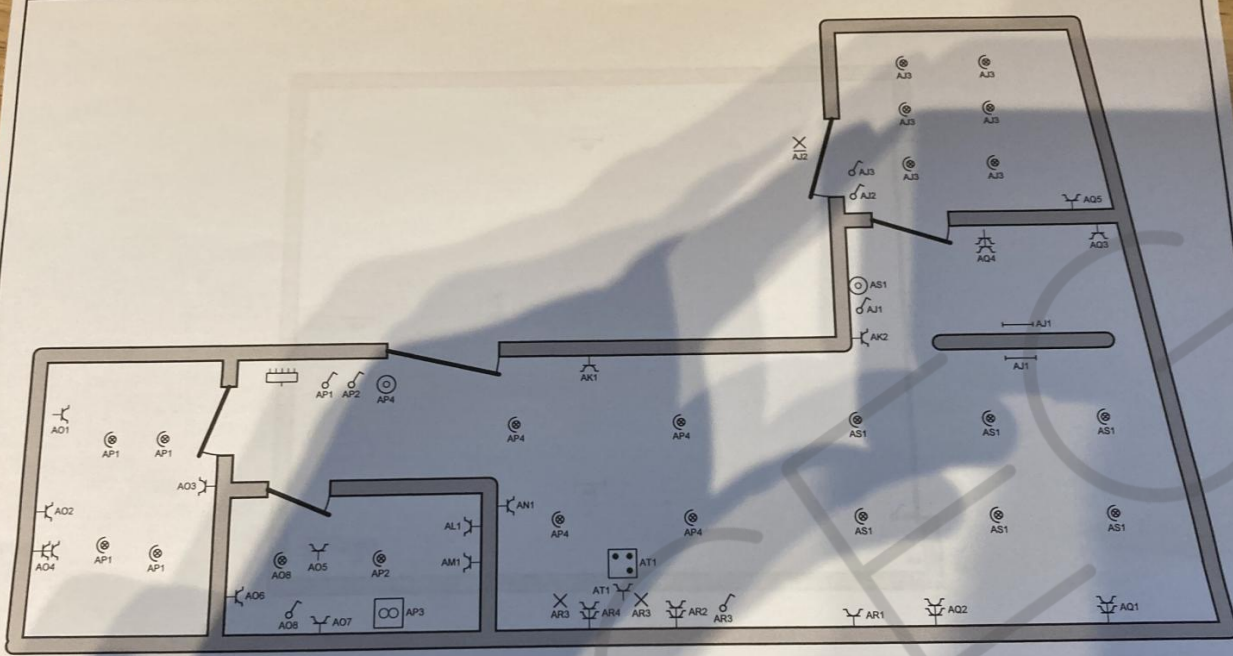

09/11/22

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
Dirk Wagemans
Oude kasteellaan 44
2820 bonheiden
dirk.wagemans@yahoo.co.uk
0476 175 2455

Installateur

[Handwritten signature]

p. 6/7
Situatieschema
Datum: 12/03/2023
3 x 400V + N - 50Hz

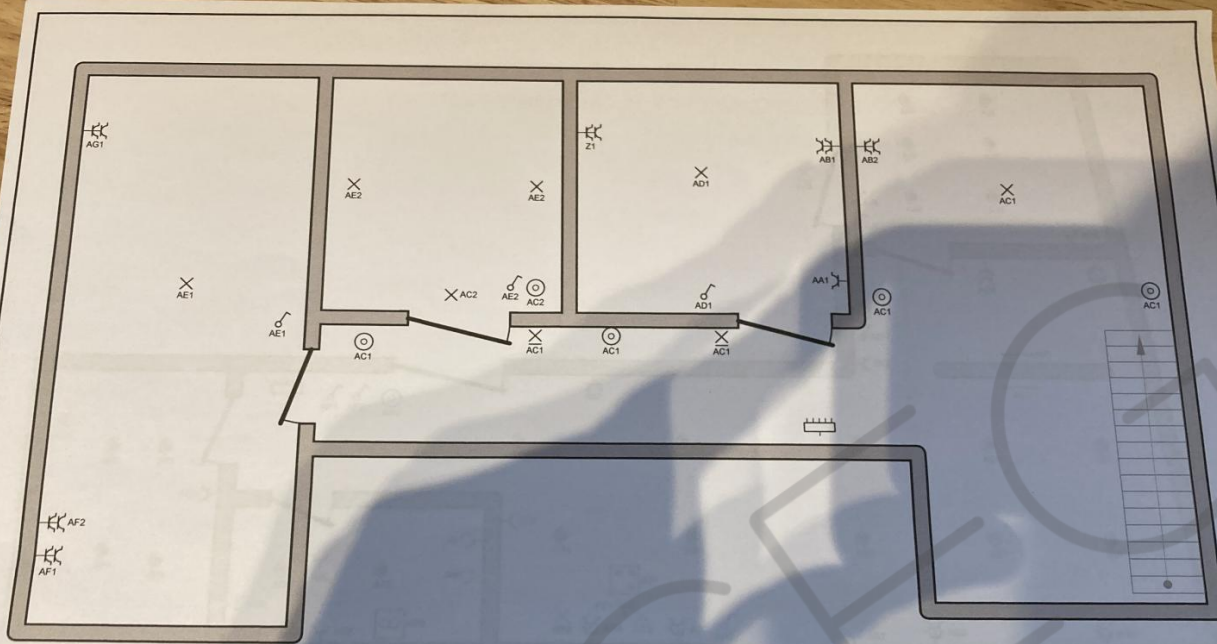

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
Dirk Vlagemans
Oude kasteellaan 44
2820 bonheiden
0476 75 2455
DRUKWAGENMAS@YAHOO.CO.UK

Installateur

[Handwritten signature]

p. 5/7
Situatieschema
Datum: 12/03/2023
3 x 400V + N - 50Hz



09/06/23

Erkend Organisme
ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
Dirk Wagemans
Oude kasteellaan 44
2820 bonheiden
0476 752455
dirk.wagemans@yahoo.co.uk

Installateur

[Handwritten signature]

p. 2/7
Eendraadschema
Datum: 12/03/2023
3 x 400V + N ~ 50Hz

