

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 72700
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: erik@thyserik.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6289563
Voorl. verslagnr.:
Datum: 30/08/2024



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

ERIK THYS BV
LEUVENSEBAAN 154
2580 PUTTE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 628 VERSCHUREN JORDY
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** WAAS **Adres:** WEVERSESTREENWEG 61 PUTTE 2580
Installateur/verantw. werk: **Naam:** ERIK THYS BV **Adres:** LEUVENSEBAAN 154 2580 PUTTE **B.T.W.:** /
Adres installatie: WEVERSESTREENWEG 61 PUTTE 2580 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** WEVERSESTREENWEG 61_LS01
EAN nr.: 541 448 820 061 240 153 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG310070 **Nachtsteller nr.:** / 3006

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 30/08/2024 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: type: pen **sectie:** 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage **referentie:**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 9

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 20,4 MOhm **Spreidingsweerstand:** 22,3 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

3* 380 + N

Waa
Waverssteenweg 61
2580 Putte

hal
bord A


C	6 A bel	10 A living	10 A keuken
D	10 A living	10 A keuken	10 A verdiep
E	16 A living	16 A keuken	16 A badkamer
F	16 A verlichting	16 A alg	16 A dampkap
G	16 A keuken	16 A keuken	16 A keuken
H	16 A keuken	16 A keuken	16 A keuken
I	16 A keuken	16 A keuken	16 A keuken

J - M	20 A bord B berging	0,3 A Verliesstroom	0,3 A Verliesstroom
A	20 A keuken	20 A kook vuur	0,3 A Verliesstroom
C - M	0,03 A Verliesstroom	0,03 A Verliesstroom	0,03 A Verliesstroom

J	10 A berging	10 A berging	10 A berging
K	16 A berging	16 A badkamer	16 A droogkast
L	16 A badkamer	16 A badkamer	16 A badkamer
M	16 A badkamer	16 A badkamer	16 A badkamer

berging

bord B

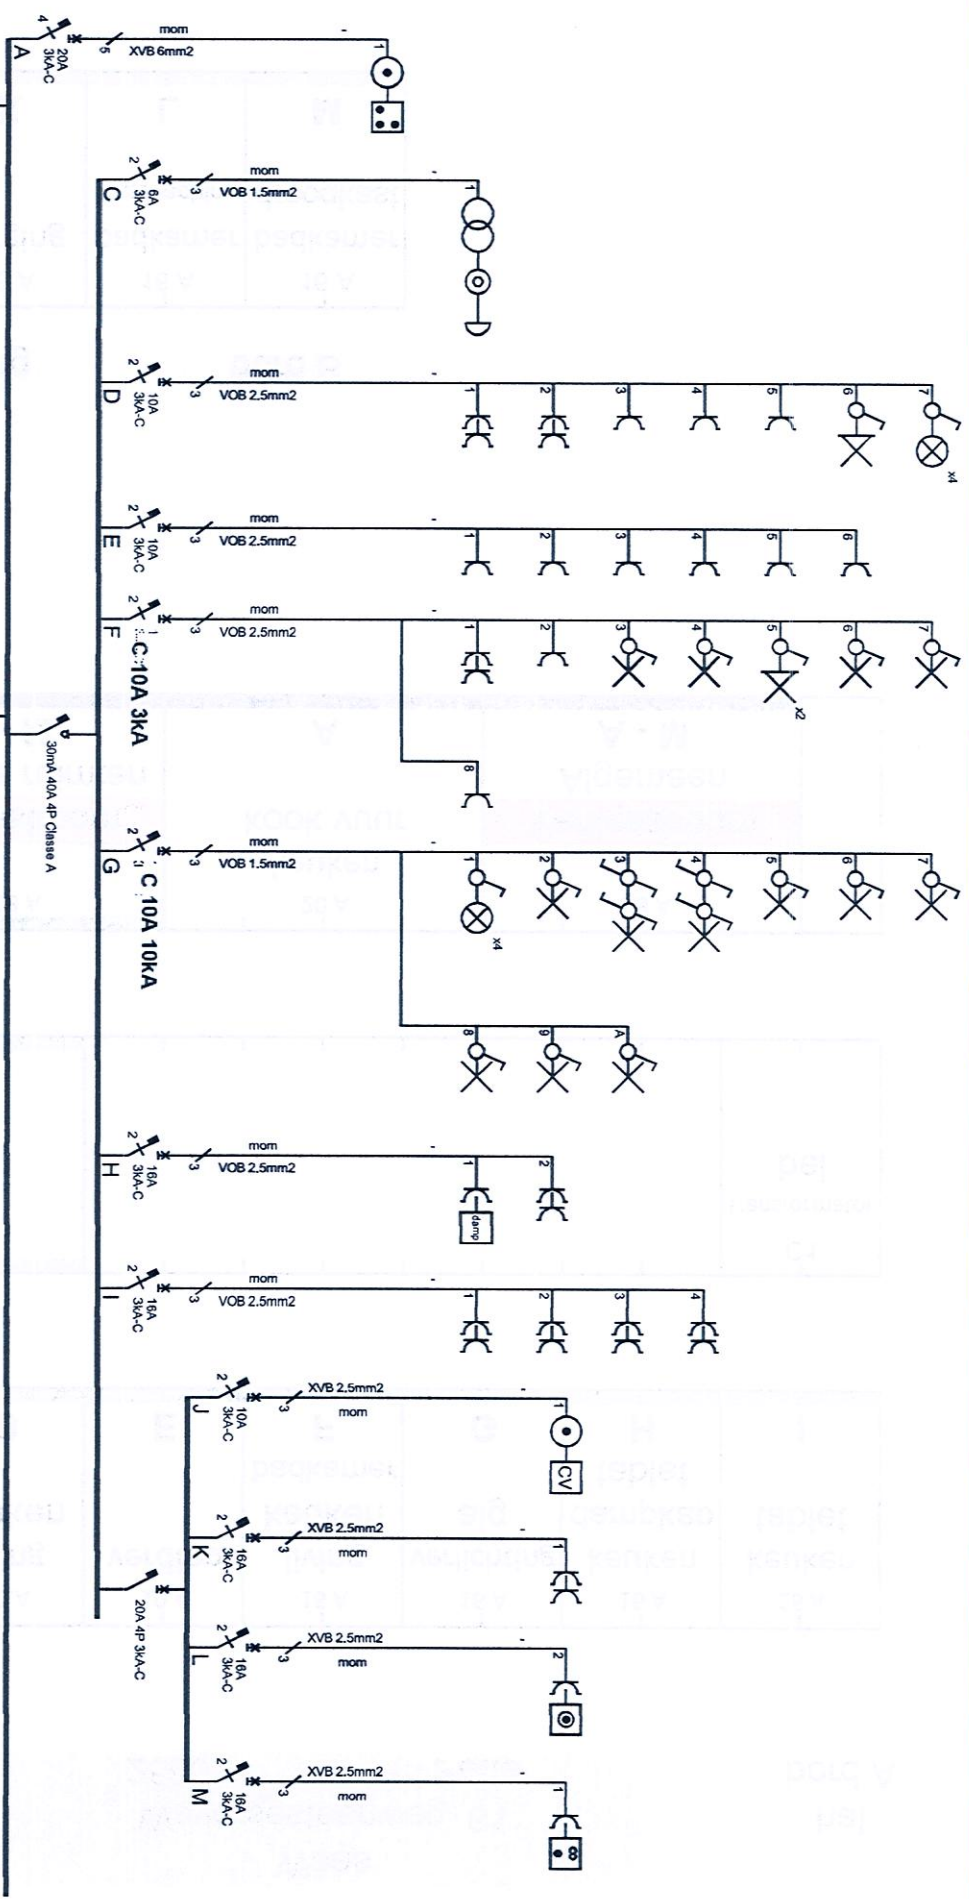

Afgeev. erkend organisme

OCB V.Z.W.
Jody Verschuren

Waa
Waversesteenweg 61
2580 Putte

Eigenaar


Verantw. uitvoering
22/08/2024

BV THYS ERIK


Leuvensebaan 154 BTW:BE 454.186.266

2580 Putte Tel: 015/75.23.50

gelijkvloers

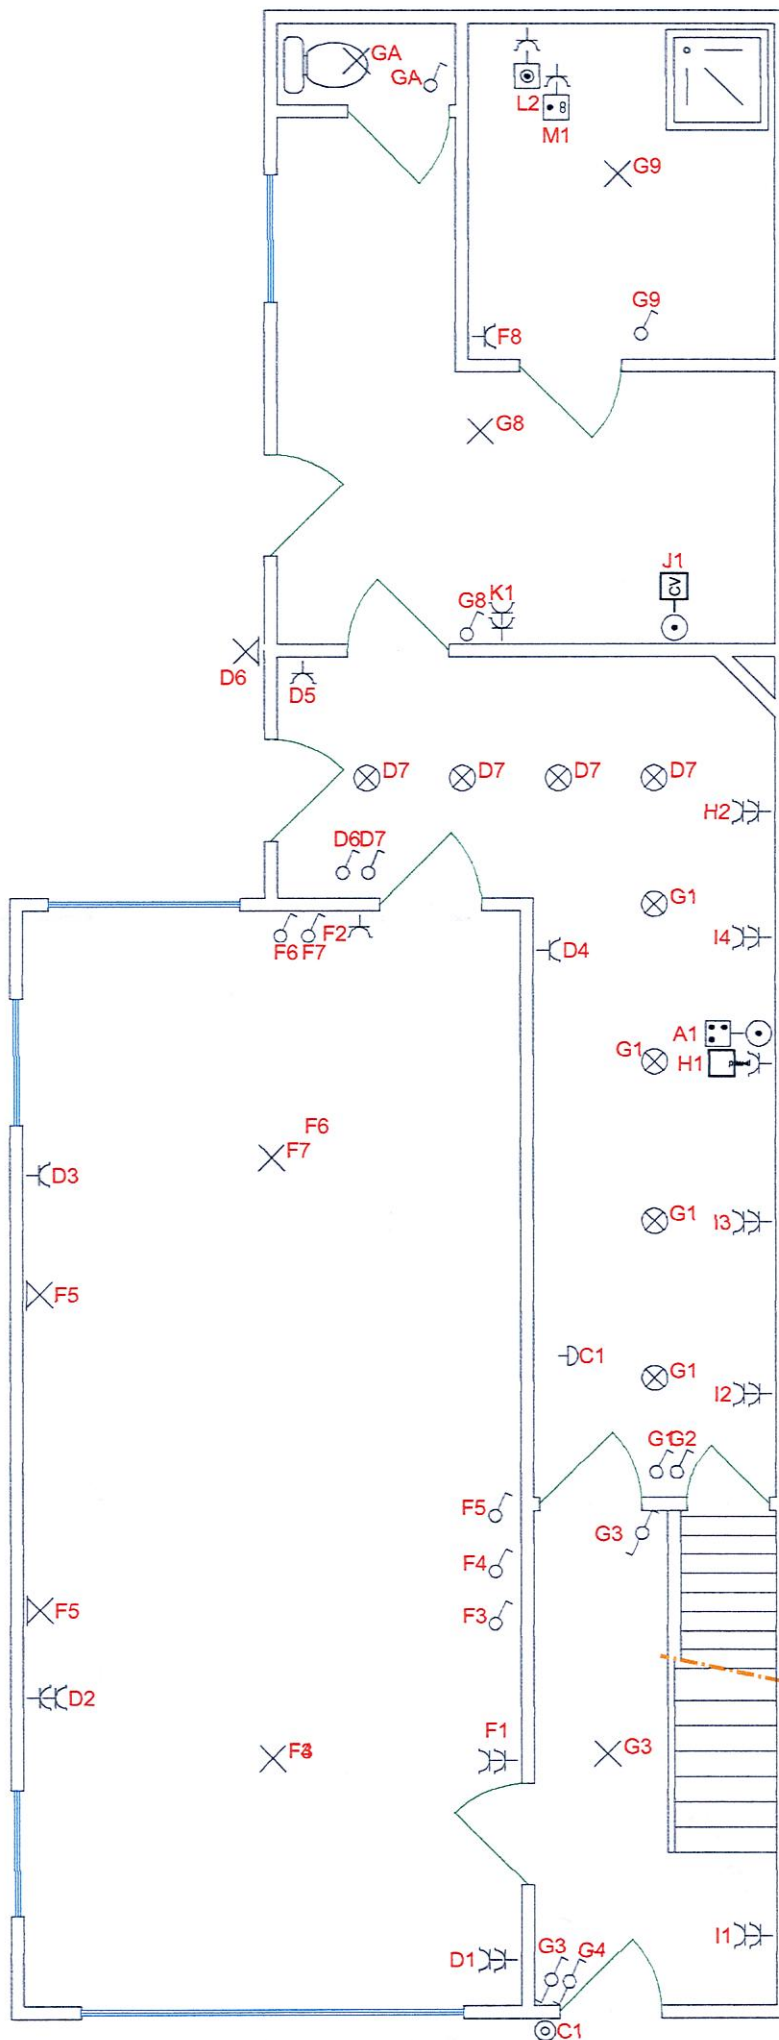

verdiep

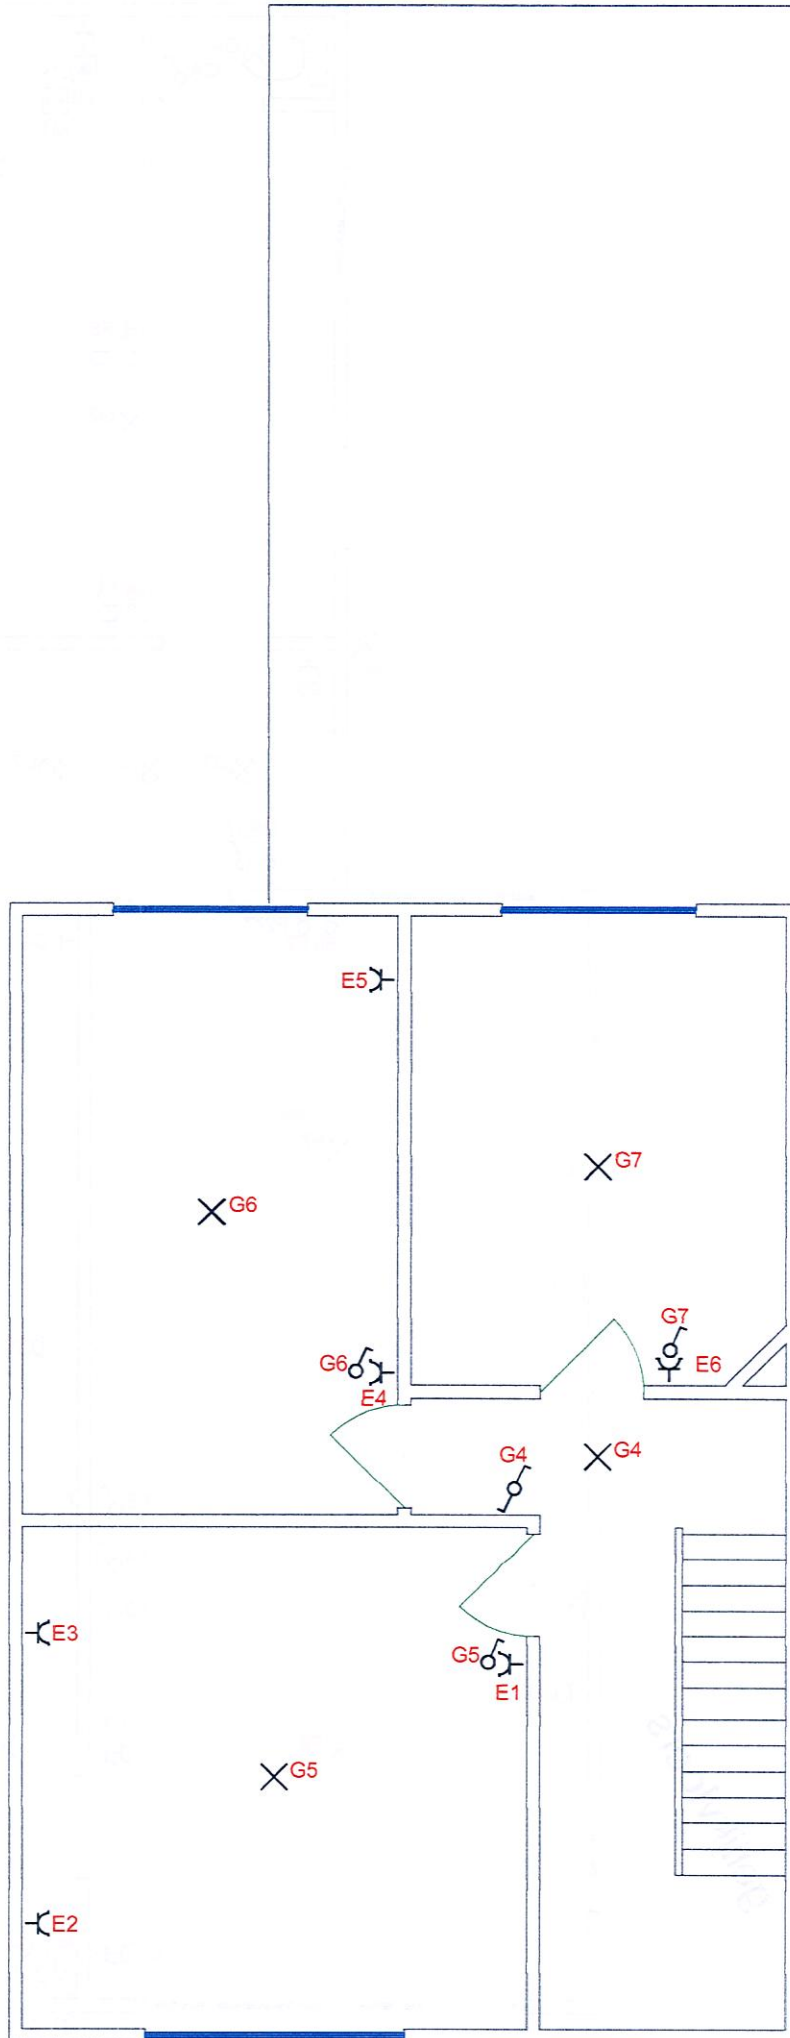

kelder

