



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 15/05/2025

Inspecteur: Kevin Marien

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120786

Datum verslag: 15/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Gijmelbergstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 3201
Gemeente Langdorp
Land België

Eigenaar

Naam Goovaerts - De Peuter
Straatnaam Gijmelbergstraat
Huisnummer 6
Busnummer
Postcode 3201
Gemeente Langdorp
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541448820057633945

Teller Nr. : 1SAG3200203194

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal kringen: 30

Ri algemeen: 0,04 MΩ

RE: 3,06 Ω

NOK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	26	OK	OK
30	40		-	A	7	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)		A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	6		2	1,5
6	C	16		2	1,5
17	C	20		2	2,5
2	C	25		2	4
1	C	25		4	4
2	C	20		4	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - Is niet volledig 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)
- I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)
- I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 15/5/2026. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
 - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:58 tot 08:34

De inspecteur Kevin Marien




Kevin Marien
ACEG VZW - #351


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

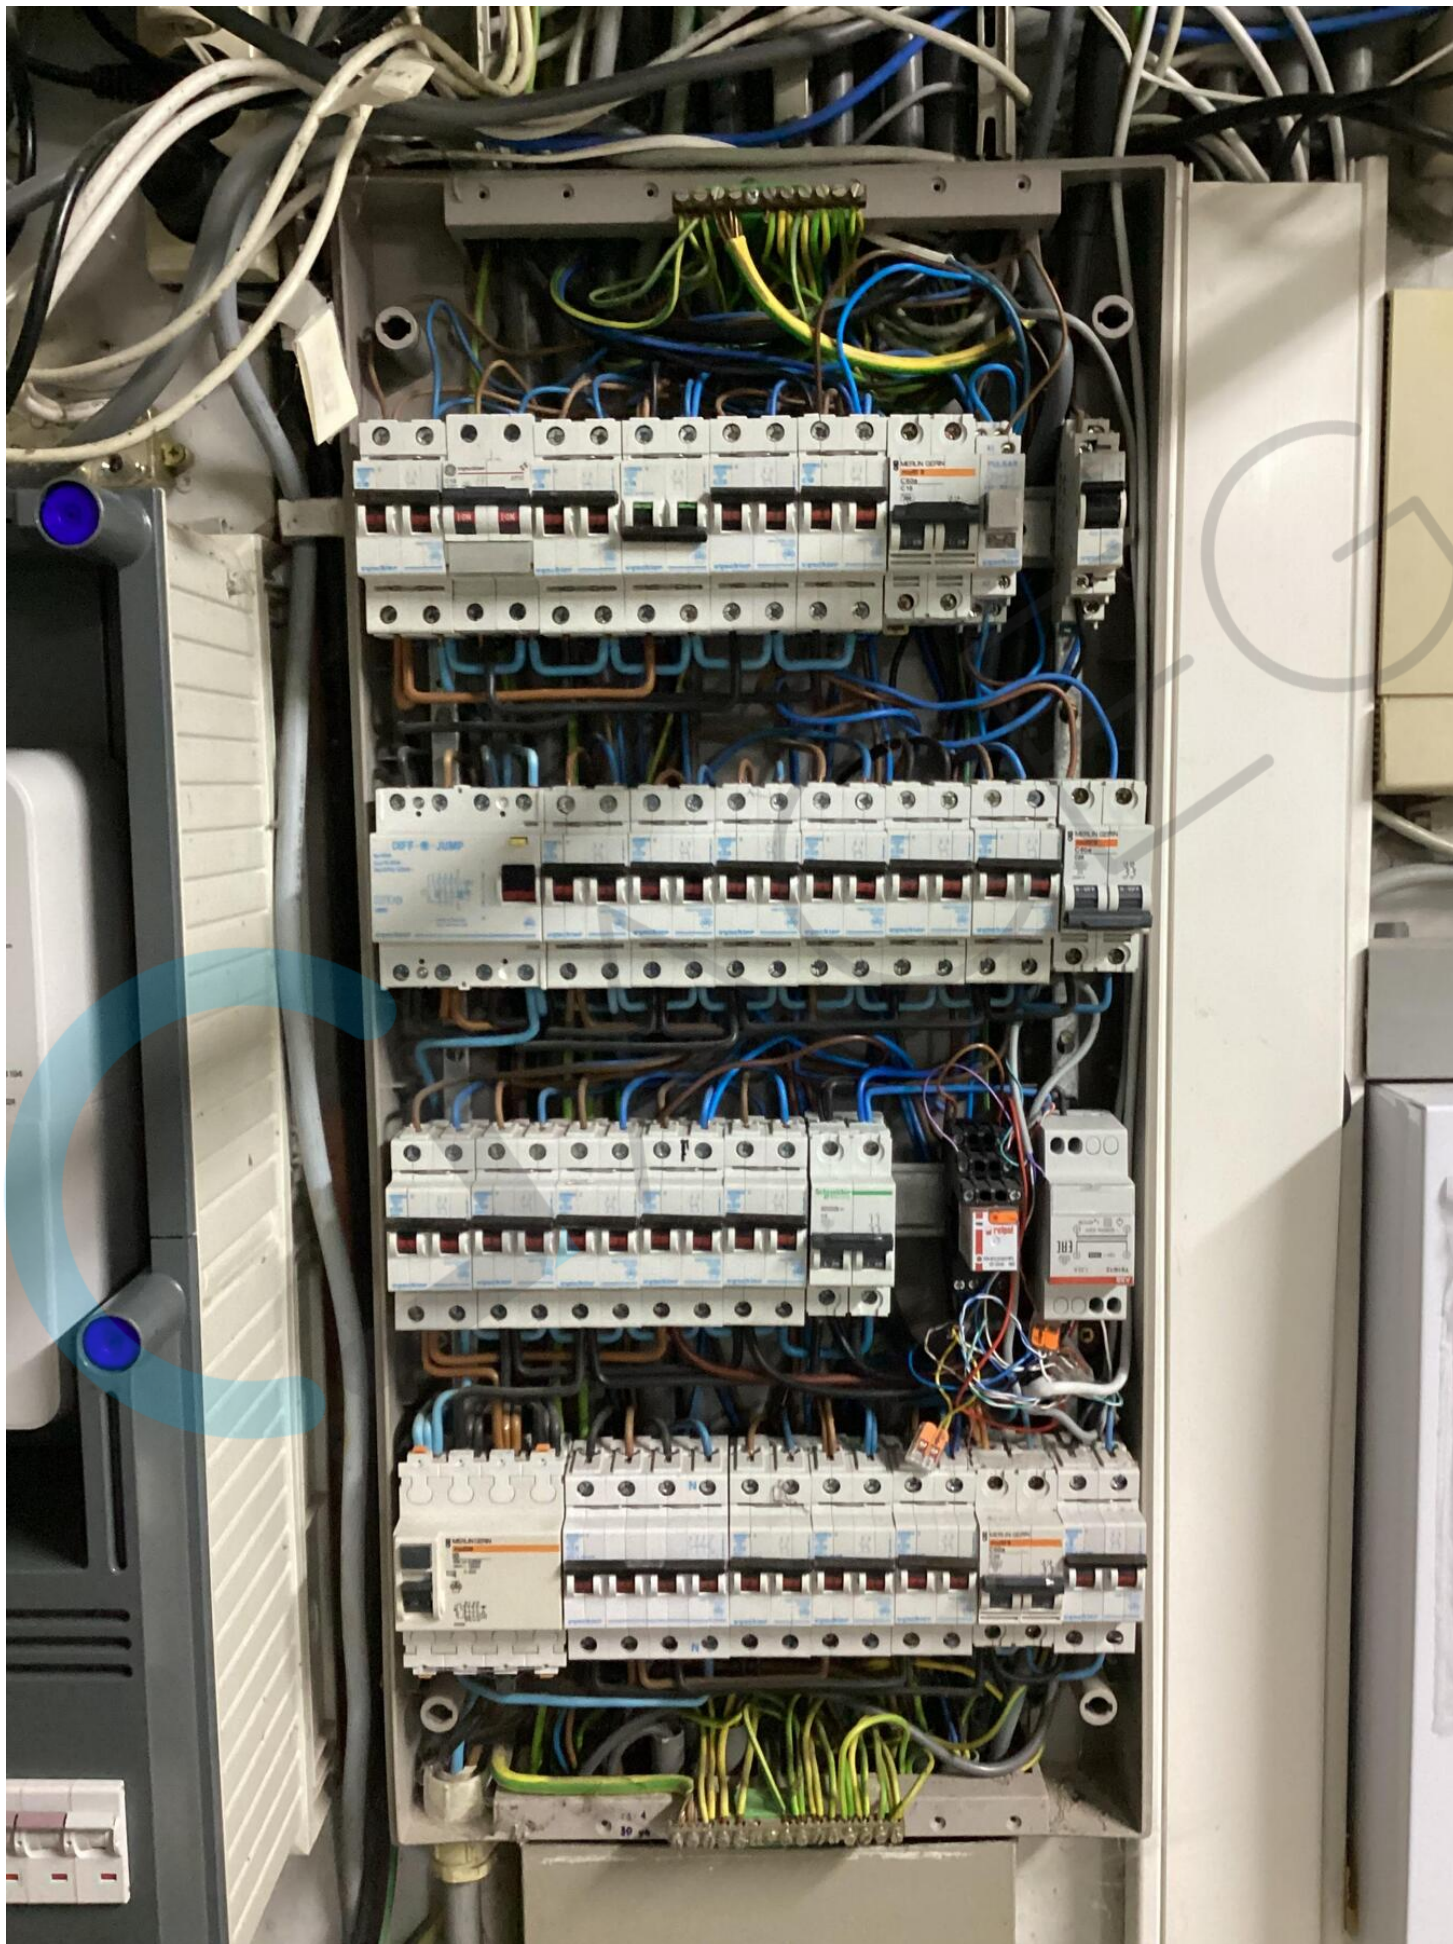



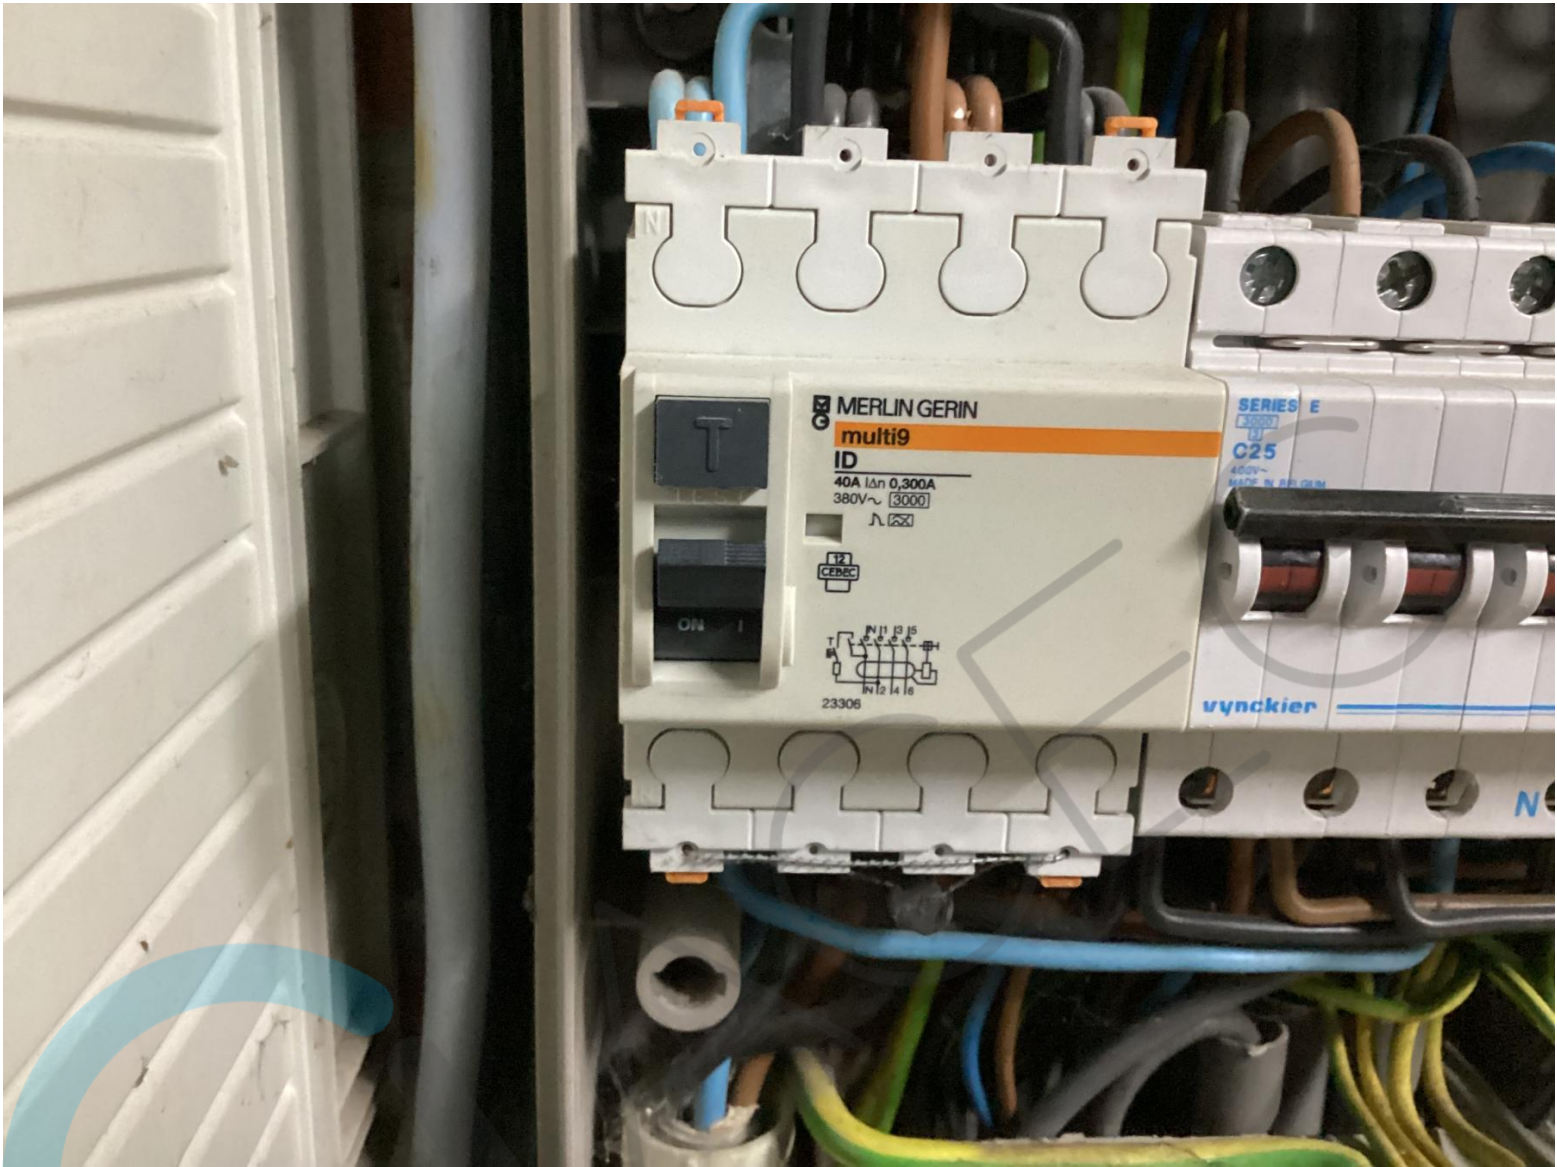

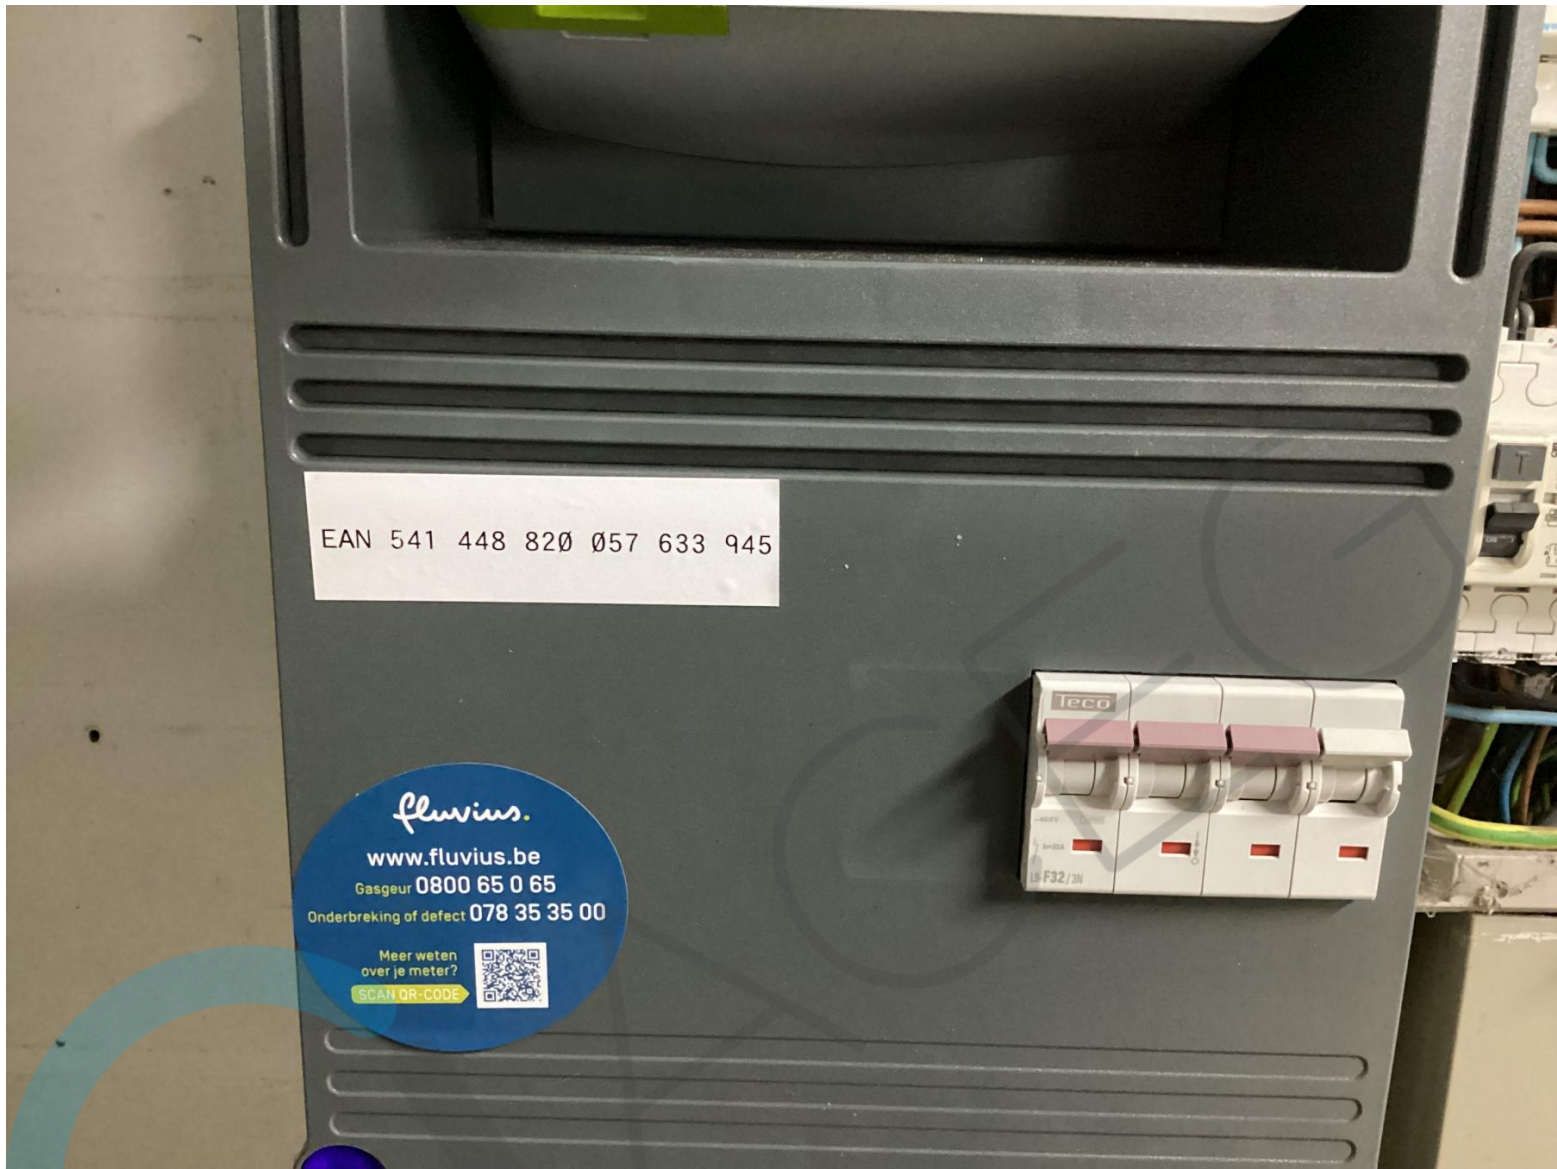

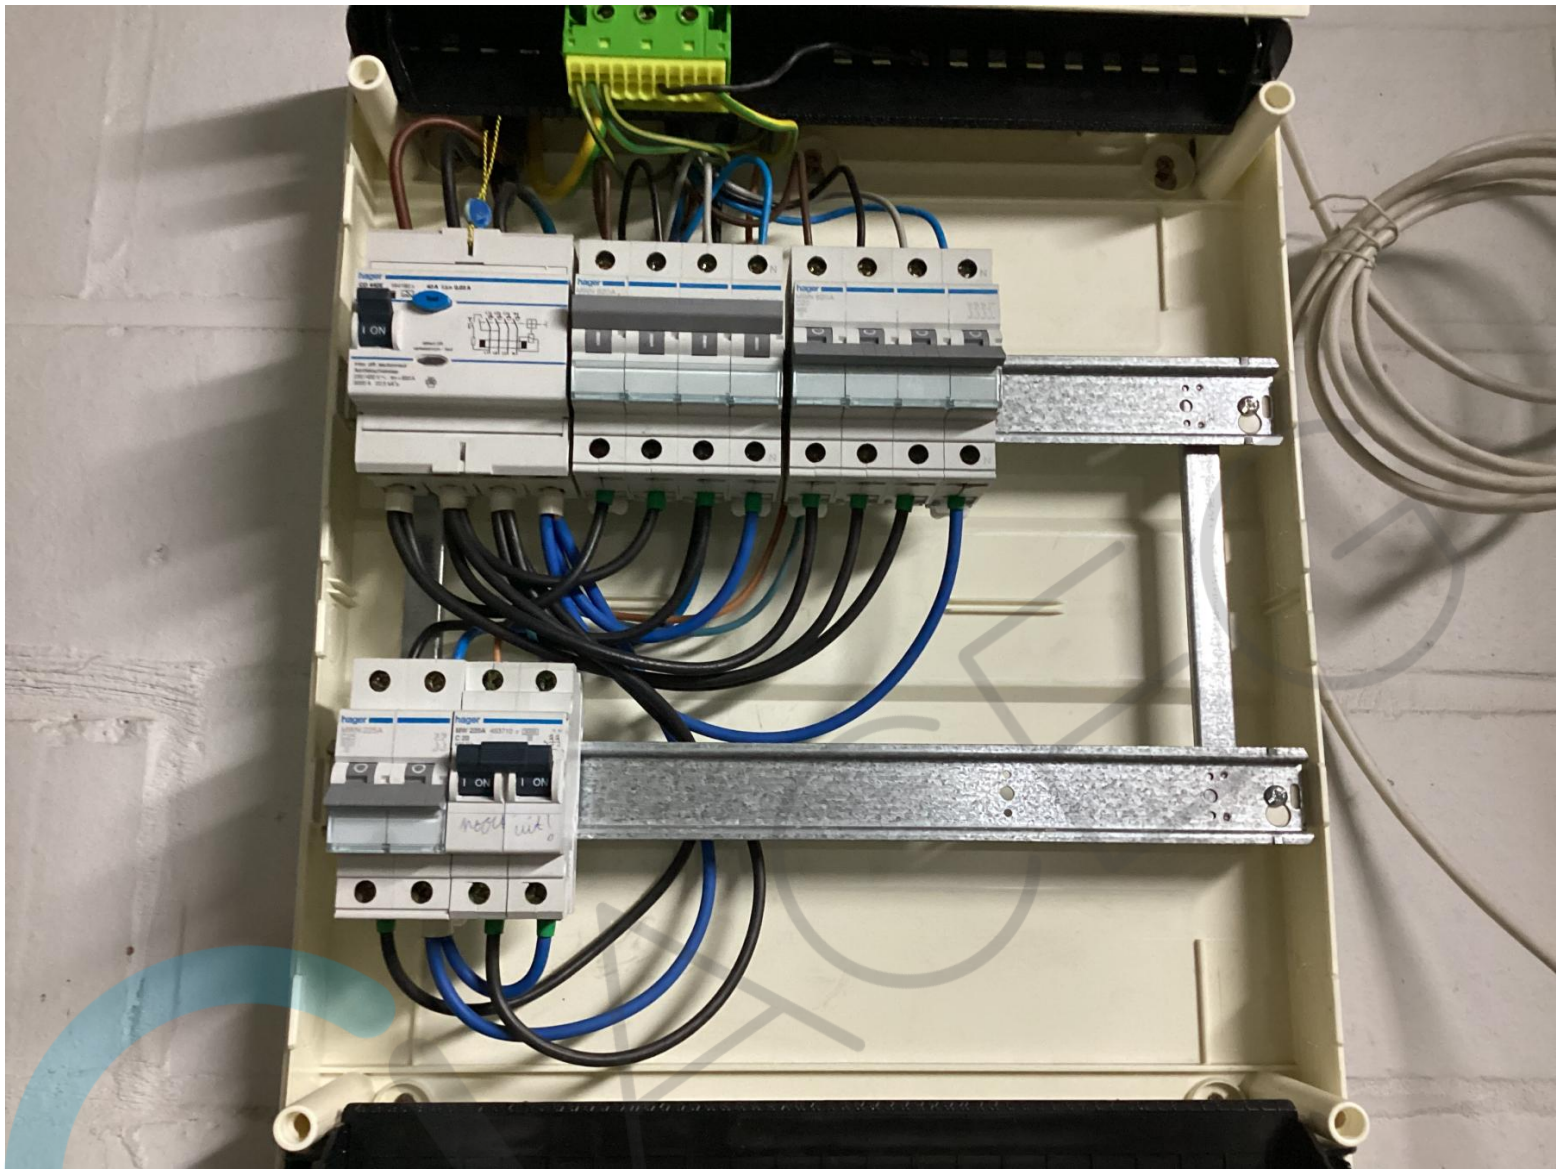





Zekeringkast Vynckier



R	S	S	T	T	R	U	S	V	S	W	S			
16A		16A		16A		16A		16A		16A				
licht		licht		licht		licht + stopk		licht		licht				
garage wc living wasplaats berging		keuken incomhall hall vestiaire		slaapk1 dressing slaapk2 slaapk3		buiten		zolder		kruipkelder				



3x40A+N Differentieel 30mA	K 20A stopk keuken midden	S L 20A stopk keuken werkblad	T M 20A stopk oven microgolf	N 20A stopk wasmachine	S O 20A stopk droogkast	T P 20A Licht + stopk badkamers	 Licht garage buiten
---	--	--	---	---	--	--	--

E	S	F	T	G	R	H	S	I	T	J	R	
20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	2A			
stopk	stopk	stopk	stopk	stopk	stopk	stopk	stopk	stopk				Transfo
slaapk1 dressing	slaapk2 slaapk3	bureau	zolder	centrale verwarming	transfo, distri, centrale							telefooncentrale + deurkontakt


3x40A+N Differentieel 300mA	3x25A+N stopk fornuis	20A stopk garage	20A stopk living	20A stopk stereo	20A stopk diepvries
--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

EENDRAADSCHEMA

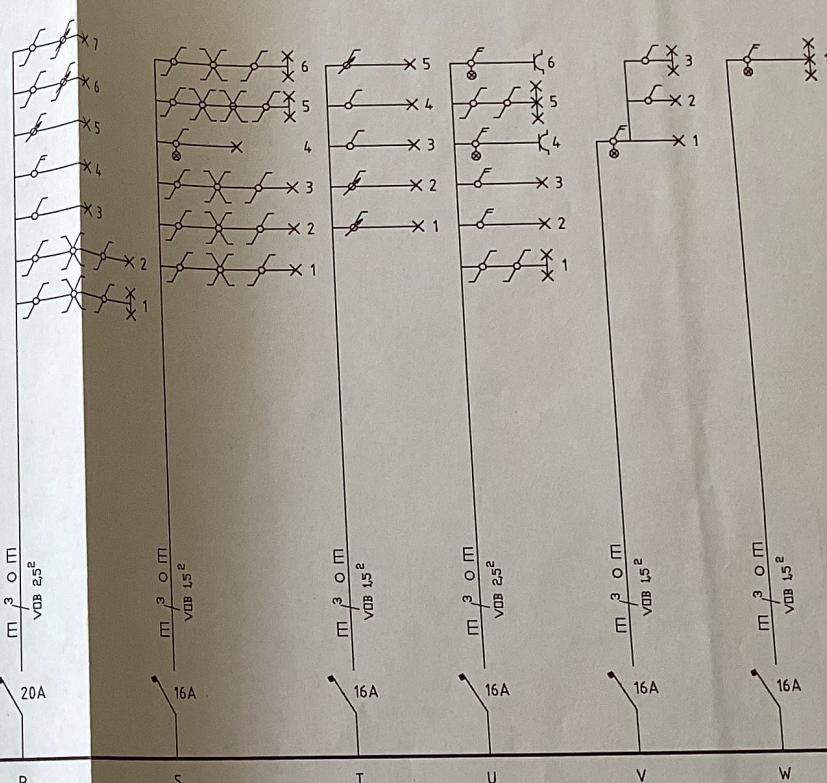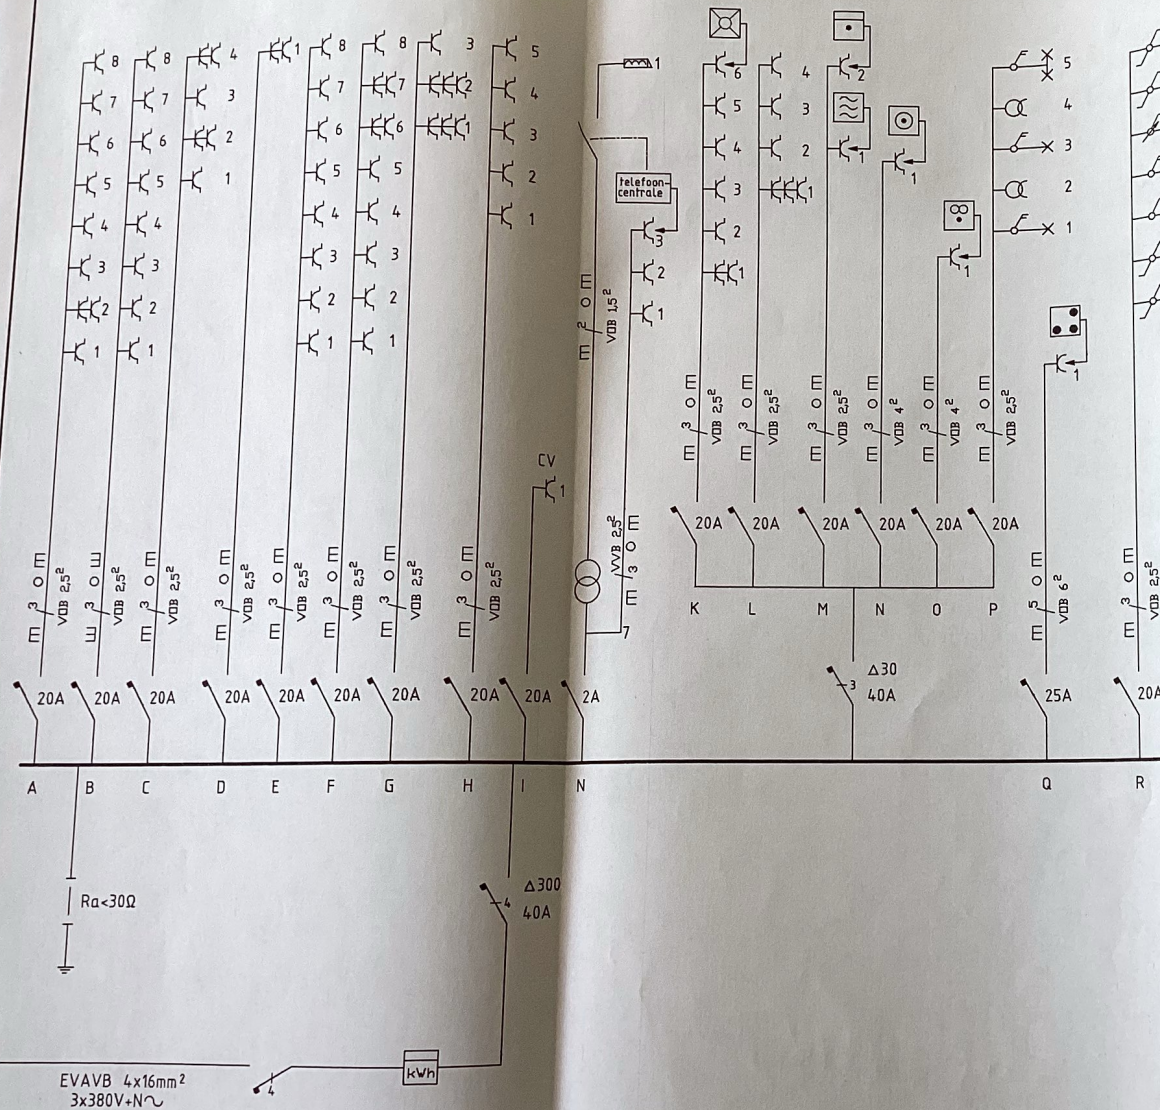


De afgevaardigde van het erkend organisme,	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,	De eigenaar,
 13/6/16 B.N.	Paul De Peuter Aarschootsesteenweg 113 3130 Beteekom 	Dhr & mvr Goovaerts - De Peuter Gijmelbergstraat 19 3202 Langdorp
(handtekening en datum)	(handtekening en datum)	(handtekening en datum)


Kruipkelder

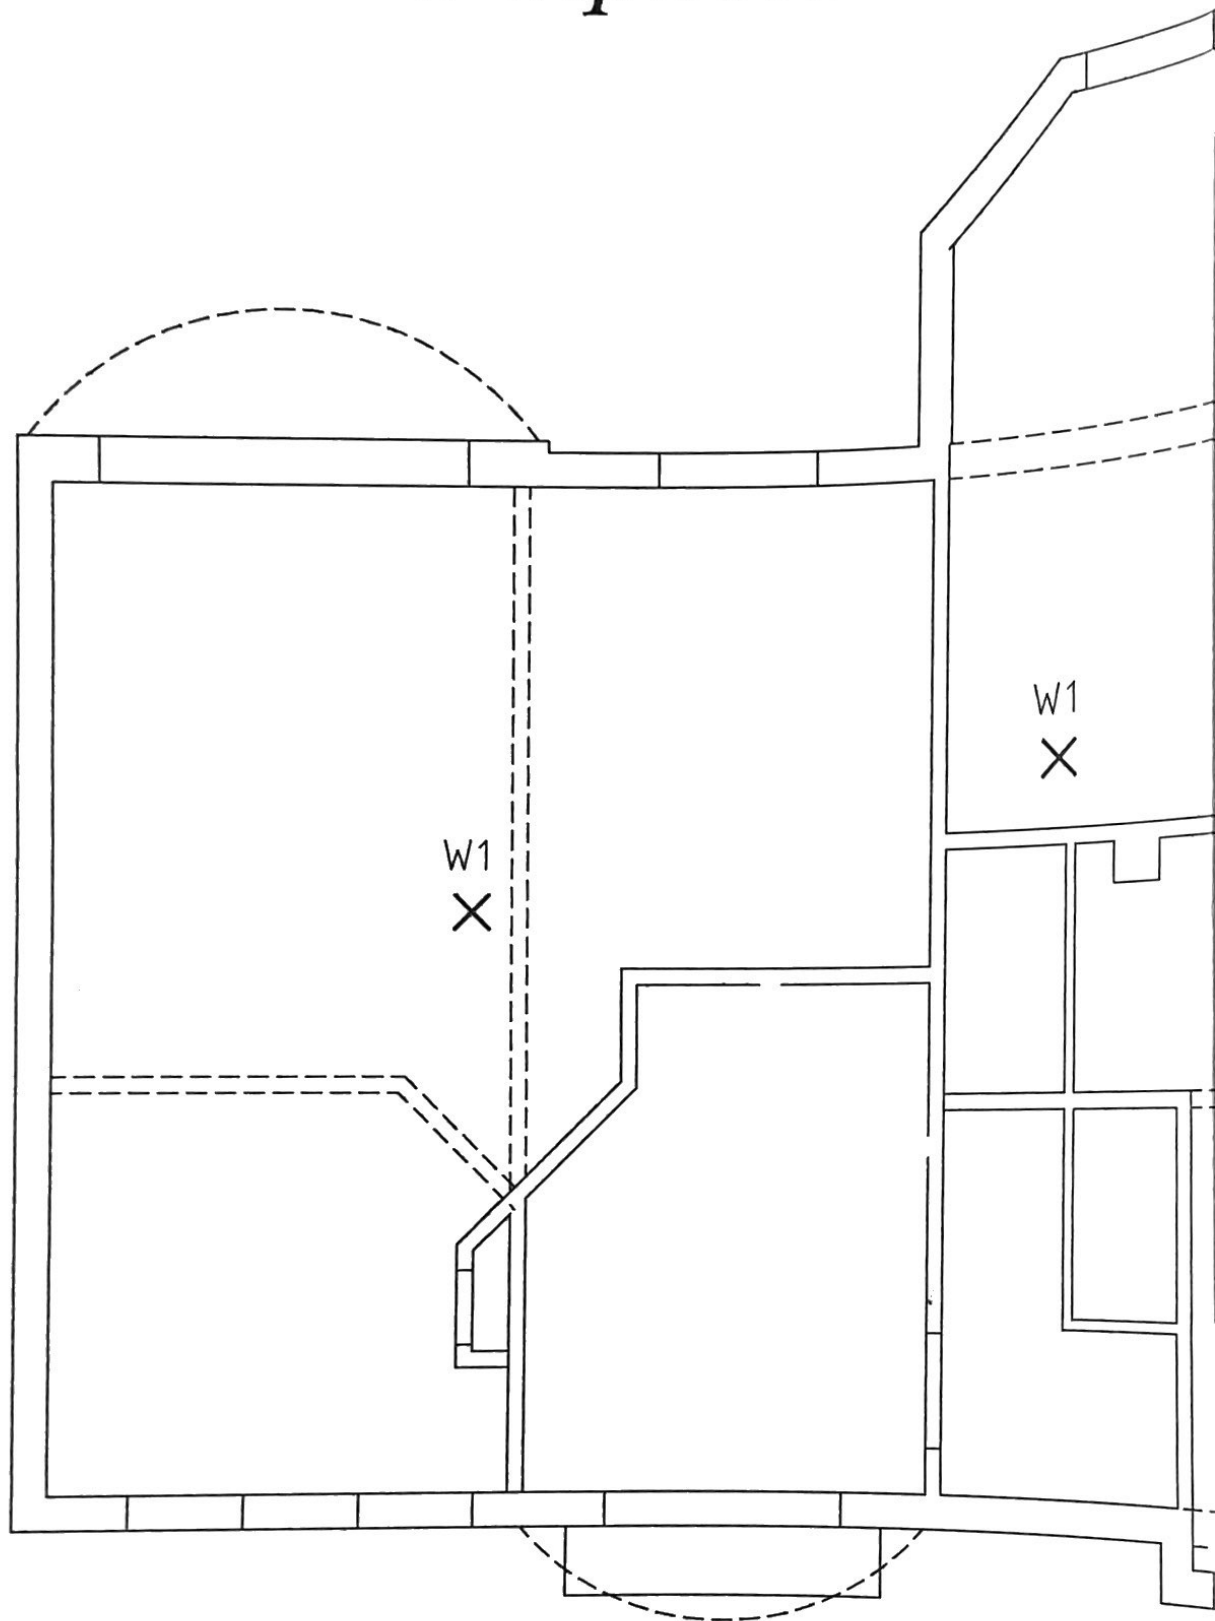


Gelijkvloers

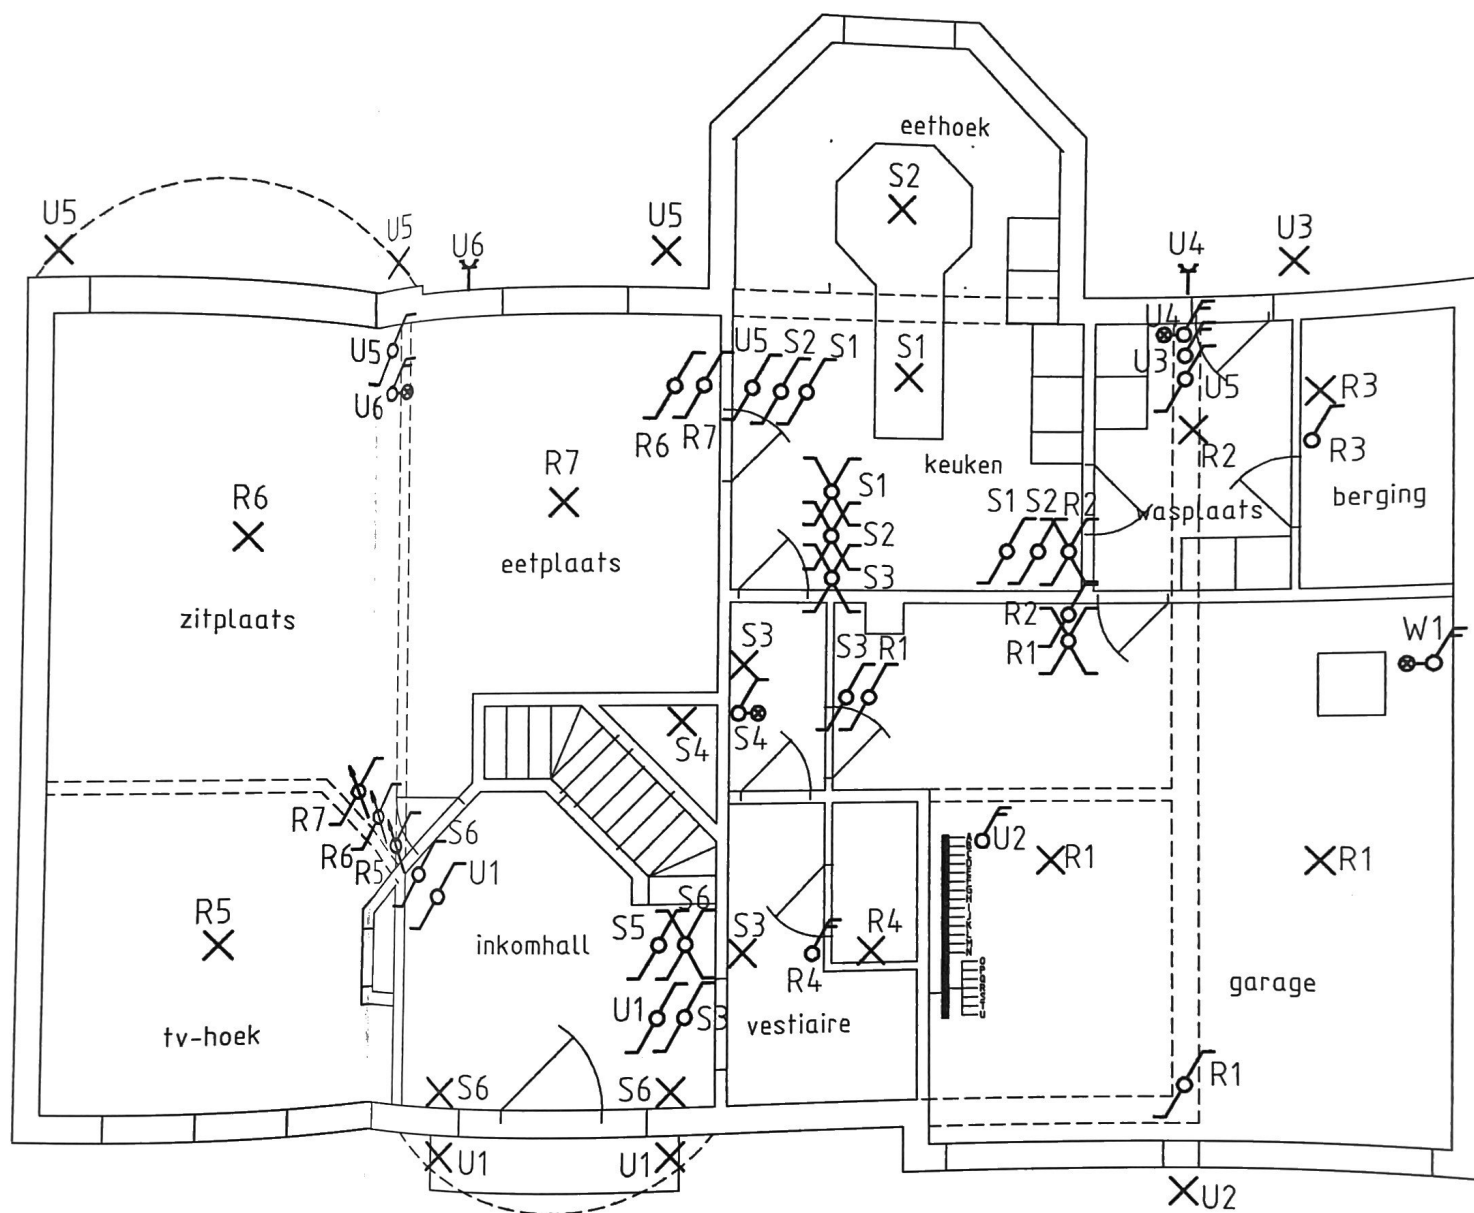

Boven

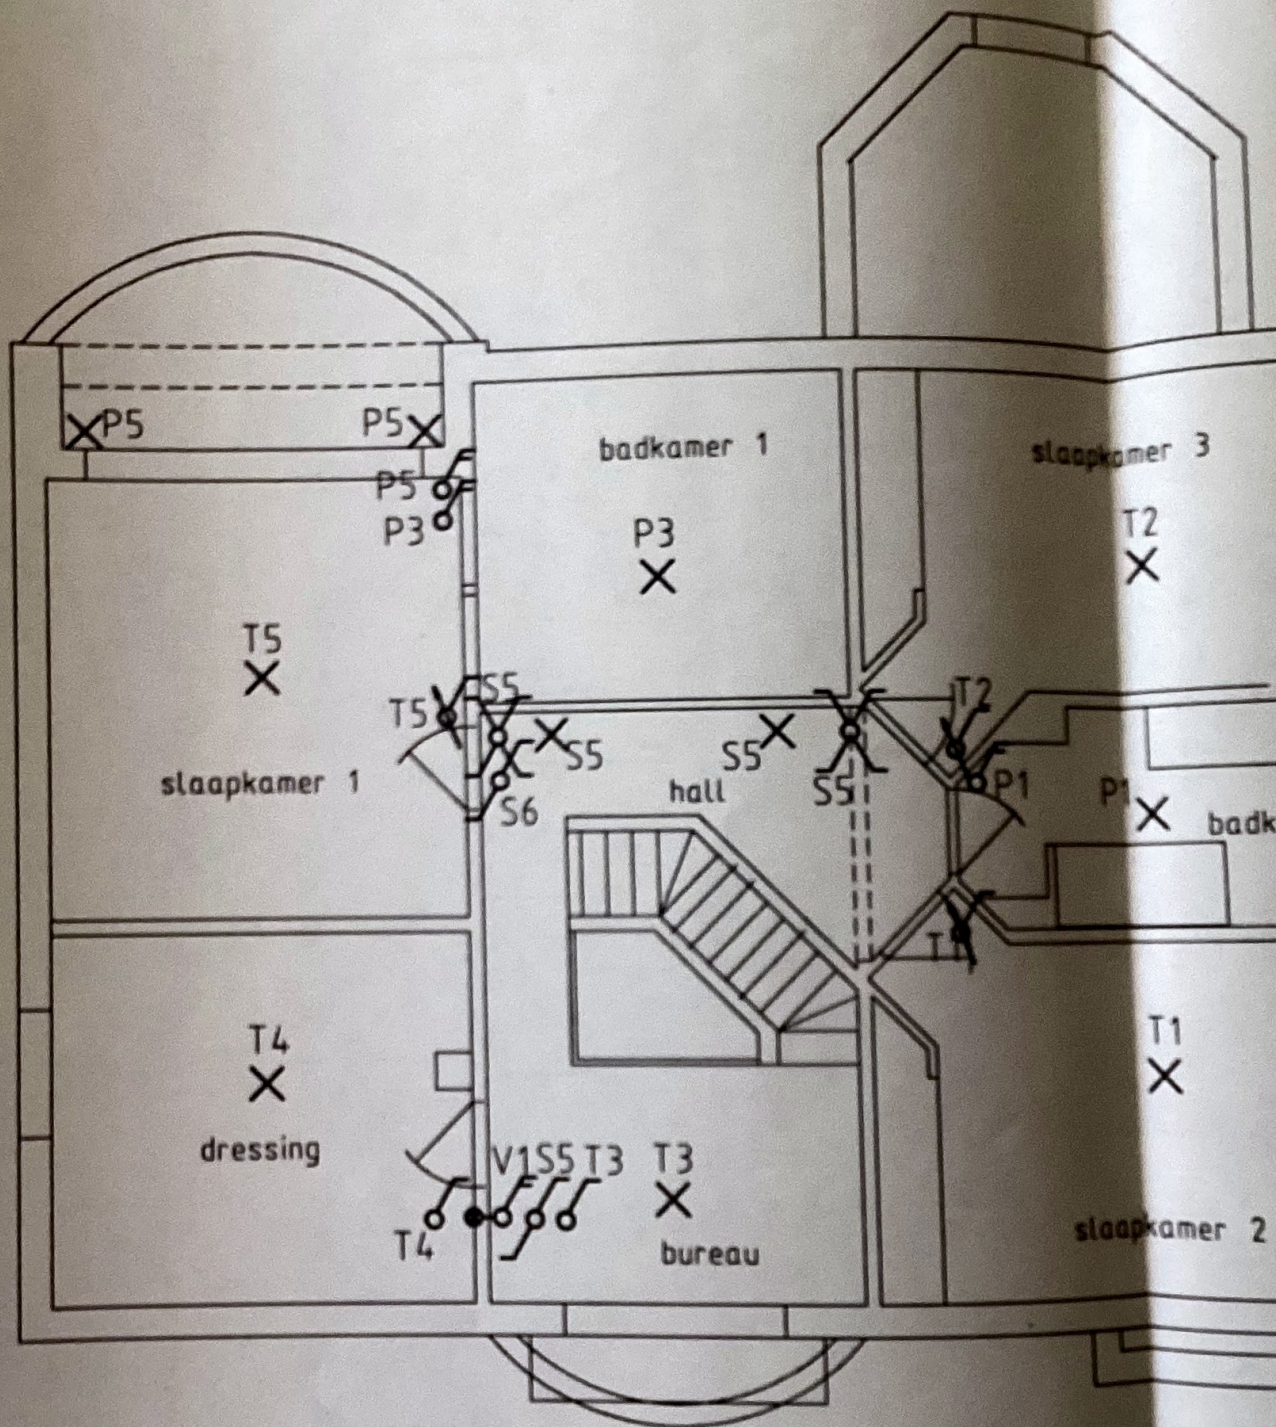

Boven

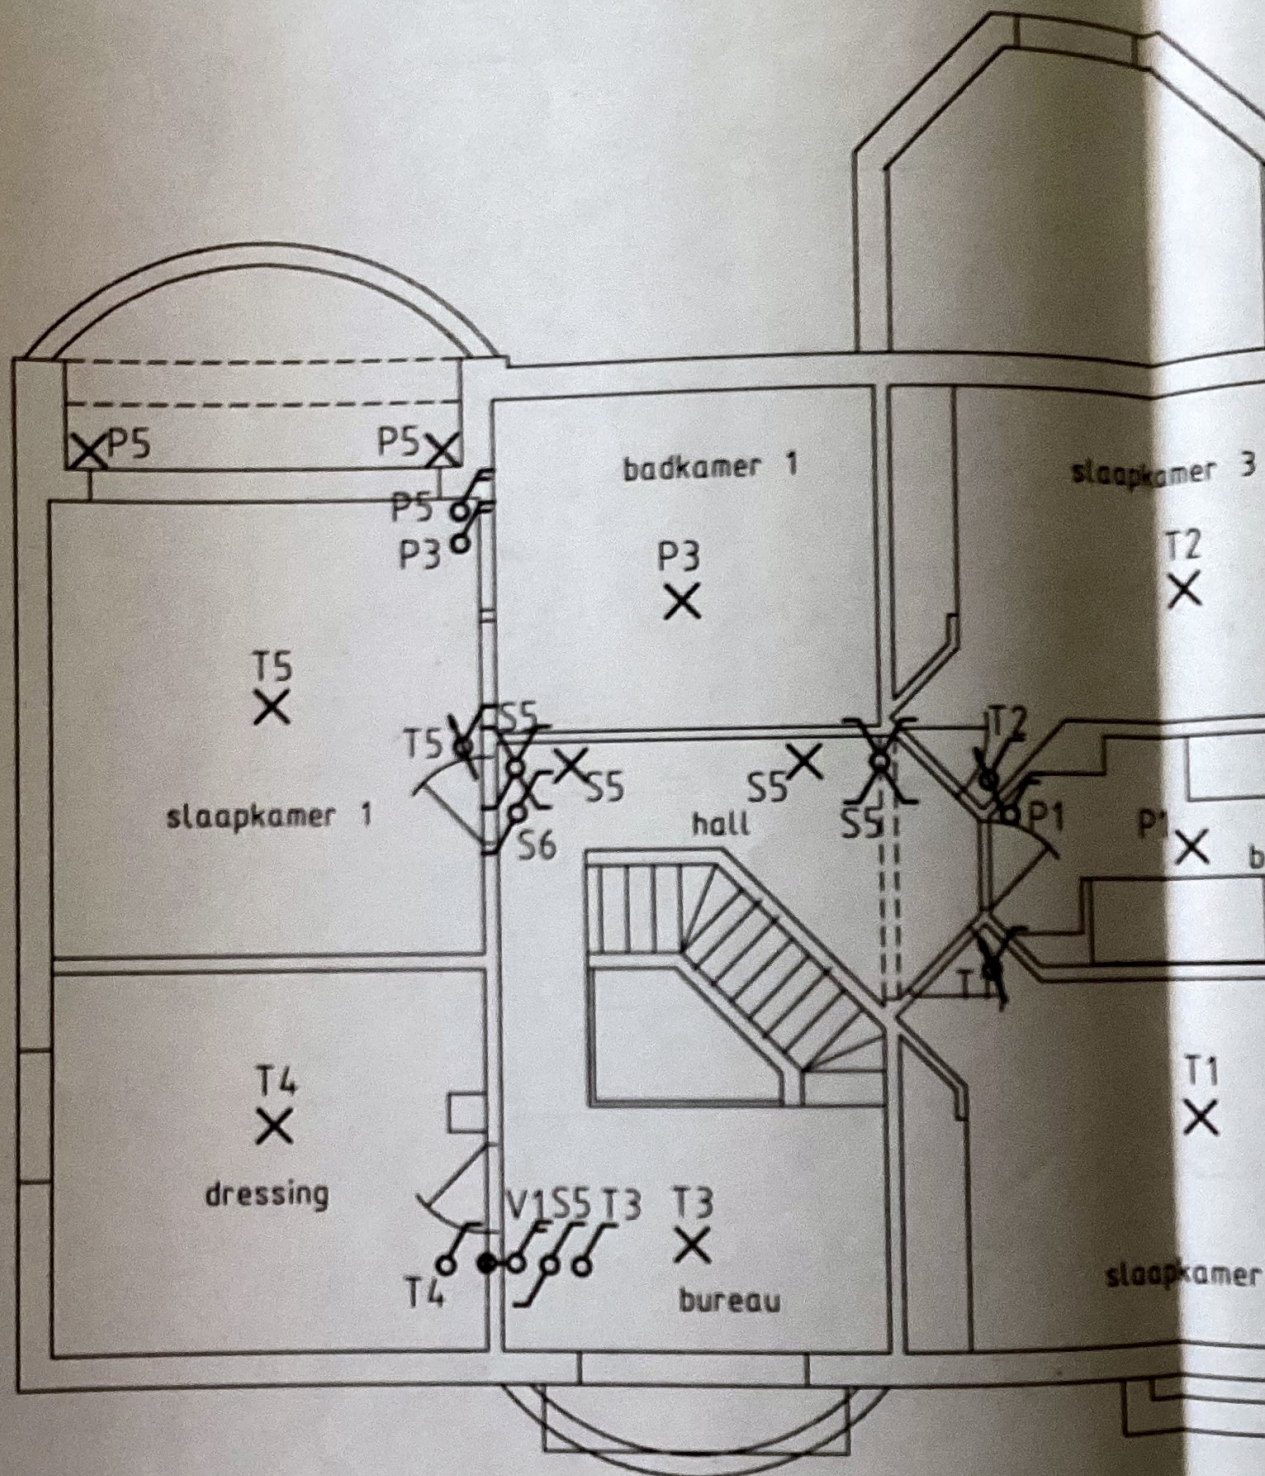

De afgevaardigde
van het erkend organisme,

Jan L. 21/6/96
(handtekening en datum)

De verantwoordelijke
de uitvoering van het werk,


Paul De Peuter
Aarschotsesteenweg 113
3130 Betekom

Paul De Peuter
(handtekening en datum)


Dhr & mvr. Goovaerts - De Peuter
Gijmelbergstraat 19
3202 Langdorp

(handtekening en datum)


Zolder


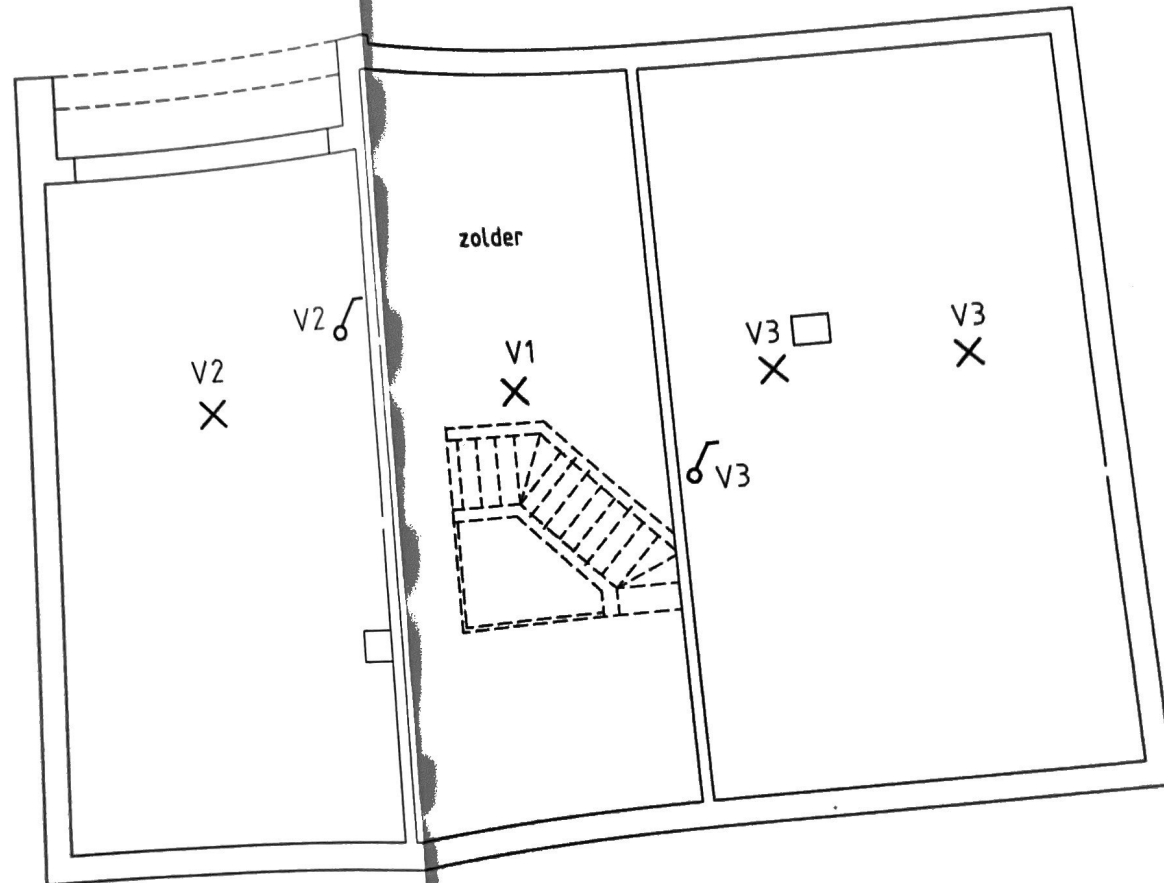


lijkvloers

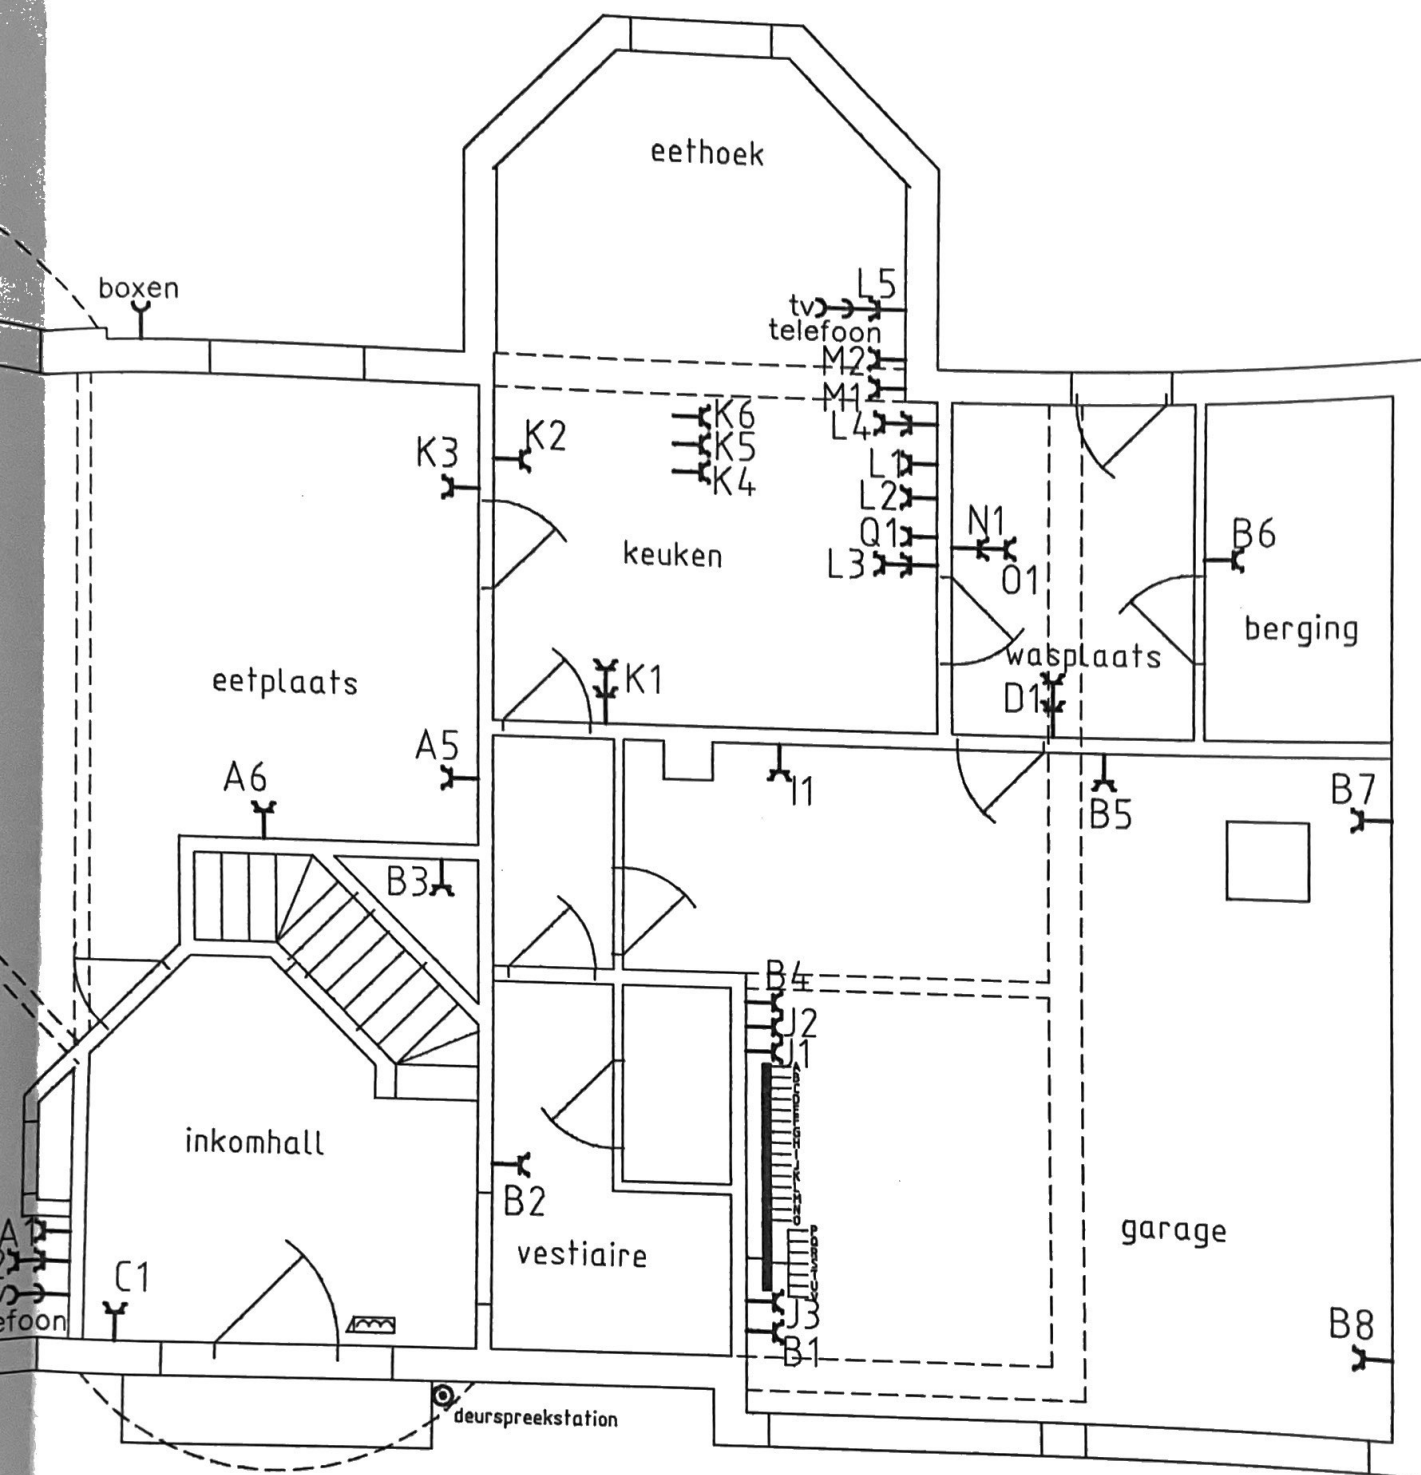


Boven

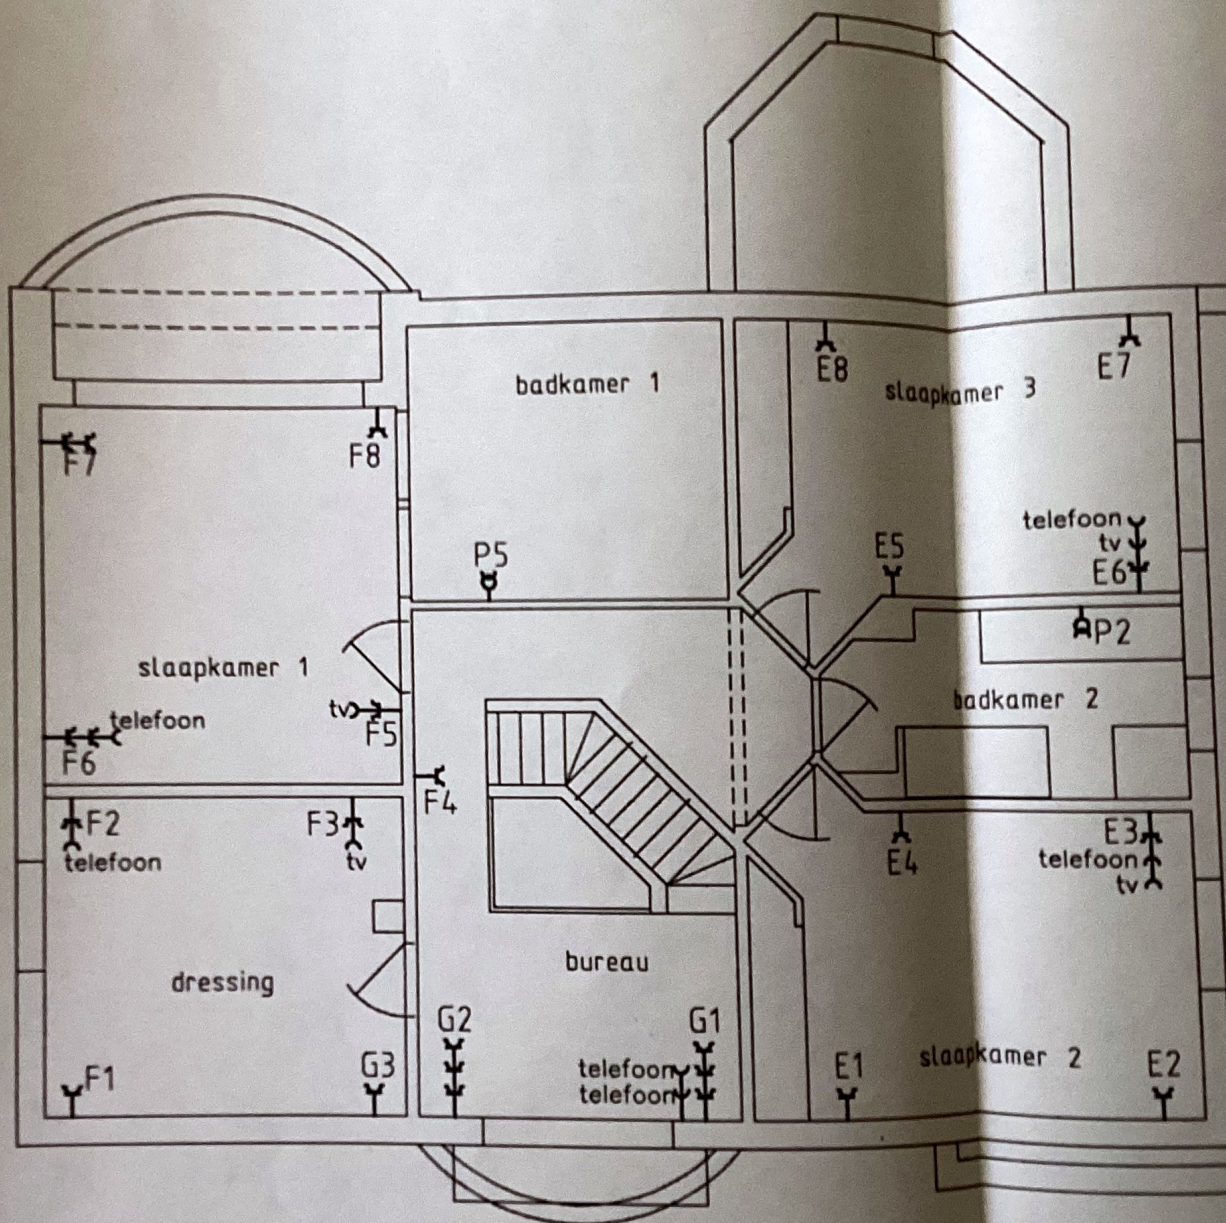

De afgevaardigde van het erkend organisme,	De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk,	De eigenaar,
 13/6/96 BTV (handtekening en datum)	Paul De Peuter Aarschotsesteenweg 113 3130 Betekom  (handtekening en datum)	Dhr & mvr Goovaerts - De Peuter Gijmelbergstraat 19 3202 Langdorp (handtekening en datum)

Zolder

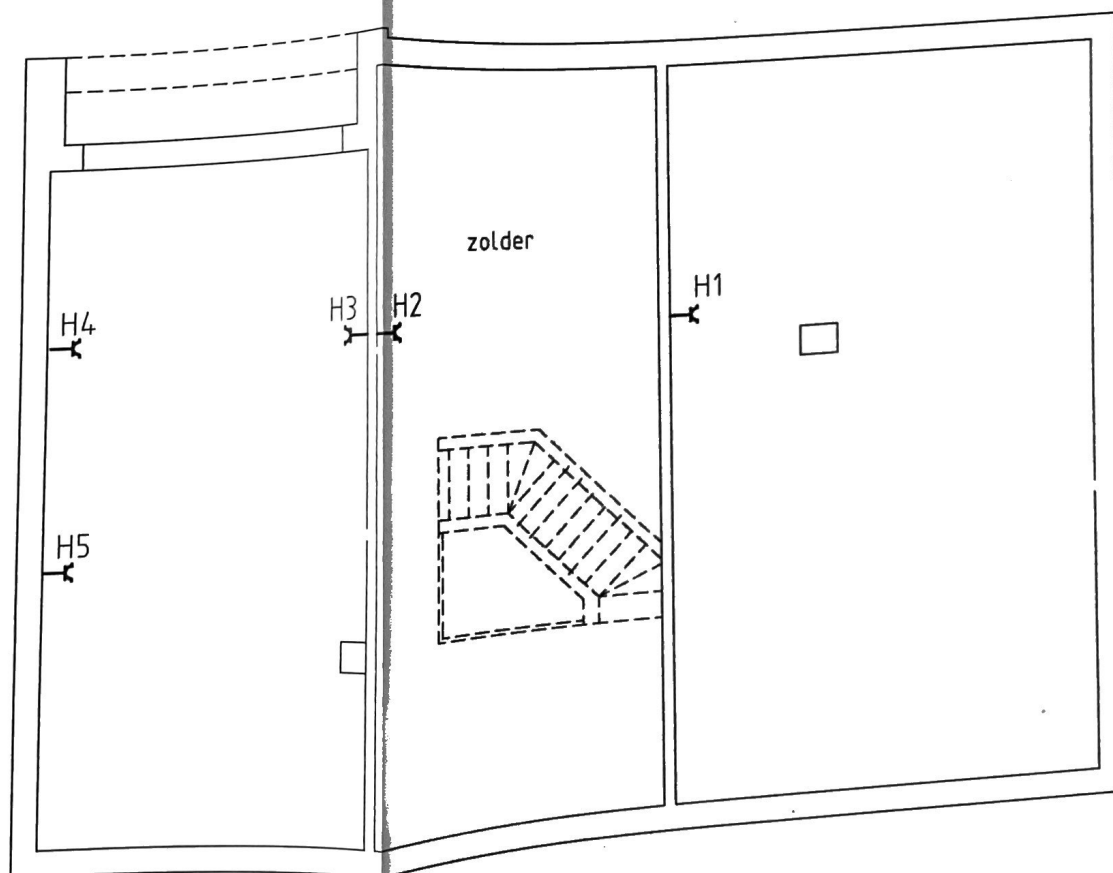

NOEDIG	VOEDING	JUNTA
SAUNA	VOEDING ZWEMBAD	
NVB 564		
ZWEMBAD	VOEDING POMP ZWEMBAD	
NVB 364		
Pomp zwembad	Separaatke in Ruim	
NVB 3625		
IL IL		
20A 3F+H		
A'		
20A 3F+H		
B'		
15A		
C'		
20A		
D'		

VAN ALSB

Diff 30mA
40A.

KAST 4 VAN ALSB.
