

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN

T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0292-151007-02_01 Datum van het onderzoek: 07/10/2015

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : JEF HEYMANS
DENDERMONSESTEENWEG 129 bus 5
2830 WILLEBROEK


Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : JEF HEYMANS
Adres : DENDERMONSESTEENWEG 129
2830 WILLEBROEK

OPDRACHTGEVER : RENOVERGO
Adres : LINDENBOSLAAN 23
2630 AARTSELAAR

INSTALLATEUR : RENOVERGO
Adres : LINDENBOSLAAN 23
2630 AARTSELAAR

BTW of IK : 0893160558

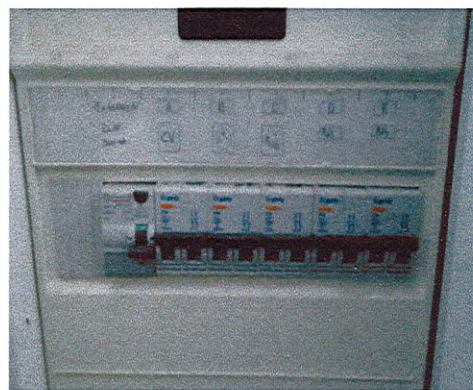

EAN : Teller nr. te plaatsen Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	BUREEL
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/01/83
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	87
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	aut 40 max A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	5
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 14 Ohm RI tot 10 Mohm

BESCHRIJVING:

Zie ook eendraad schema en situatie schema in bijlage Zie ook schets

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 INDIEN DIT BUREEL IN GEBRUIK WORDT GENOMEN DOOR BEDRIJF MET PERSONEEL, DIENT DE UITBATER EEN RISICO-ANALYSE EN INSTRUCTIES TE VOORZIEN, ALSOOK TABEL UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN, (KB 4/12/21012)
- 2 MOMENTEEL IS HET BUREEL NIET IN GEBRUIK.

Besluit De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
Het ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/10/2020 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0292 MARC VERSCHUERE

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- e) de controle van de foutstroom en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.




STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 07/10/2020.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.


Schema's

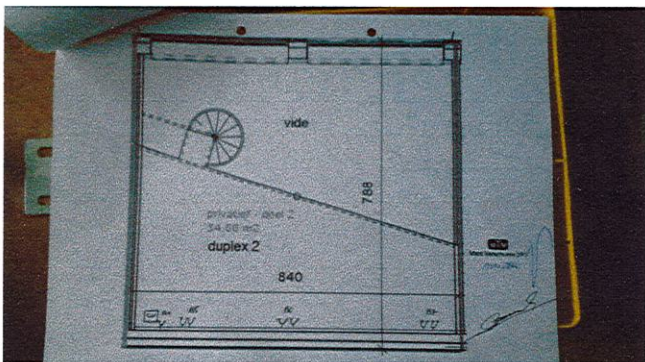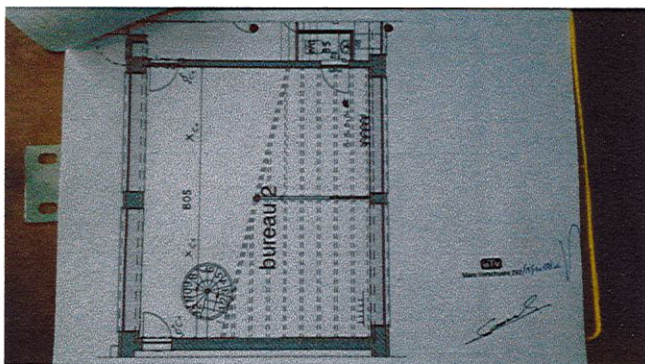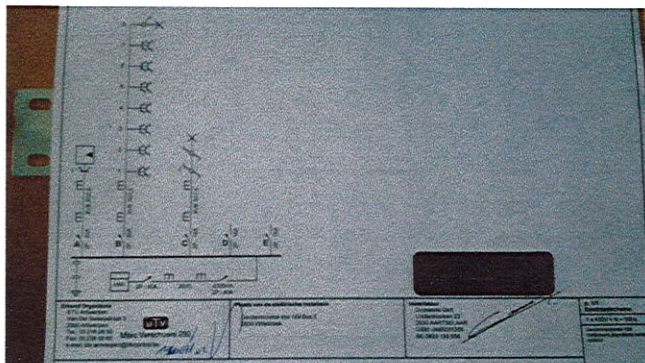

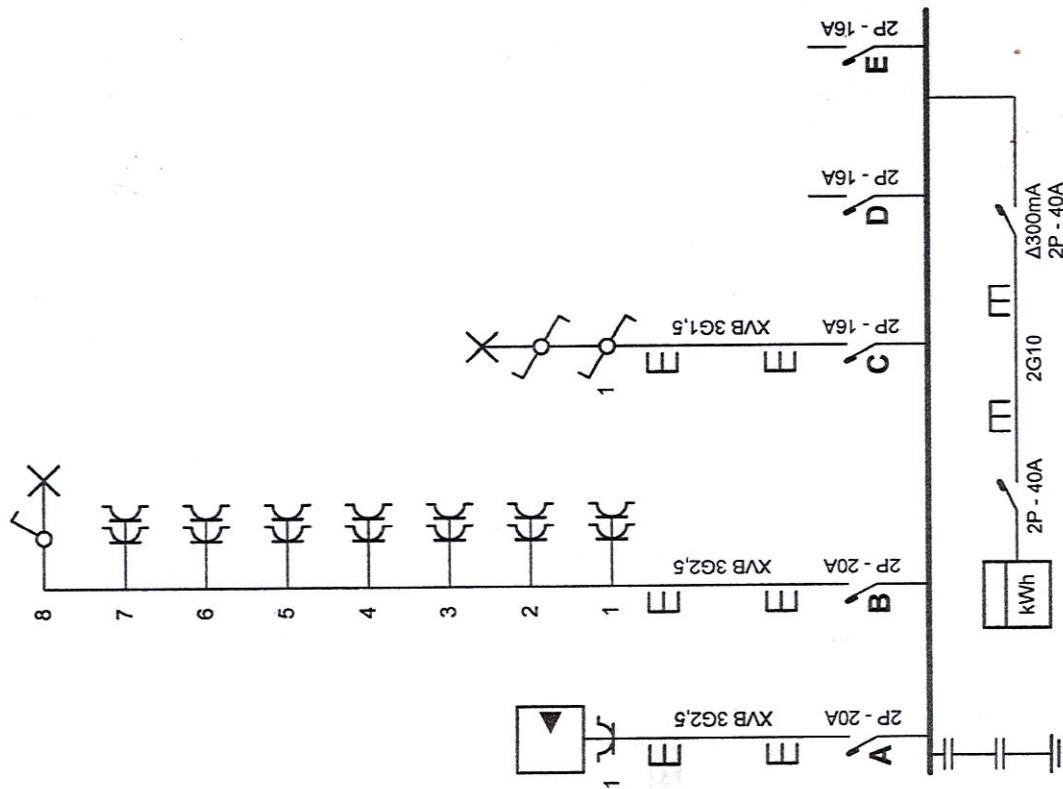


RENOVERGO
www.renovergo.be
Gert Goossens 0485 03 12 55

Erkend Organisme BTV Antwerpen Van Der Sweepstraat 3 2000 Antwerpen Tel.: 03 216 28 90 Fax: 03 238 86 65 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be BTV Marc Verschuere 292 e-mail: btv.antwerpen@btvcontrol.be	Plaats van de elektrische installatie Dendermondse stw 129 Bus 5 2830 Willebroek	Installateur Goossens Gert Lindenboslaan 23 2630 AARTSELAAR GSM: 0485031255 BE 0893 160 558
Schema's getekend door: Goossens Gert	p. 1/1 Eendraadschema 1 x 400V + N ~ 50Hz Dendermondsestw 129 Gelijkvloers polyvalente ruimte meterri:	

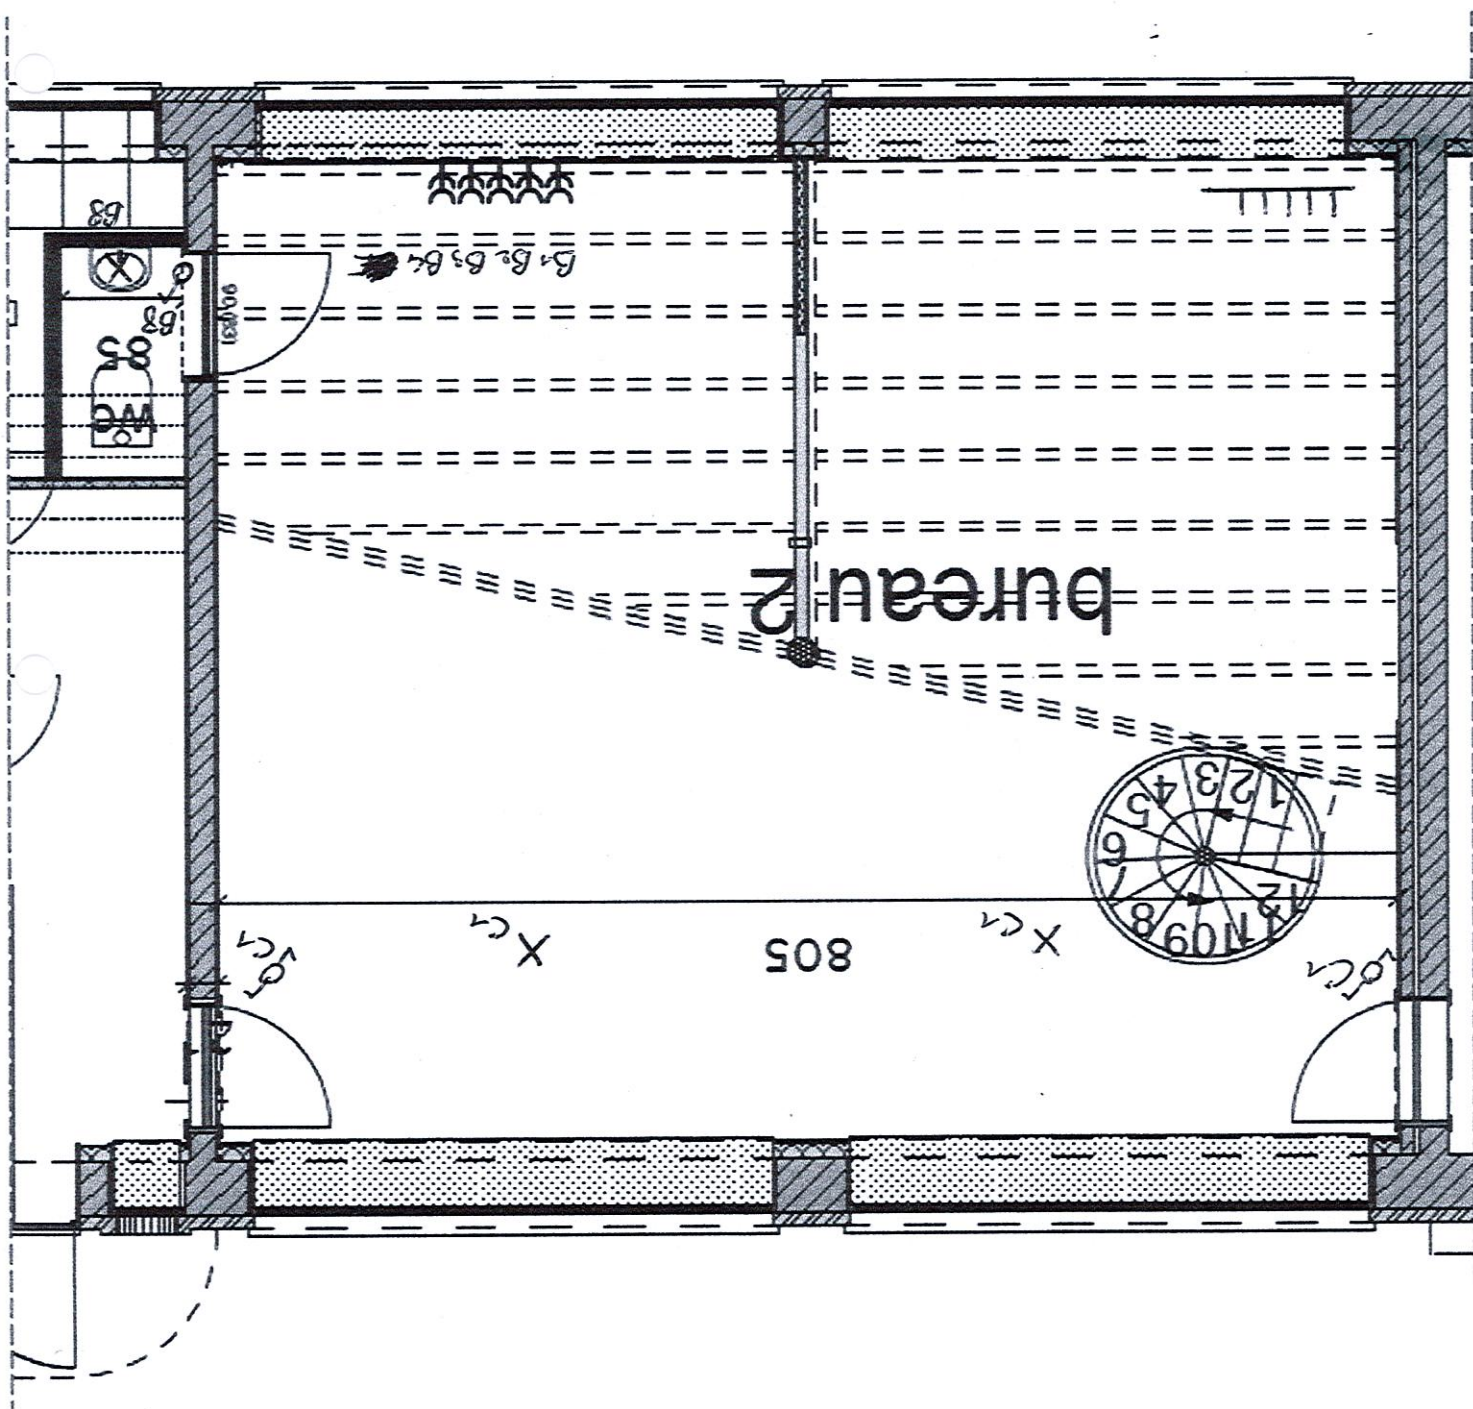

BTV

Marc Verschuere 292 / 15-10-08102

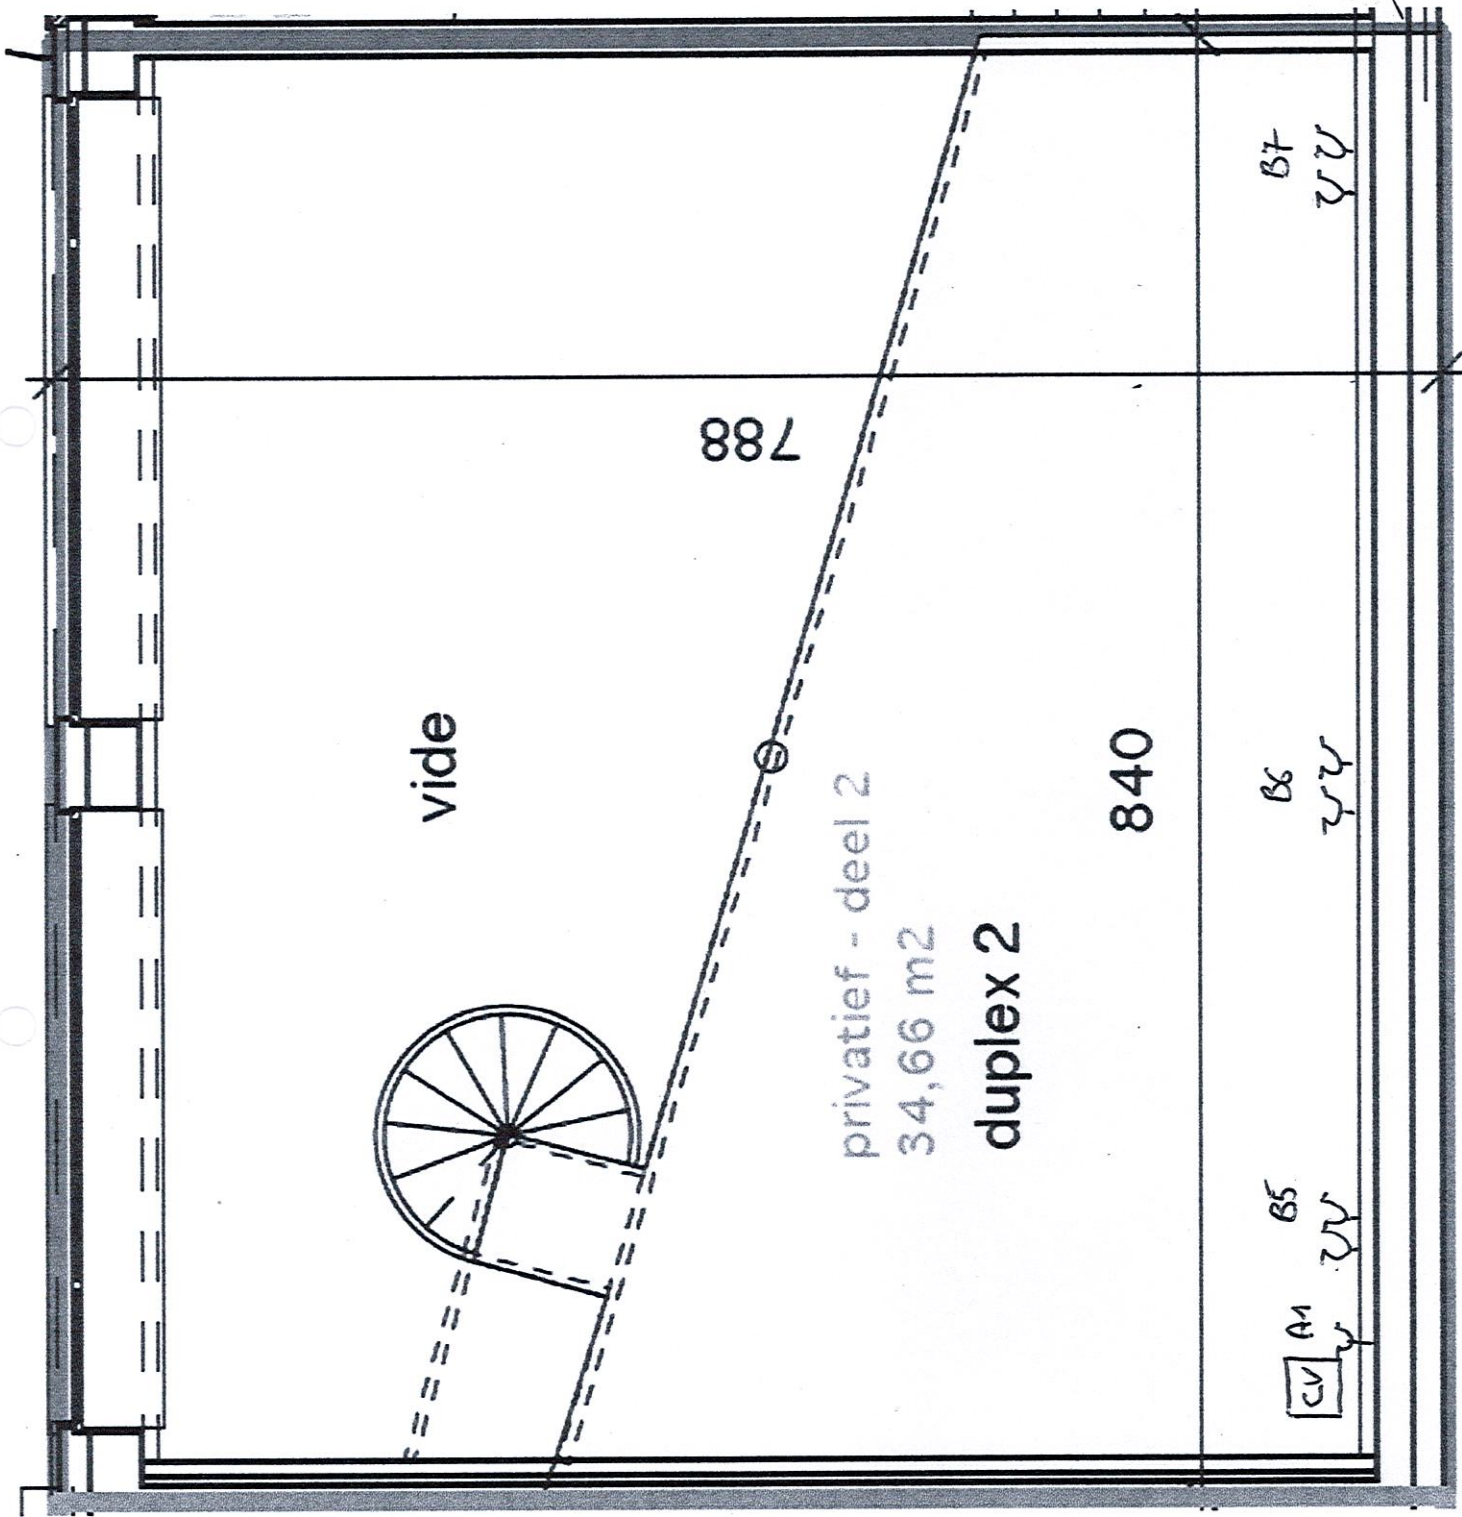

BTV

Marc Verschuere 299

15100702

[Handwritten signature]

vide

788

privatief - deel 2
34,66 m2

duplex 2

840

B7

UV

B6

UV

B5

UV

CV A1
