

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/01/2026

Inspecteur: Yoric Verdeyen

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23120804

Datum verslag: 19/01/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lozenhoekstraat
Huisnummer 108
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Eigenaar

Naam Erwin Neuville
Straatnaam Lozenhoekstraat
Huisnummer 108
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820046656825

Teller Nr.: : 1SAG1100592513



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V
Aantal kringen: 17
Meter / bord verbinding: 6 mm²
Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 4,83 MΩ

RE: 2,95 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alles	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/1/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:33 tot 13:10
De inspecteur Yoric Verdeyen

Yoric Verdeyen
ACEG VZW - #494


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/1/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







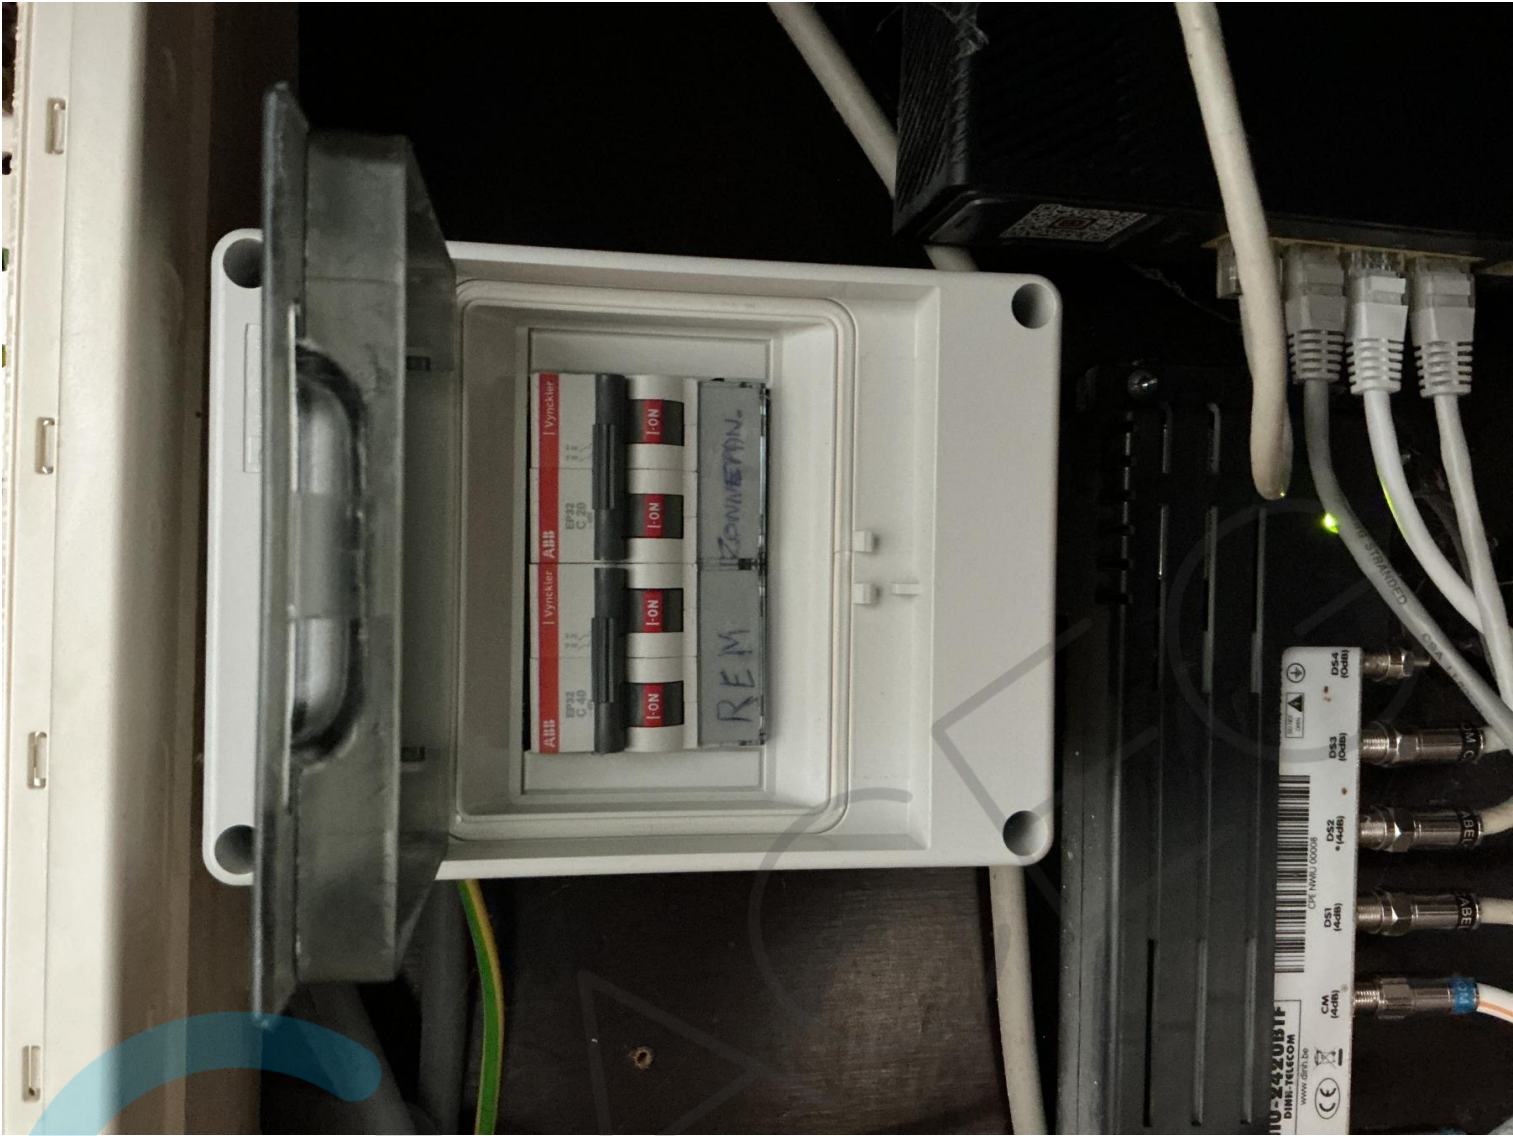






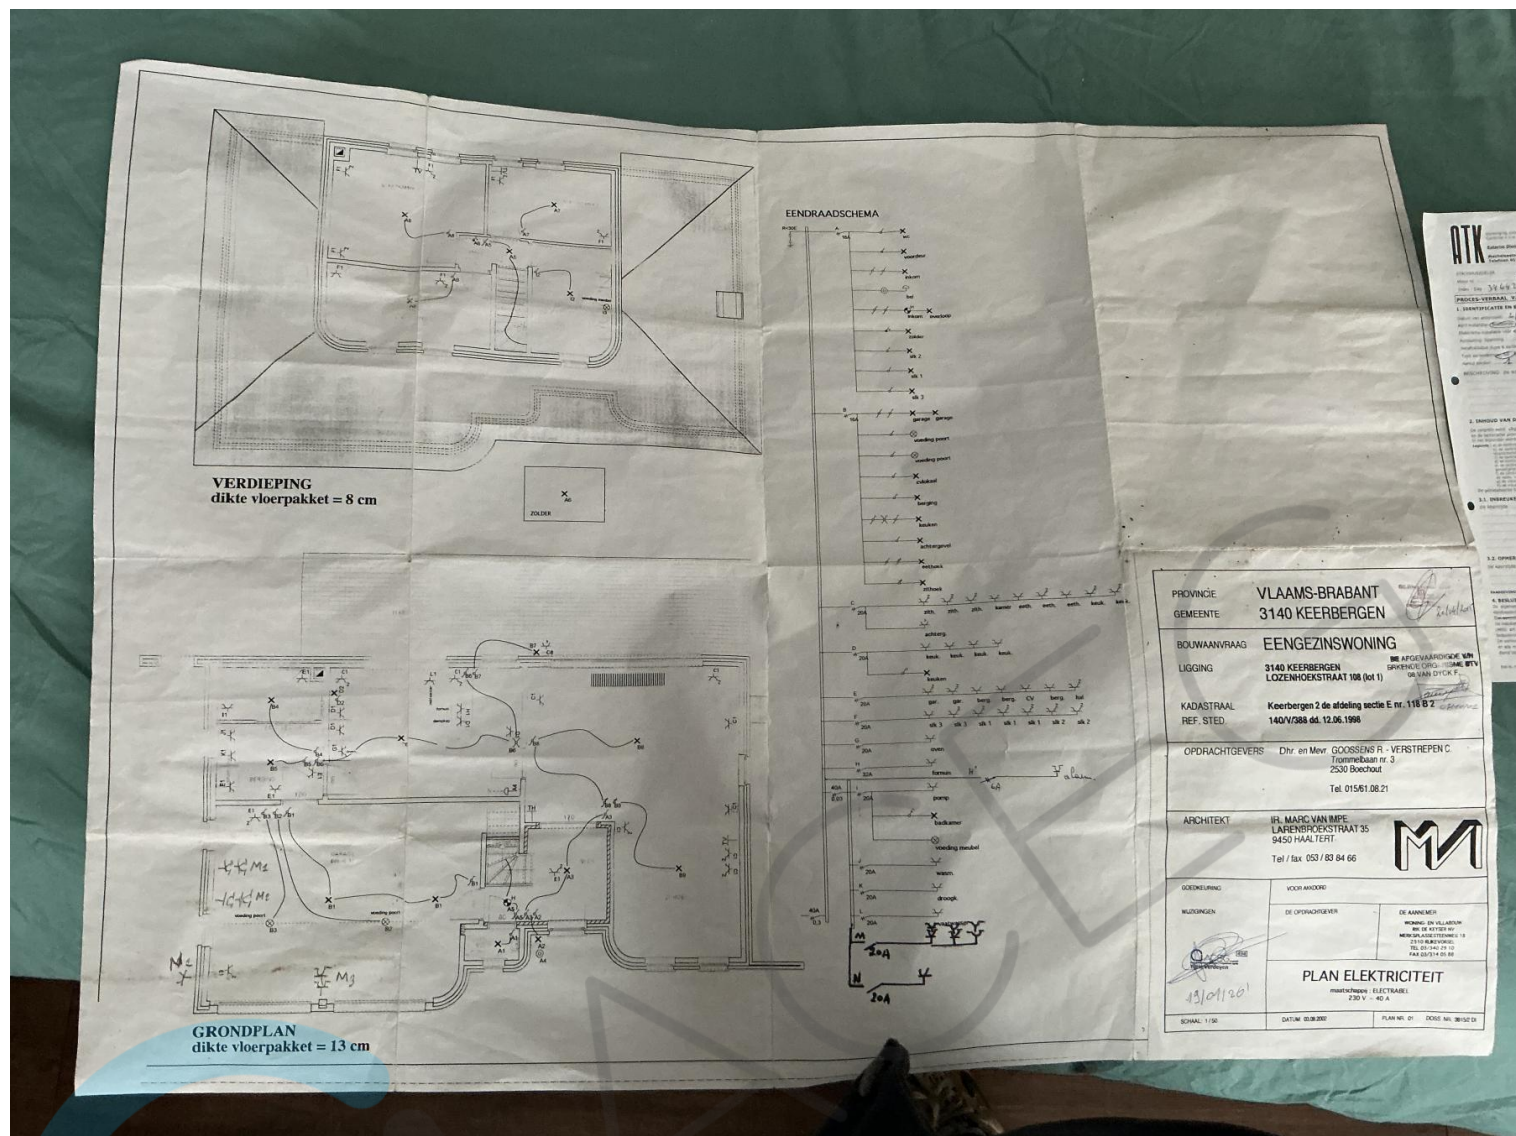

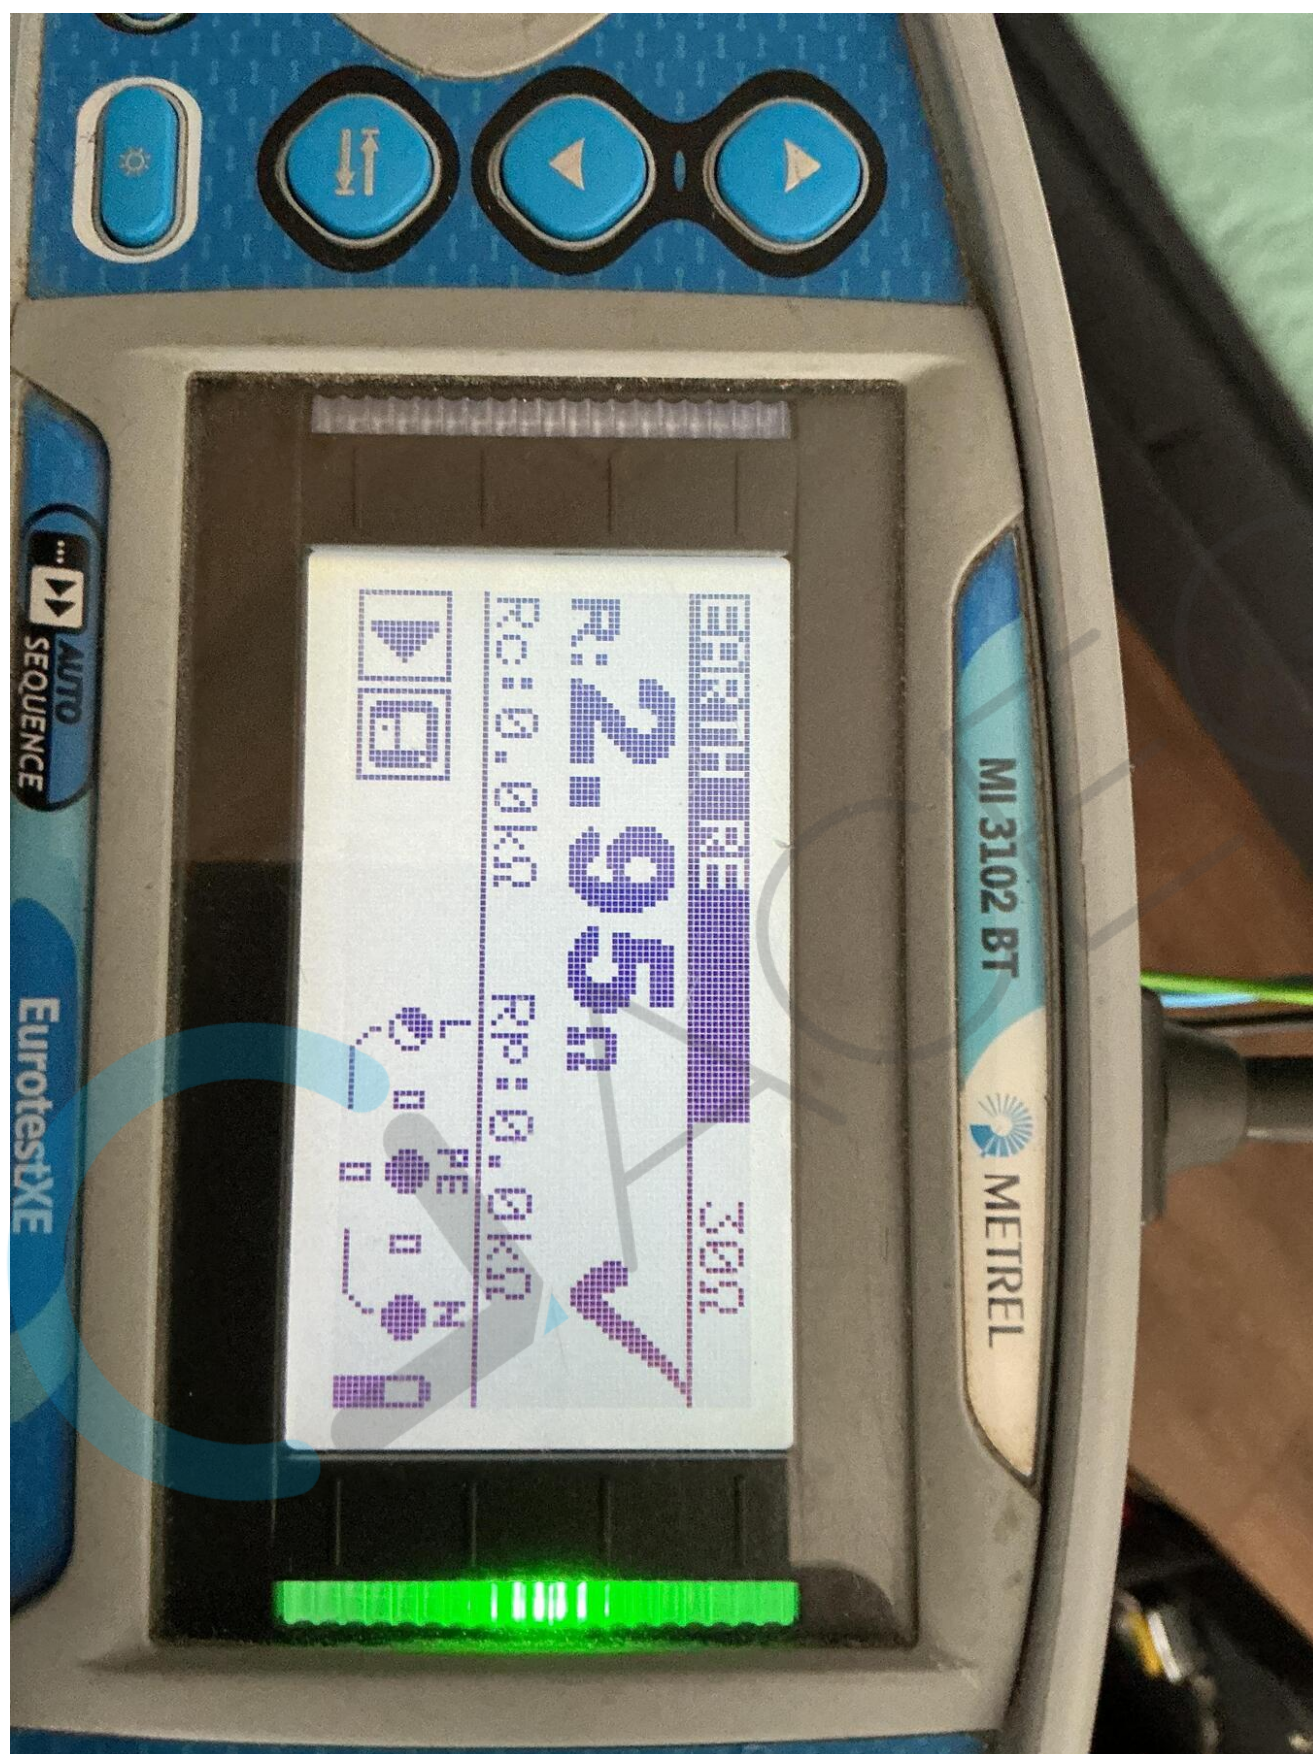



Zonnepanelen:



Aantal panelen:10
JaSolar 405Wp half cell
Aantal strings:1
P(totaal): 4050W

Solarkabel (DC):
6mm² (CCA)
Plaatsingswijze:



Omvormer:
Aantal: 1
SolarEdge HD-Wave SE3500H
P(ac max): 3500W
S/N: ST0622-0740942CE-8D


Voedingskabel (AC):
XVB 3G2.5
Plaatsingswijze:



A

Automaat PV-installatie:
2P 20A Type C

Bestaande elektrische installatie

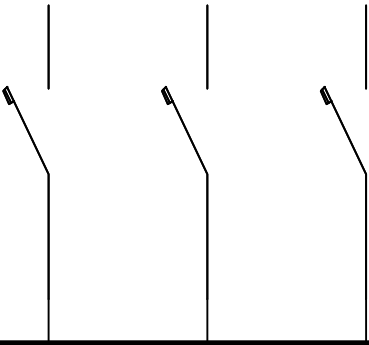


Interne bekabeling:
6mm²

Remautomaat
Geplaatst: Ja
2P 40A Type C


Algemene Diff 300mA
2P 40A Type A

EAN: 541448820046656825



230V + N
Teller
2P 40A



Installateur: Brever BVBA
Prins Van Everbergstraat 25
3078 Everberg
Tel: 0472 71 33 93



Klant: Ellen Gobien
Adres installatie: Lozenhoekstraat 108,3140
Keerbergen
Datum: 26/07/2022

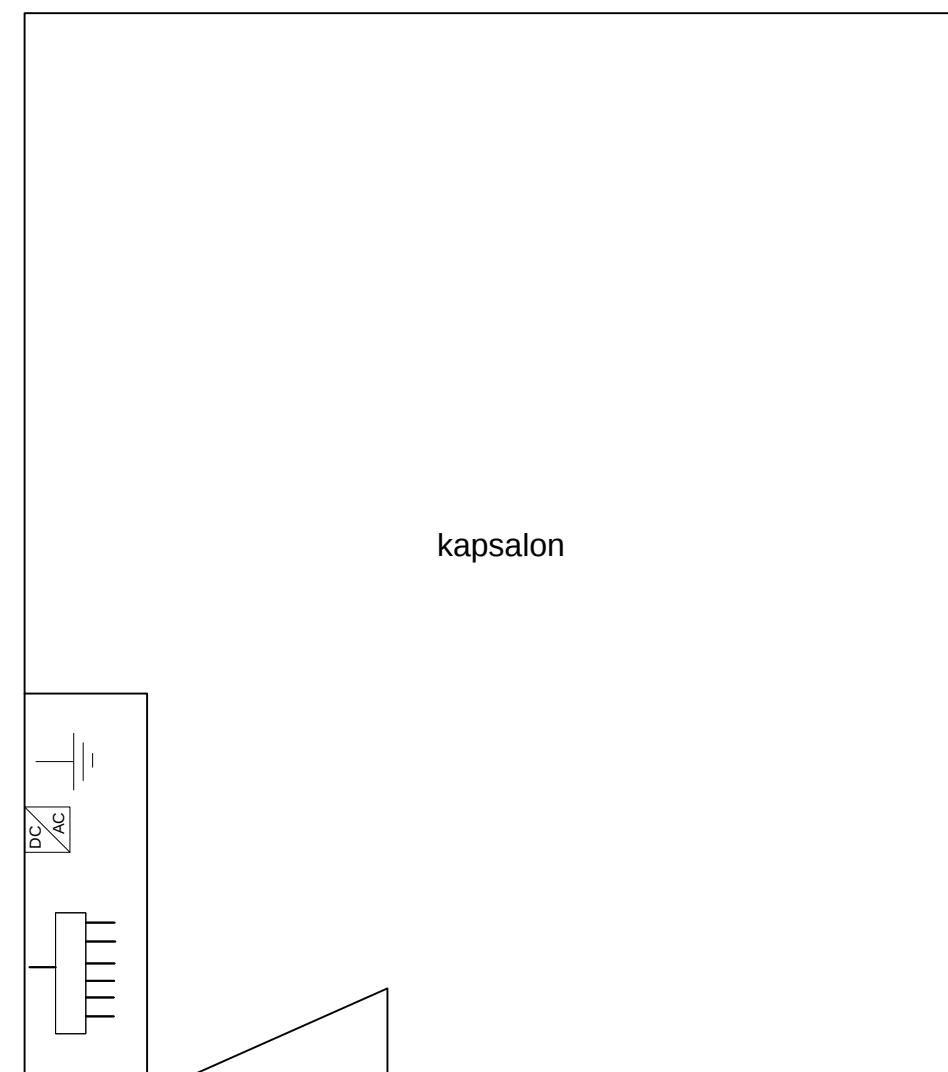

Installateur: Brever BVBA
Prins Van Everbergstraat 25
3078 Everberg
Tel: 0472 71 33 93

Klant: Ellen Gobien
Adres installatie: Lozenhoekstraat 108,3140
Keerbergen
Datum: 26/07/2022
