



Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Vosse Putten 5 - 2235 Hulshout



Uitgevoerd op: 17/03/2023



Uitgevoerd door: MARC TONNET (3932)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam Patricia Verdyck
Adres Vosse Putten 5- 2235 Hulshout

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam Patricia Verdyck
Adres Vosse Putten 5- 2235 Hulshout

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Niet van toepassing

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vincotte ID 100 161 931
Adres Vosse Putten 5 - 2235 Hulshout
EAN-code Niet meegedeeld
Netbeheerder naam Fluvius
Nr Teller 34845187
Teller index dag 8001,3
Teller index nacht 11023,3
Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 59 81 buildingcenter@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC: CEBABEBB

Uitgiftedatum: 17/03/2023

1 / 13



Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Controlebezoek (6.5.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	- Toepassing van deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Eenfasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	V0B
Voedingsleiding - Doorsnede (mm ²)	10
Aantal eindstroombanen	36
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Huidige nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Installatie ontworpen voor een maximale nominale stroom van (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	4

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofddiff	40	300	A



Verslag


VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

Beschrijving van de elektrische installatie

Bord

Plaats	Garage
Aantal differentieelstroominrichtingen	4
Aantal stroombanen	36

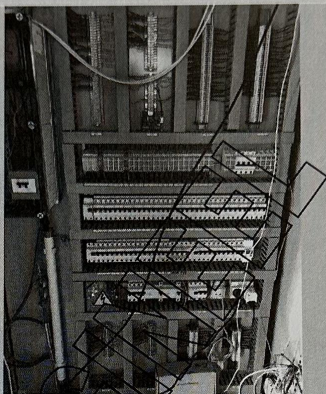

(Inwendige foto)

Type of aarding	Aardingslus
Waarde (Ω)	3.15

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Stroombaanschema - referentie	Woning
Stroombaanschema - versie	1
Stroombaanschema - datum	17/03/2023
Eendraadsschema	Zie bijlagen
Situatieplan - referentie	Woning
Situatieplan - versie	1
Situatieplan - datum	17/03/2023
Situatieplan	dérogation partie 8 d'application.
Situatieplan	Zie bijlagen
Situatieplan van de aardverbindingen	dérogation partie 8 d'application.



Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	In orde
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	In orde

Metingen en beproevingen

Spreadingsweerstand van de aardverbinding(en) (Ω)	3,15
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	4,82
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil



Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 17/3/2048.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.



VERSLAG NR
AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto situatieplan (1 / 6)

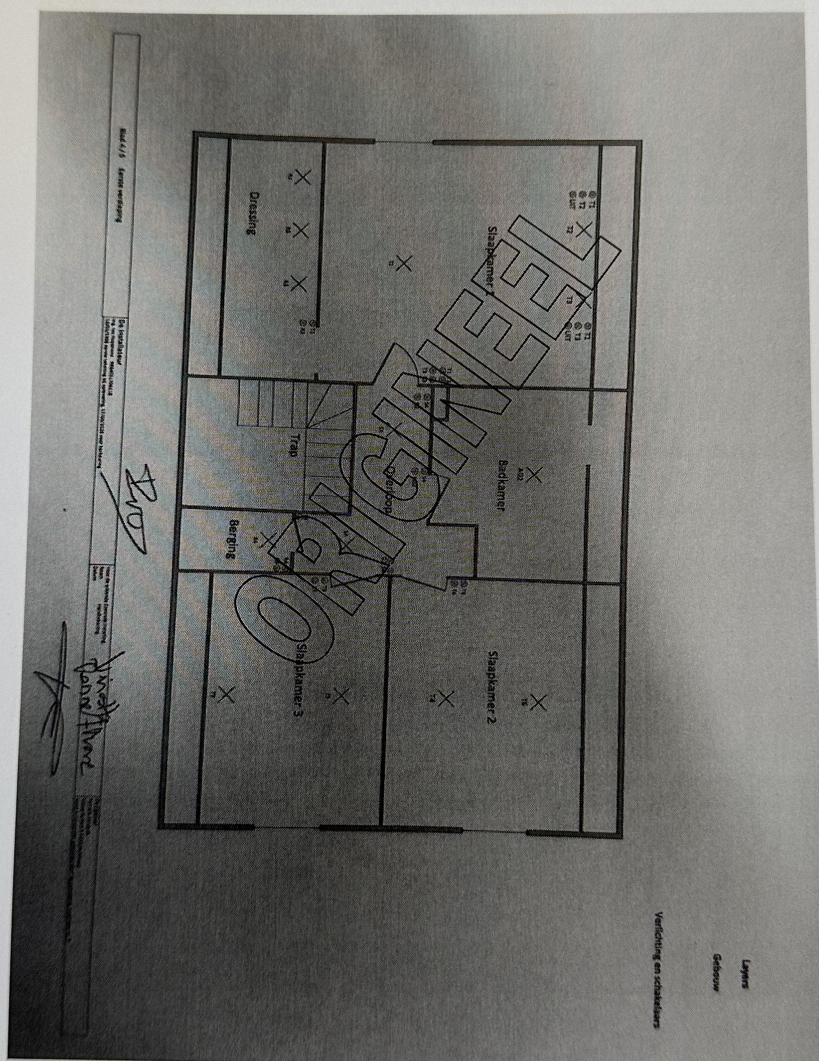




Foto situatieplan (2 / 6)






Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto situatieplan (3 / 6)

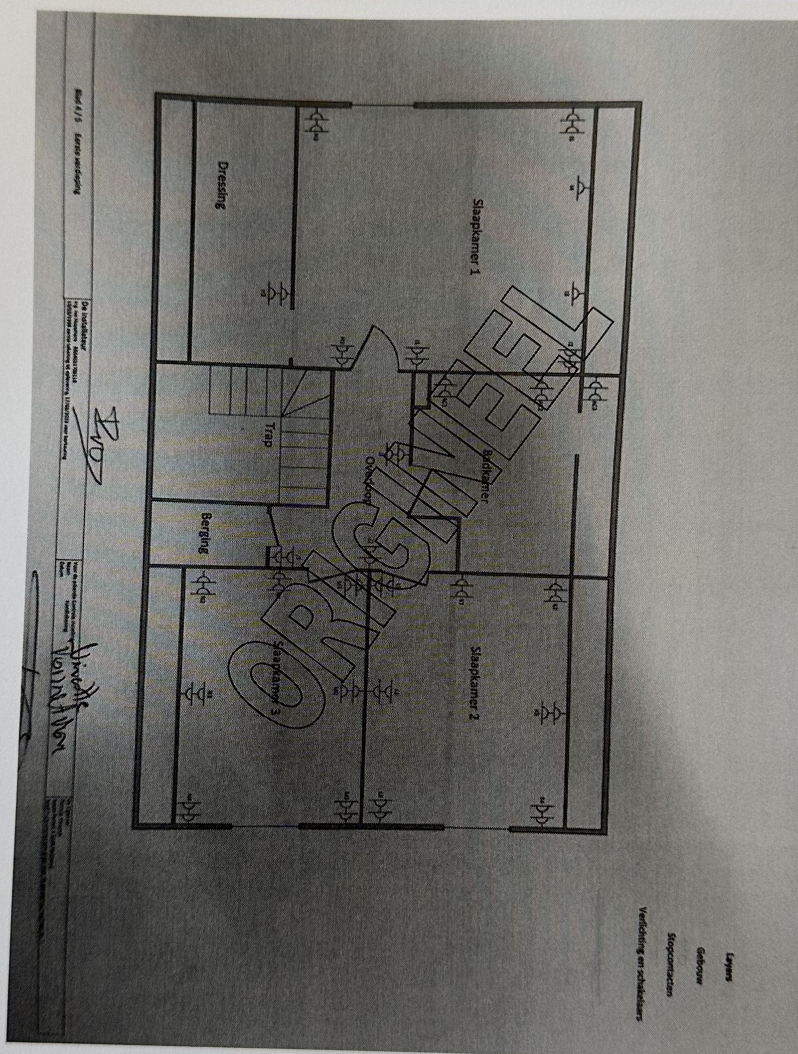




Verslag

VERSLAG NR
AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto situatieplan (4/6)

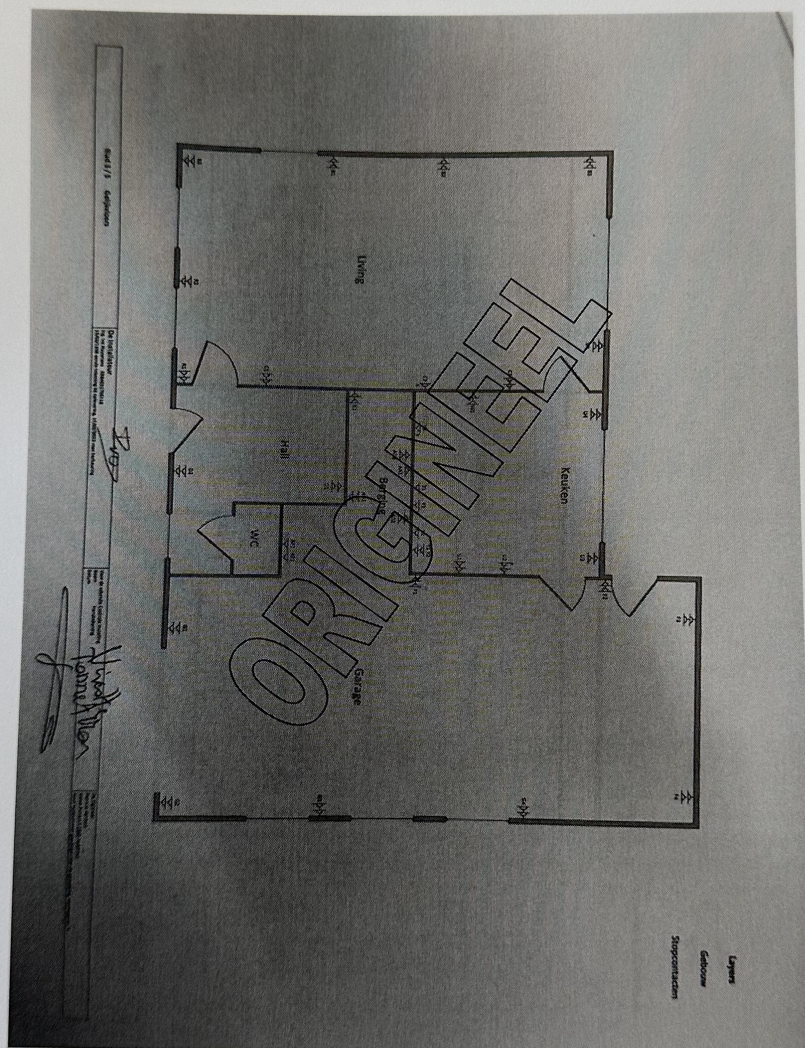




Verslag

VERSLAG NR
AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto situatieplan (5 / 6)

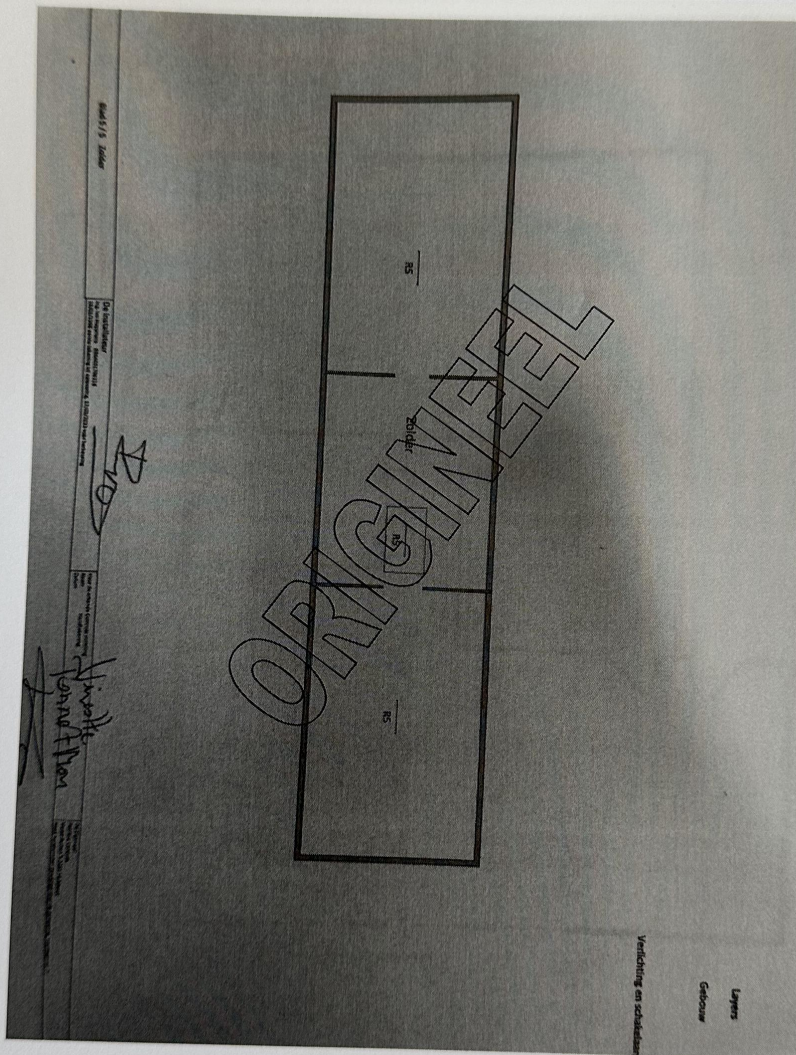




Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto situatieplan (6 / 6)

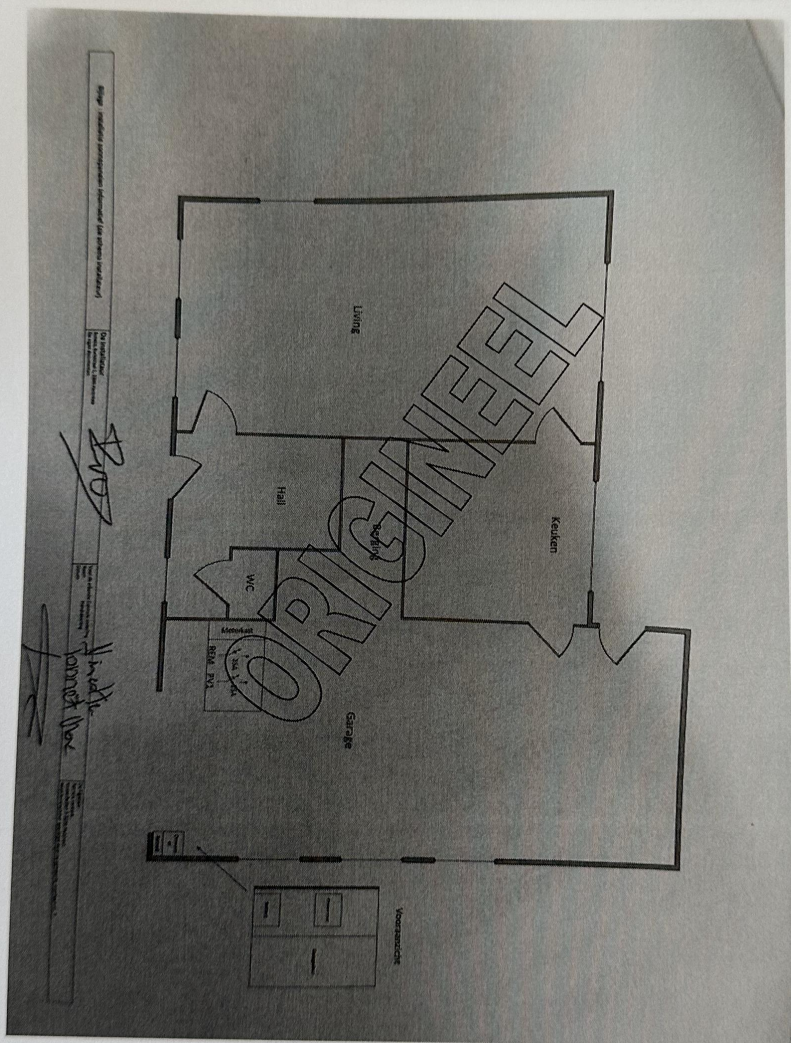




Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto van de eendraadschema's (1/2)

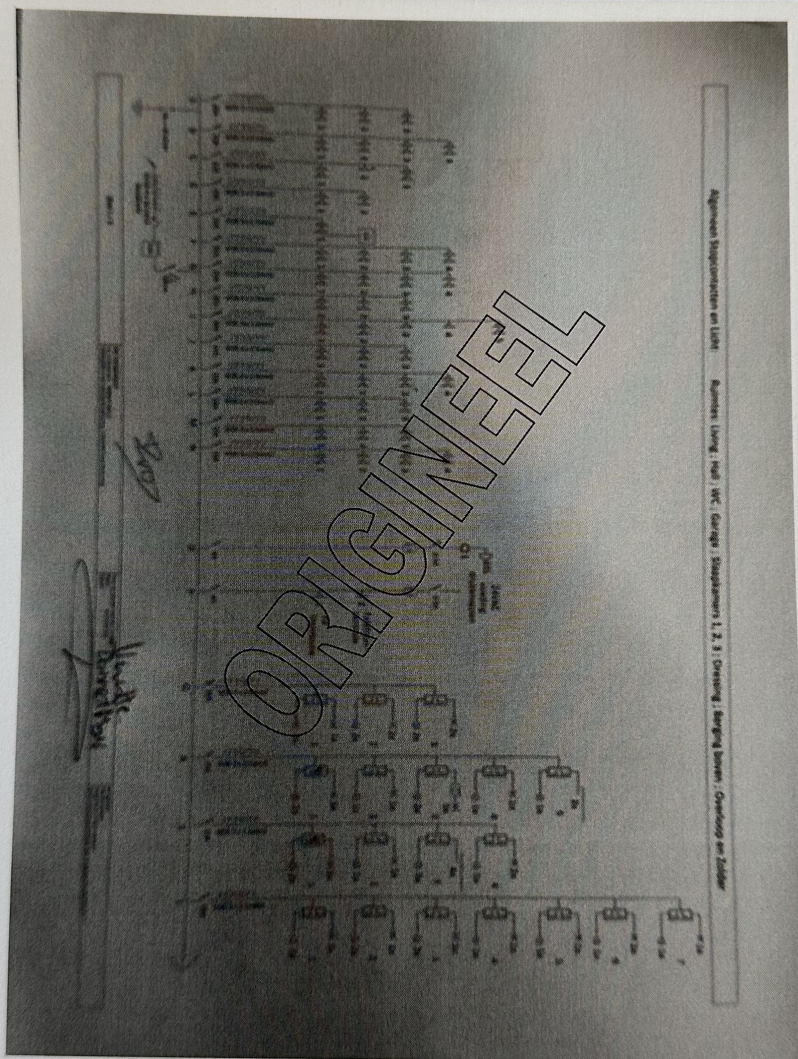



Verslag

VERSLAG NR

AUD/15/30770067/00/NL/000

Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

