

**VINÇOTTE vzw**Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.

60923054/1000

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 371812

Resi code: 1

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE**

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

|                                       |                                       |                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Naam, voornaam : <u>Van Sprinck</u>   | Naam, voornaam : <u>BAHASTRAAT 19</u> | Eigenaar / Uitbater / Beheerder : <u>1120 TRONCH</u> |
| Ident. Kaart nr. : <u>0472 763062</u> | Adres : <u>1120 TRONCH</u>            |                                                      |
| BTW nr.: BE <u>0472 763062</u>        | Post nr. + Stad : <u>1120 TRONCH</u>  |                                                      |
|                                       | Tel. : <u>1120 TRONCH</u>             |                                                      |

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)<br><input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)<br><input type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)<br><input type="radio"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)<br><input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)<br><input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.) | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid<br><input type="radio"/> Werkeenheid<br><input type="radio"/> Werfinstallatie<br><input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel<br><input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel<br><input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie<br><input type="radio"/> Andere installatie: ..... | <input type="radio"/> Vóór 1/10/1981<br><input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020<br><input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020 |
| Afwijkingen Deel 8: <input type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens ardeur<br>Naam verd. ....                                                                                              | EAN <u>54149960001136525</u> <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst                                                                                                                                                                                                                             |
| Gegevens installatie                                                                                                            | kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht : .....<br>Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... |
| Beschrijving installatie<br><input checked="" type="radio"/> Zie bijlage(n)                                                     | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> .....                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                 | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> .....                                                                        |
|                                                                                                                                 | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>1.5</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XUB</u> .....                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Algemene differentieelstroominrichting : <u>63</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : <u>17</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Metingen - testen - controles - verzegeling :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking <input checked="" type="radio"/> Montage <input type="radio"/> Verplaatsb. materieel <input type="radio"/> Vast materieel <input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>82</u> $\Omega$ <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>21</u> M $\Omega$ <input type="radio"/> Controle foutlus <input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE) <input type="radio"/> Test diff.                                          |
| Alg. diff. : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee                                                |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

|                                                                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vastgestelde inbreuken<br><input type="radio"/> Nieuwe installatie<br><input checked="" type="radio"/> Nihil |                                |
| Vastgestelde inbreuken<br>Bestaande installatie<br><input checked="" type="radio"/> Nihil                    |                                |
| Opmerkingen<br><input type="radio"/> Nihil                                                                   | <u>VERBODEN NIEUW SEPAREER</u> |

Besluit :

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker :


Naam : BERGHEMANS Agent nr. : 3626 Datum : 16/10/2020Bijlage(n) : ☐ Situatieplan(nen) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

19/10/2020☒ door hetzelfde erkend organisme (\*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we U ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



VAN SPRINGEL TECHNICS BV

Hoogveld, 53

2260 Westerlo


Tel. : 014 / 26.76.50

# Electrisch schema

MJM Projects

Bakelstraat 19

3128 Baal Tremelo

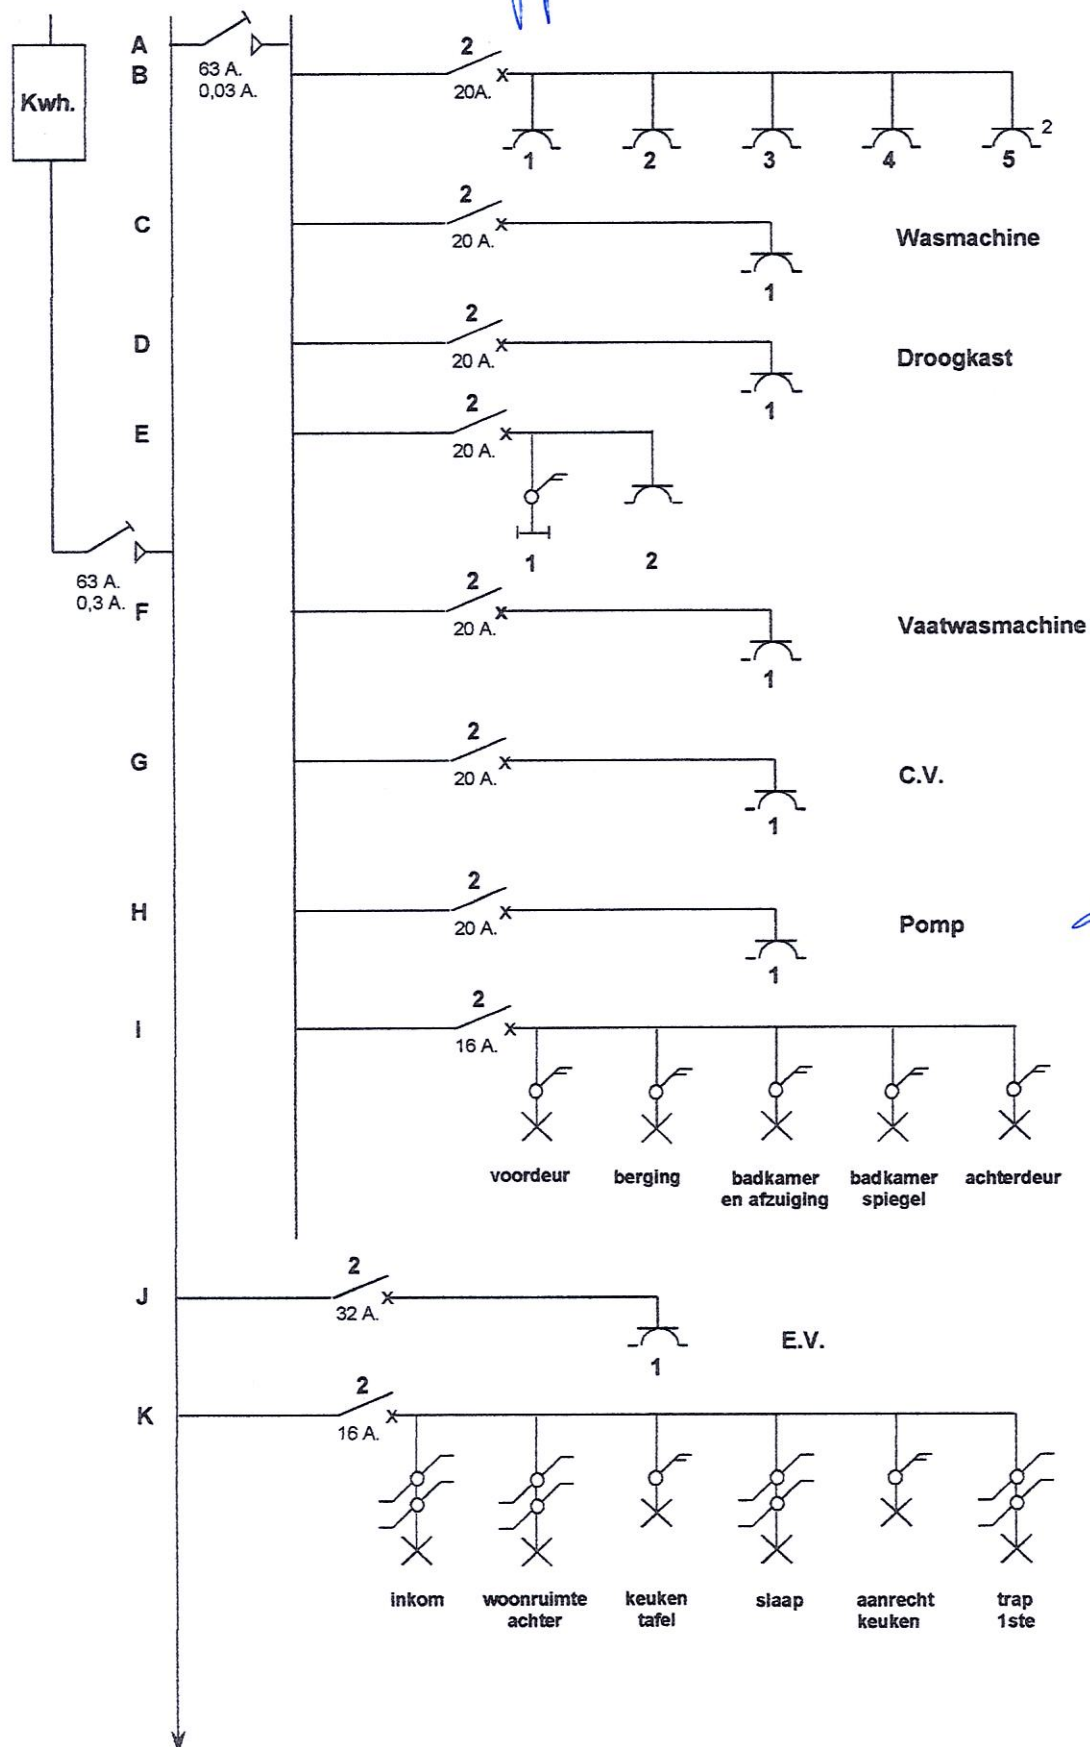


*Handwritten signature and notes:*  
0  
m h k o r




**VAN SPRINGEL TECHNICS BV**  
Hoogveld, 53  
2260 Westerlo  
Tel. : 014 / 26.76.50

## Electrisch schema

**MJM Projects**  
Bakelstraat 19  
3128 Baal Tremelo

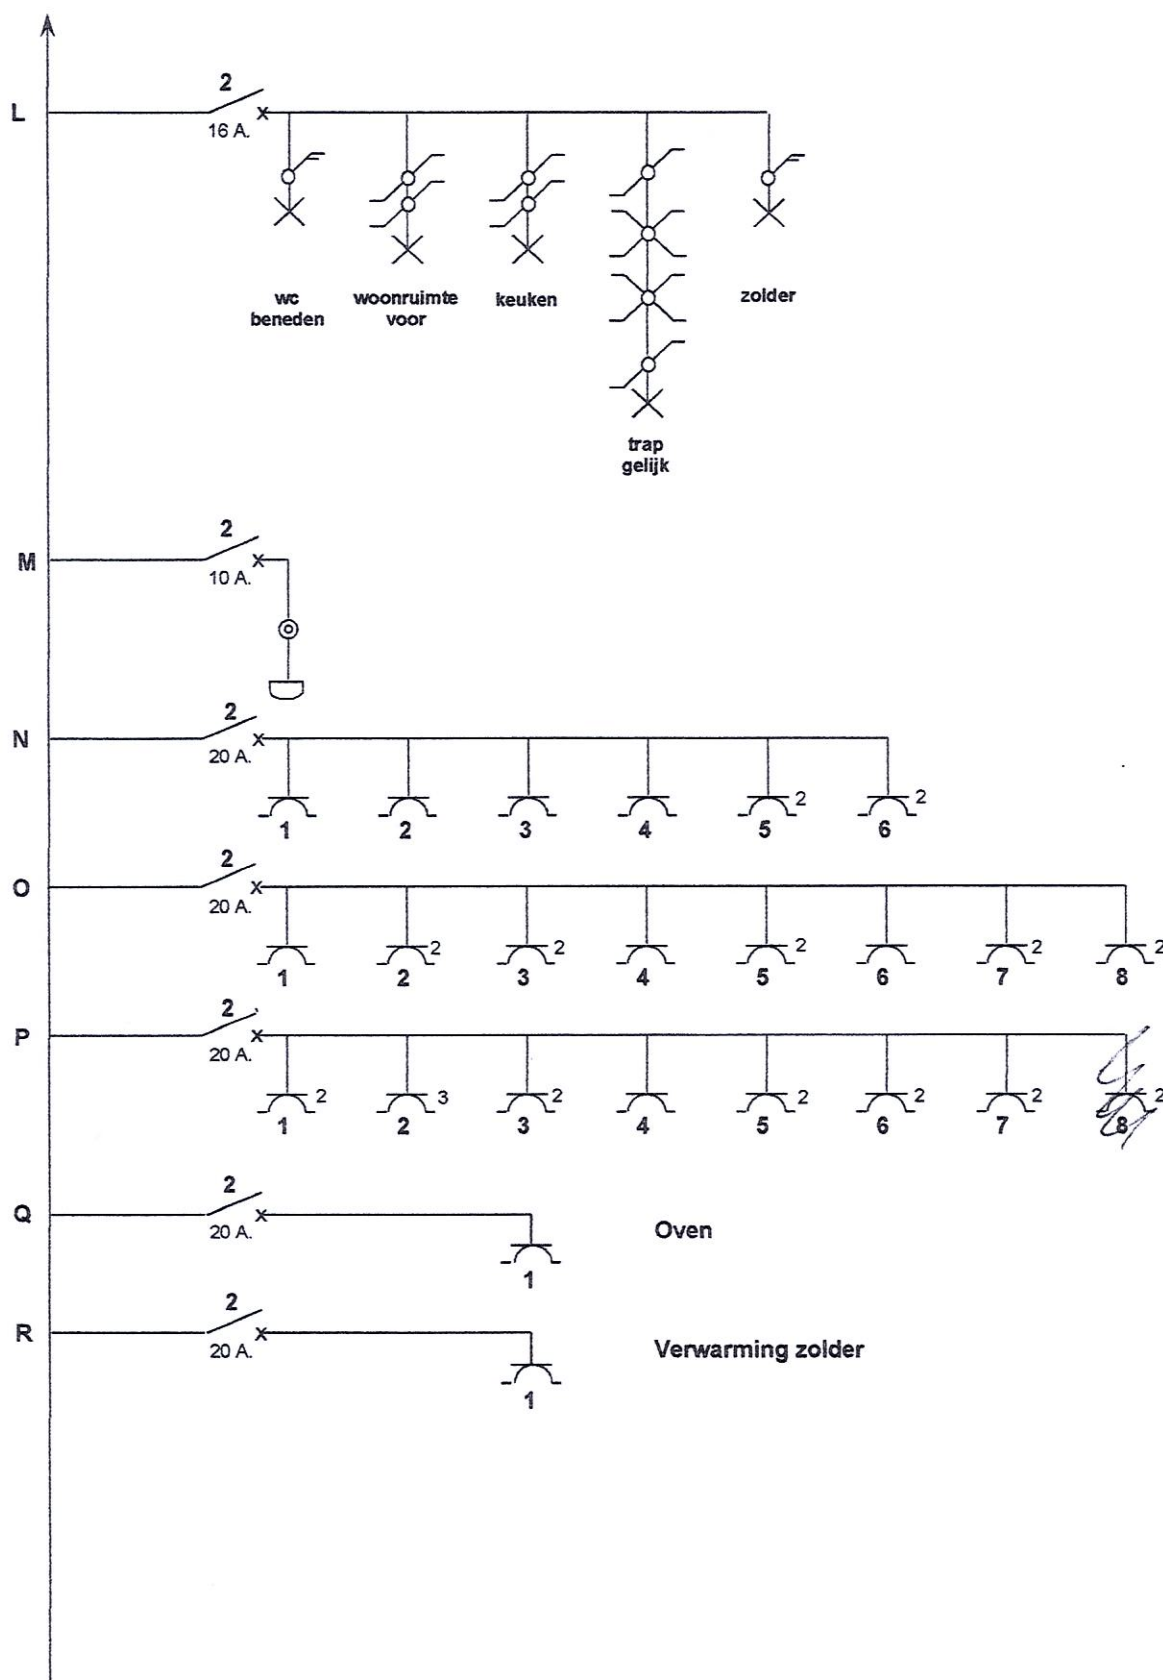


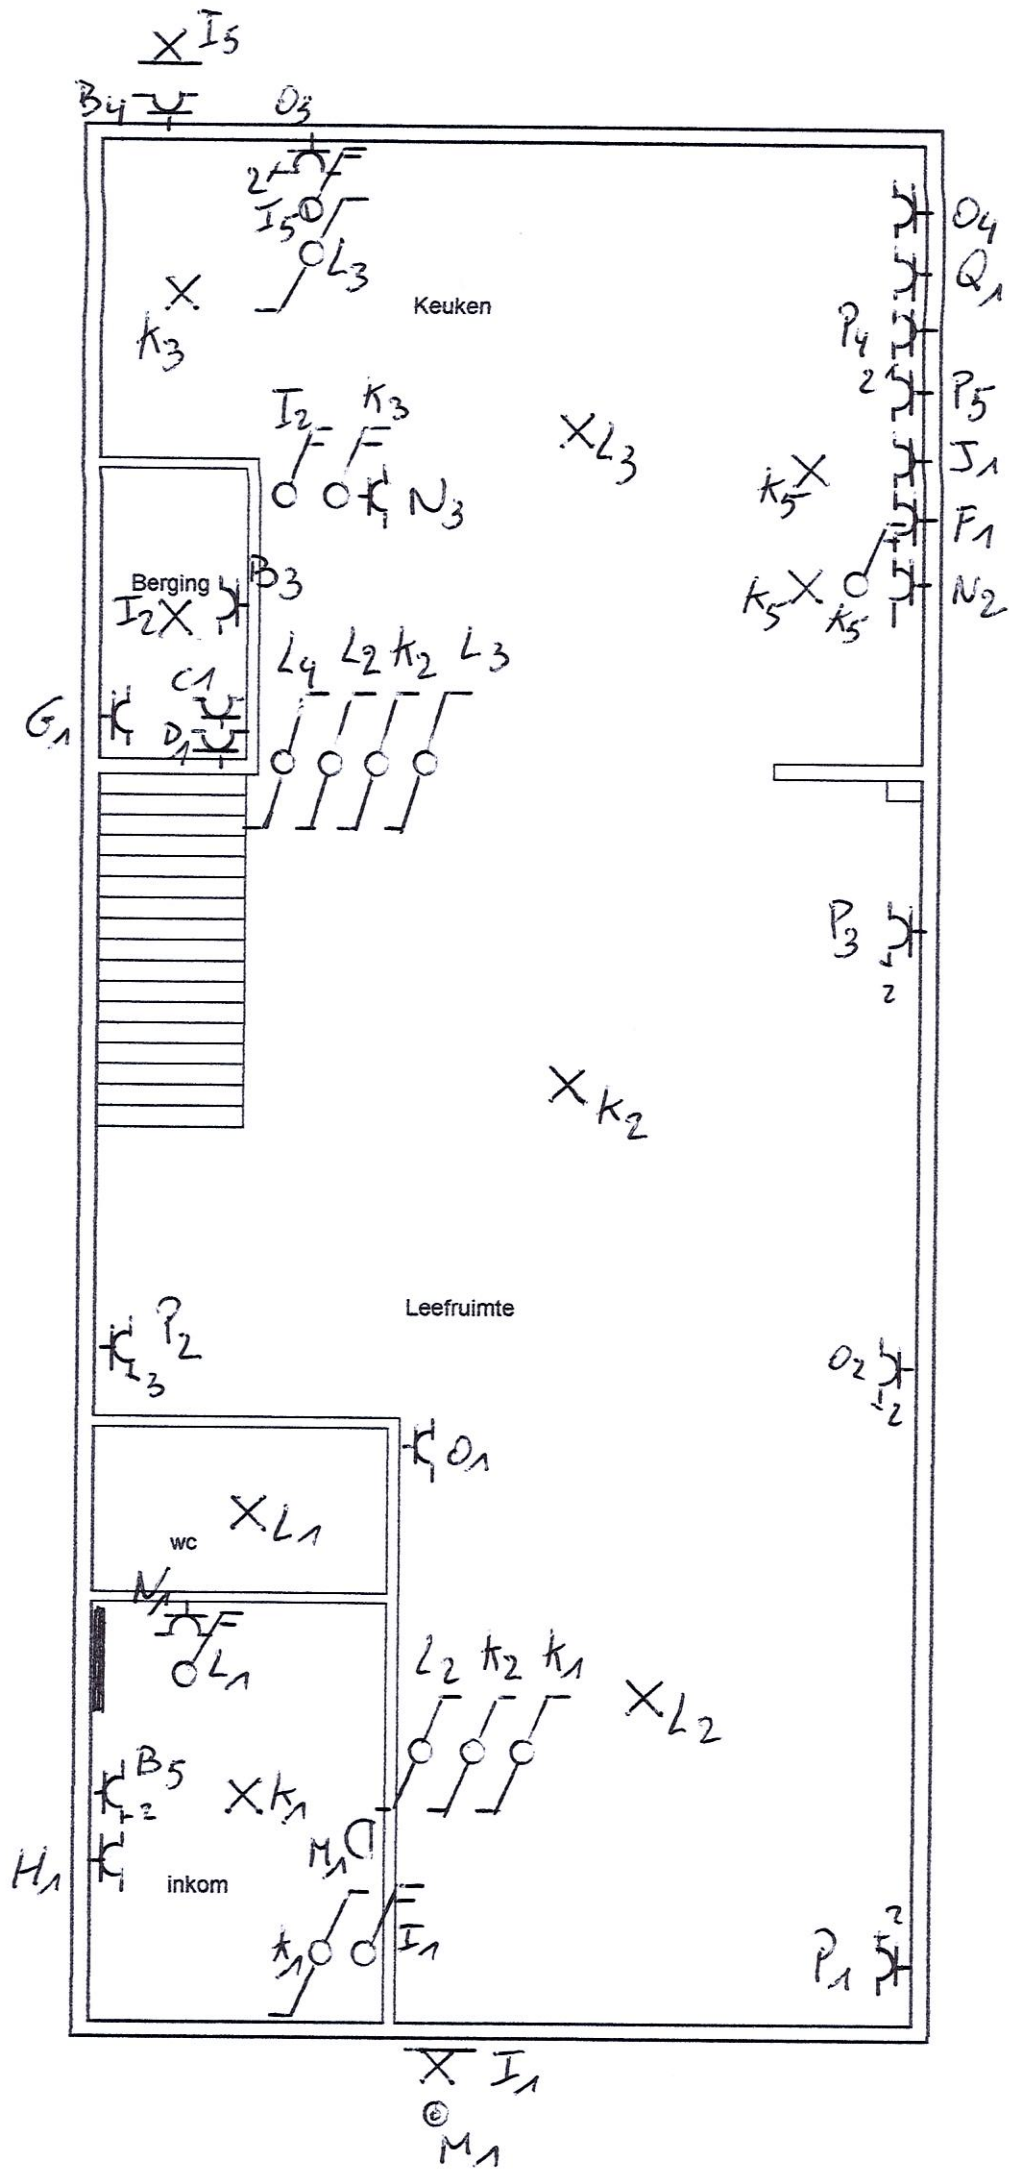


MJM Projects  
 Bakelstraat 19  
 3128 Baal Tremelo  
 Gelijkvloer

MJM Projects  
Bakelstraat 19  
3128 Baal Tremelo

1 ste Verdiep

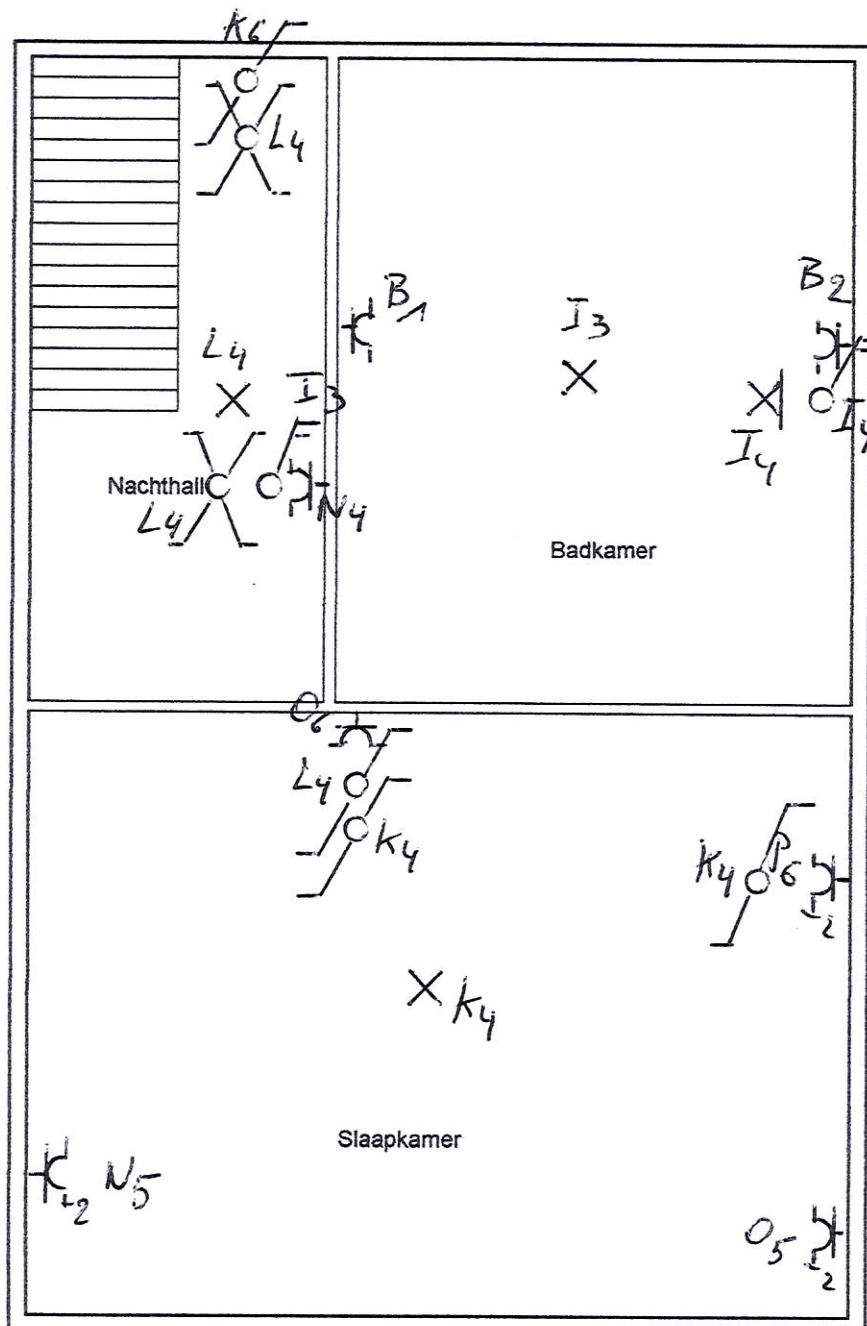

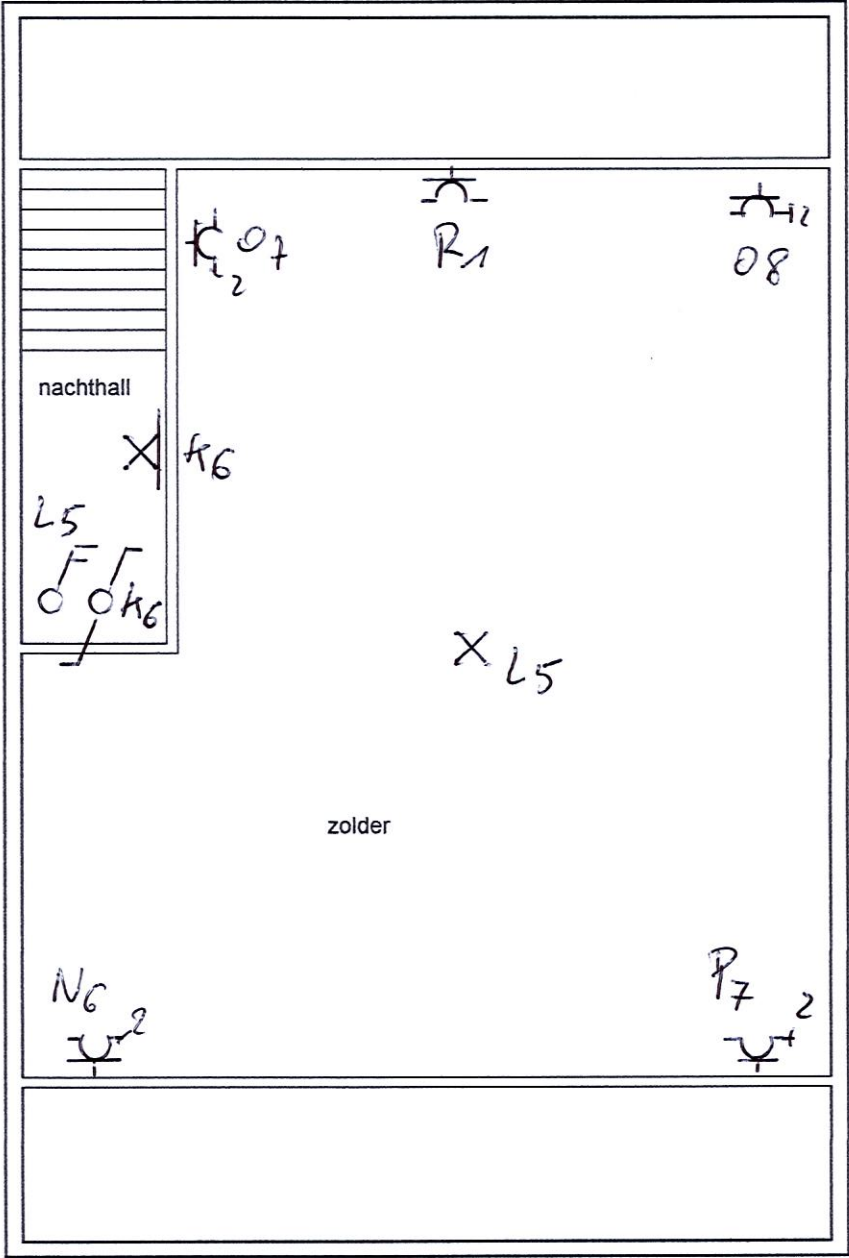

MJM Projects  
Bakelstraat 19  
3128 Baal Tremelo

Tuinberging

