

Schakelbord 1: Appartement 2de verdiep

4 x 20A - 2P - C
2 x 16A - 2P - C
1 x 20A - 2P - C
1 x 16A - 2P - C
2 x 20A - 2P - C
1 x 16A - 2P - C
1 x 32A - 2P - C

Differentieelschakelaar

300mA - 40 - 2P

Type: A

Differentieelschakelaar

30mA - 40 - 2P

Type: A

Controles

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: was verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 1.6 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 7.57 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken**Inbreuken bestaande installatie**

A003: Eendraadsschema's of meendraadsschema's aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid en/of conform de voorschriften van het AREI. (3.1.2.1, 9.1.1, 9.1.2)

A004: Situatieplannen aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid en/of conform de voorschriften van het AREI. (3.1.2.1)

Opmerkingen

W020 - Huis was gemeubeld op het moment van het controlebezoek.

W021 - Verslag opgesteld in het kader van verkoop wegens ontbreken van een geldig keuringsverslag.

Inbreuk A003: kring L ontbreekt op eendraadsschema

Inbreuk A004: stopcontacten keuken ontbreken op eendraadsschema

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 4375: 42

Besluit**De installatie voldoet NIET.**

De installatie moet herkeurd worden door hetzelfde controleorganisme voor 23/07/2027

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Dit verslag geeft de status van de elektrische installatie, zodat de eigenaar van de installatie geïnformeerd is betreffende de te nemen maatregelen.	De eigenaar heeft 12 maanden tijd na keuringsdatum om de vermelde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met KEA of met uw keurder van KEA en maak een nieuwe afspraak, zo kunnen wij uw dossier opvolgen en vervolledigen.	De herkeuring moet uitgevoerd worden voor 12 maanden na keuringsdatum, bij KEA wordt volgende datum geregistreerd: 23/07/2027	KEA staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (3 pagina's)

 **KEA**
Digitaal ondertekend


23/07/2026

Thomas Pardon


De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

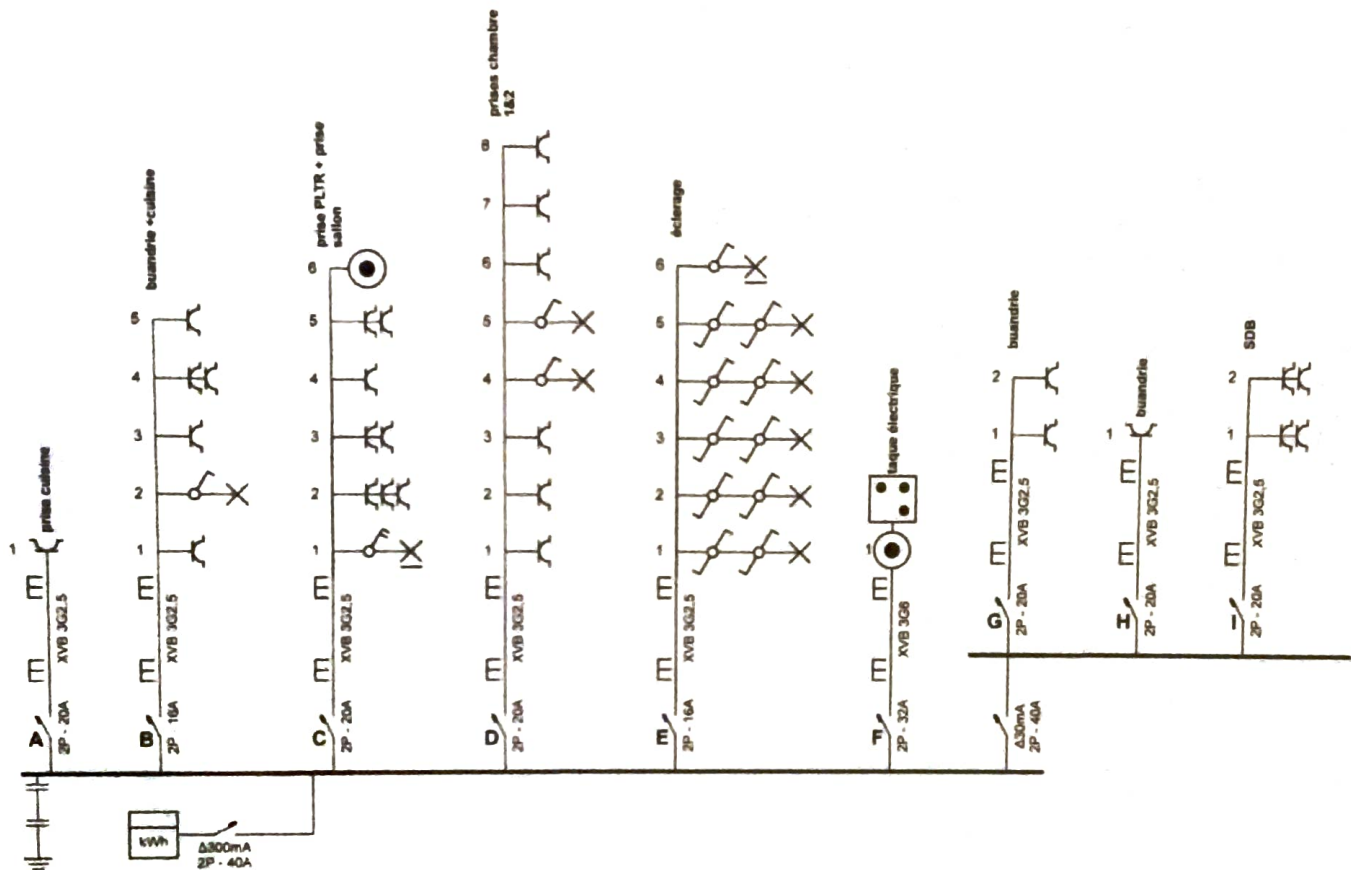

Adresse de l'installation électrique Belleherweg 1 3020 Herent Tél. : GSM : Fax : e-mail :	Installateur Tél. : GSM : Fax : e-mail :	p. 1/4 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz
--	--	--

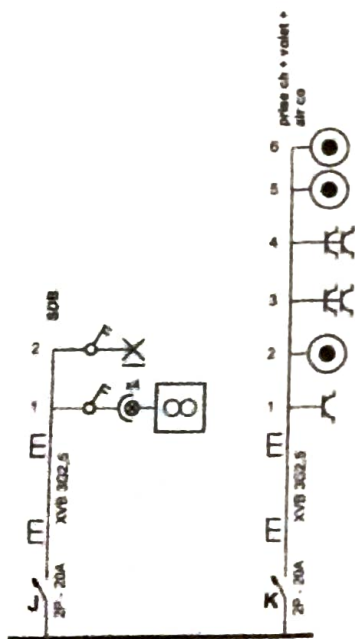

Adresse de l'installation électrique	Installateur	p. 2/4 Schéma unifilaire
Belehemweg 1 3020 Hierlant Tél. - GSM - Fax - e-mail -	Tél. - GSM - Fax - e-mail -	2 x 230V ~ 50Hz

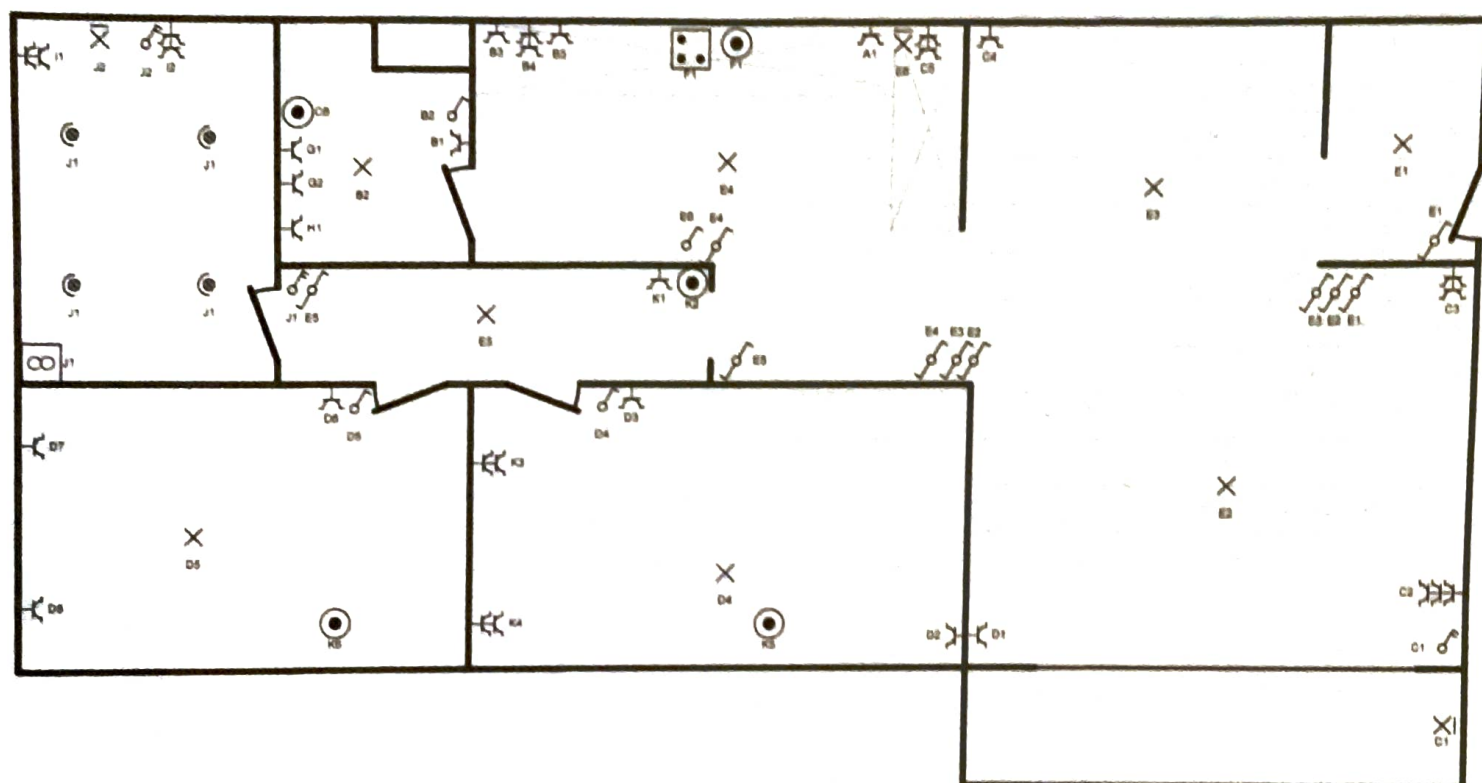
Adresse de l'installation électrique

Bellechemweg 1
 3020 Herent
 Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

Installateur

Tél. - GSM -
 Fax -
 e-mail -

p. 3/4
 Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz
