



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/02/2025

Inspecteur: Jimmy Asselberghs

Mentor:

Installateur: DHE Electrics

ID-label:

B,T,W, nr.: BE 0736 380 844

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155 Serienummer: 21251286

Datum verslag: 10/02/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kastanjeweg
Huisnummer 18
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Eigenaar

Naam Joris Op De Beeck
Straatnaam Kastanjeweg
Huisnummer 18
Busnummer
Postcode 3140
Gemeente KEERBERGEN
Land België

Installateur

Naam DHE Electrics
BTW nr. BE 0736 380 844
Telefoonnummer 0493/66.49.44
E-mail info@dhe-electrics.be

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr. : 54430897

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5, en 4.2.4.3,

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A


Aantal kringen: 27

Ri algemeen: 2,55 MΩ

RE: 5,60 Ω

OK

OK

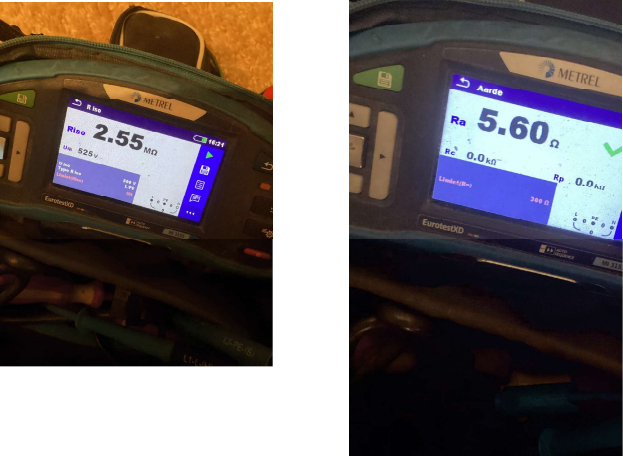

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	27	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/2/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:32 tot 12:08

De inspecteur Jimmy Asselberghs

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/2/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






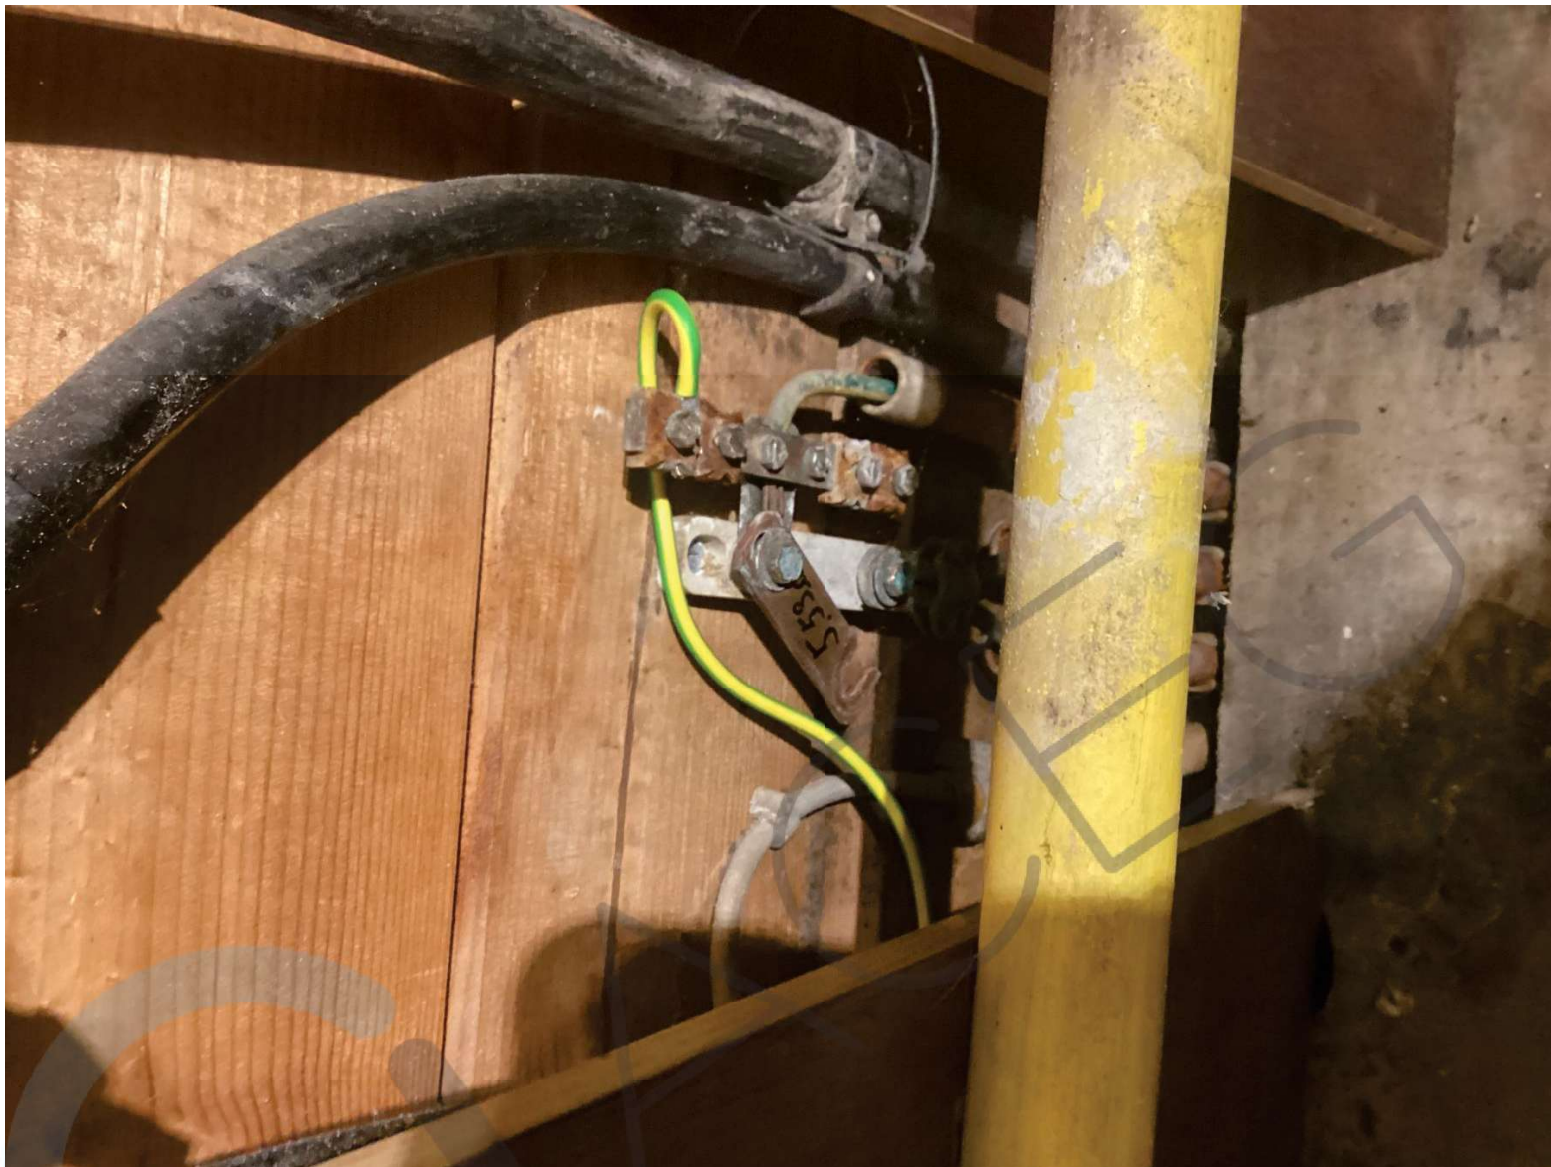


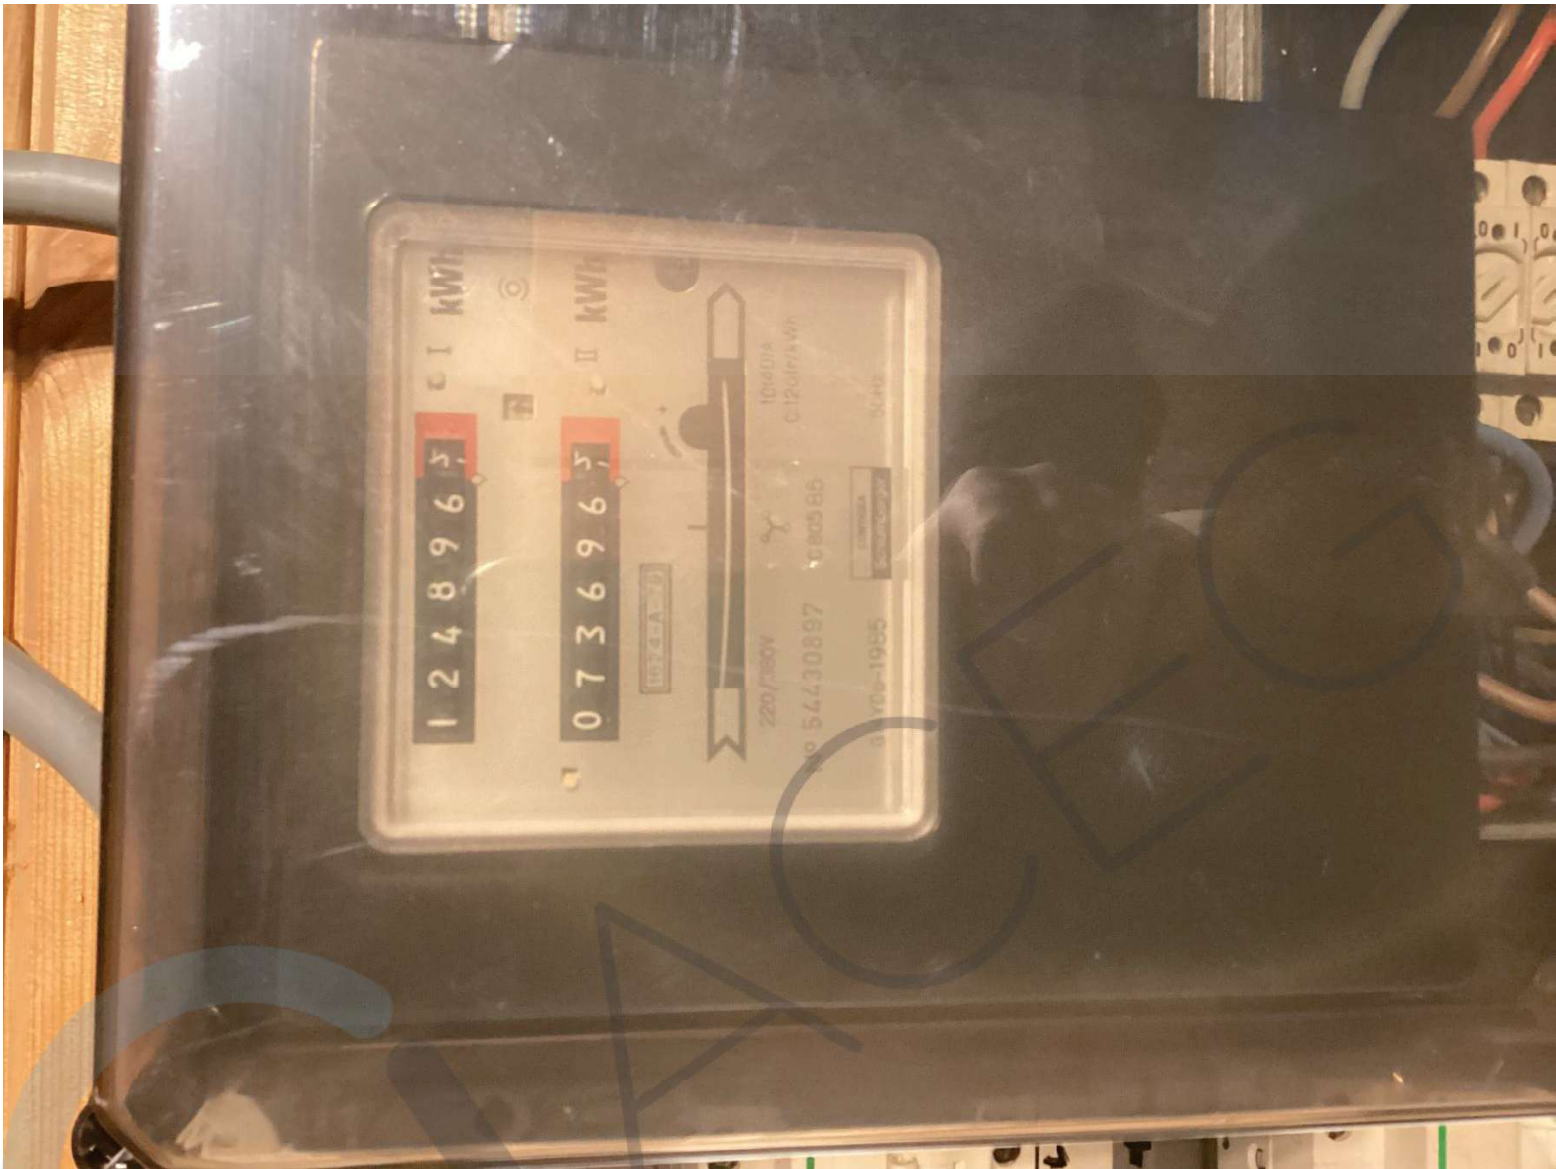



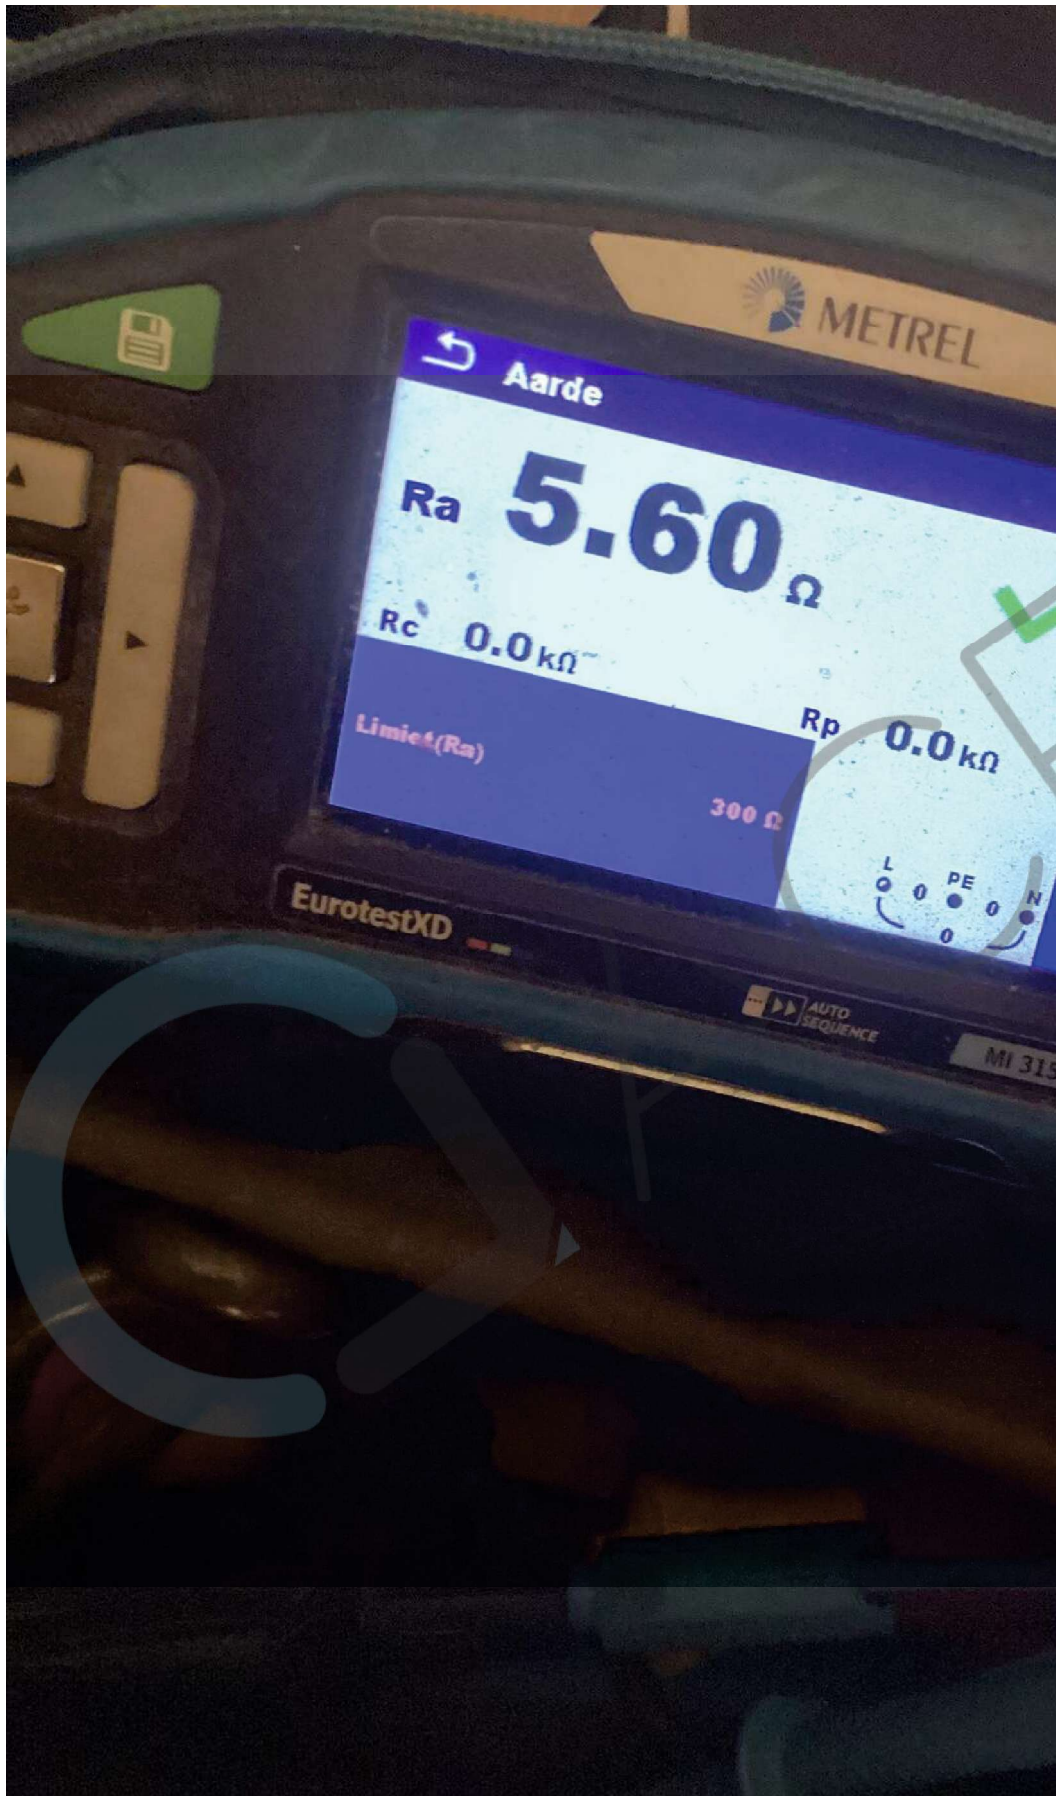




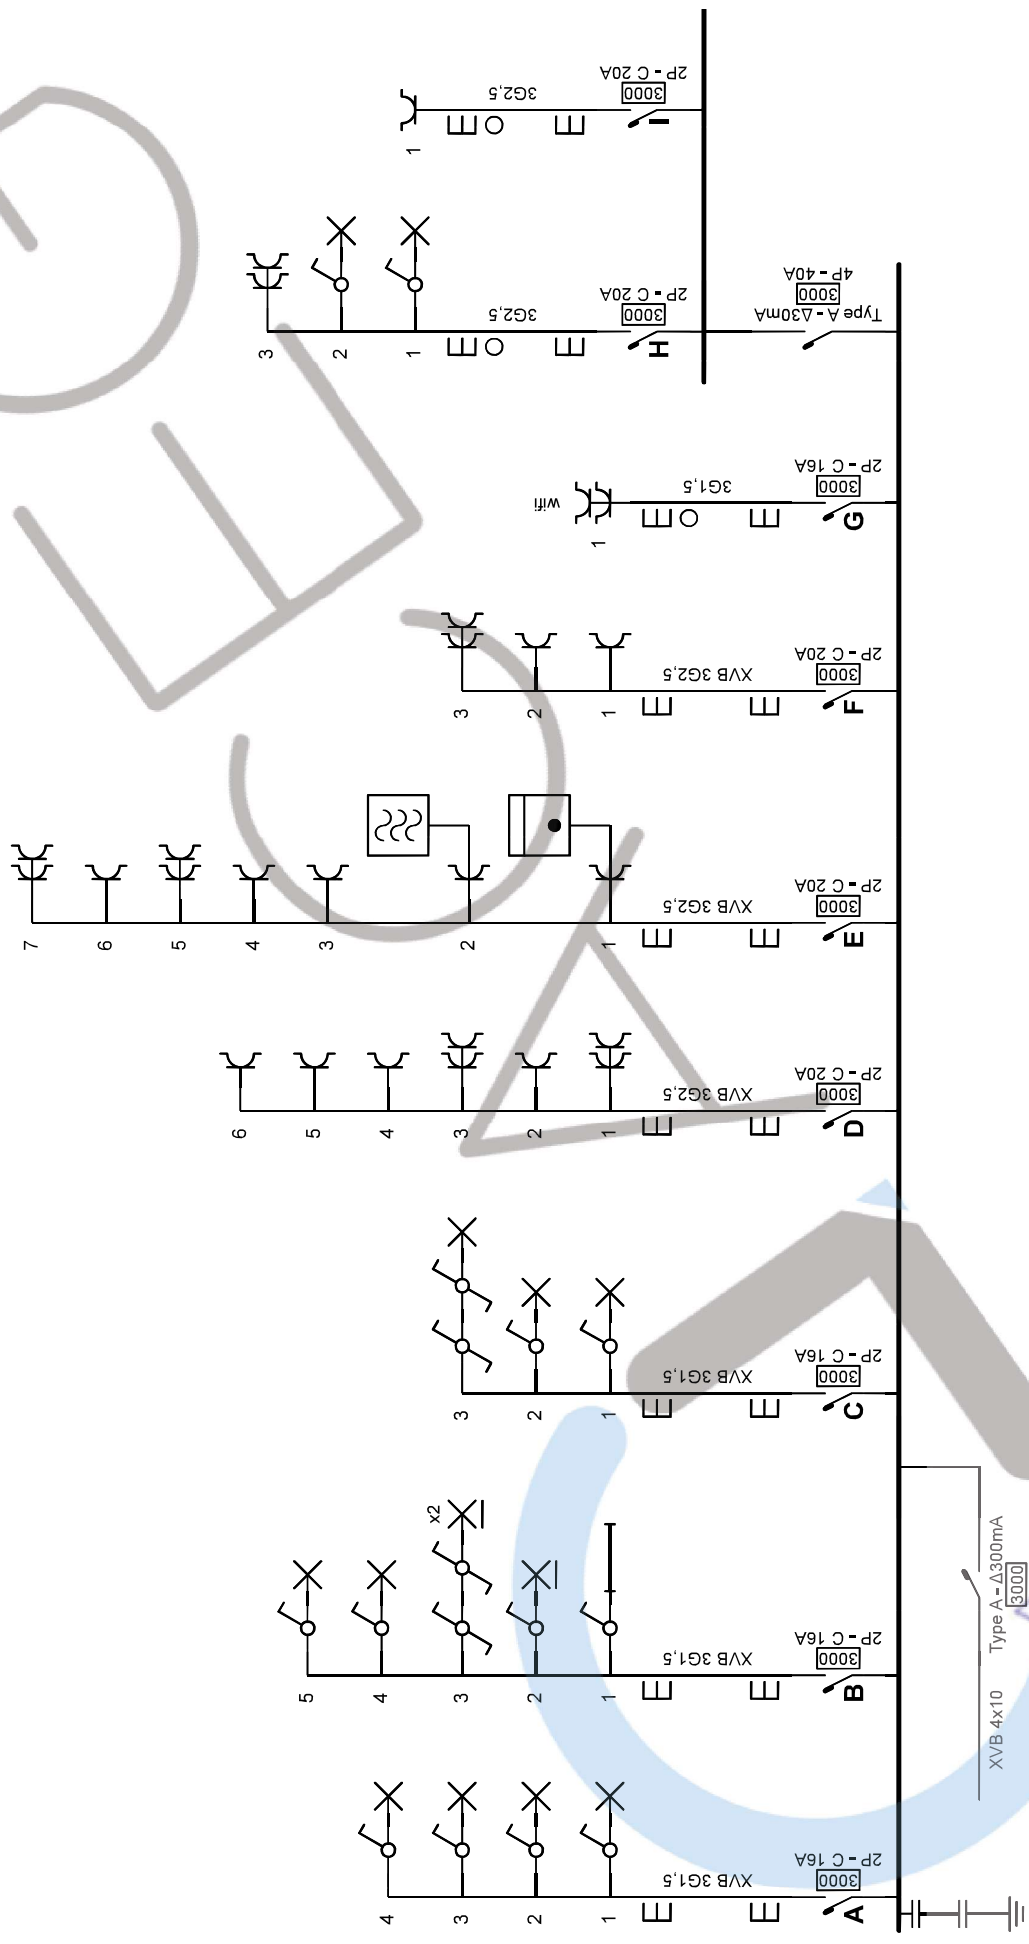

Plaats van de elektrische installatie
Joris Op De Beeck
Kastanjeweg 18
3140 Keerbergen

Installateur
DHE Electrics bv
Tremelobaan 170
3140 Keerbergen
GSM: 0493 66 49 44
e-mail: info@dhe-electrics.be
BTW BE 0736.380.844

p. 1/6
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

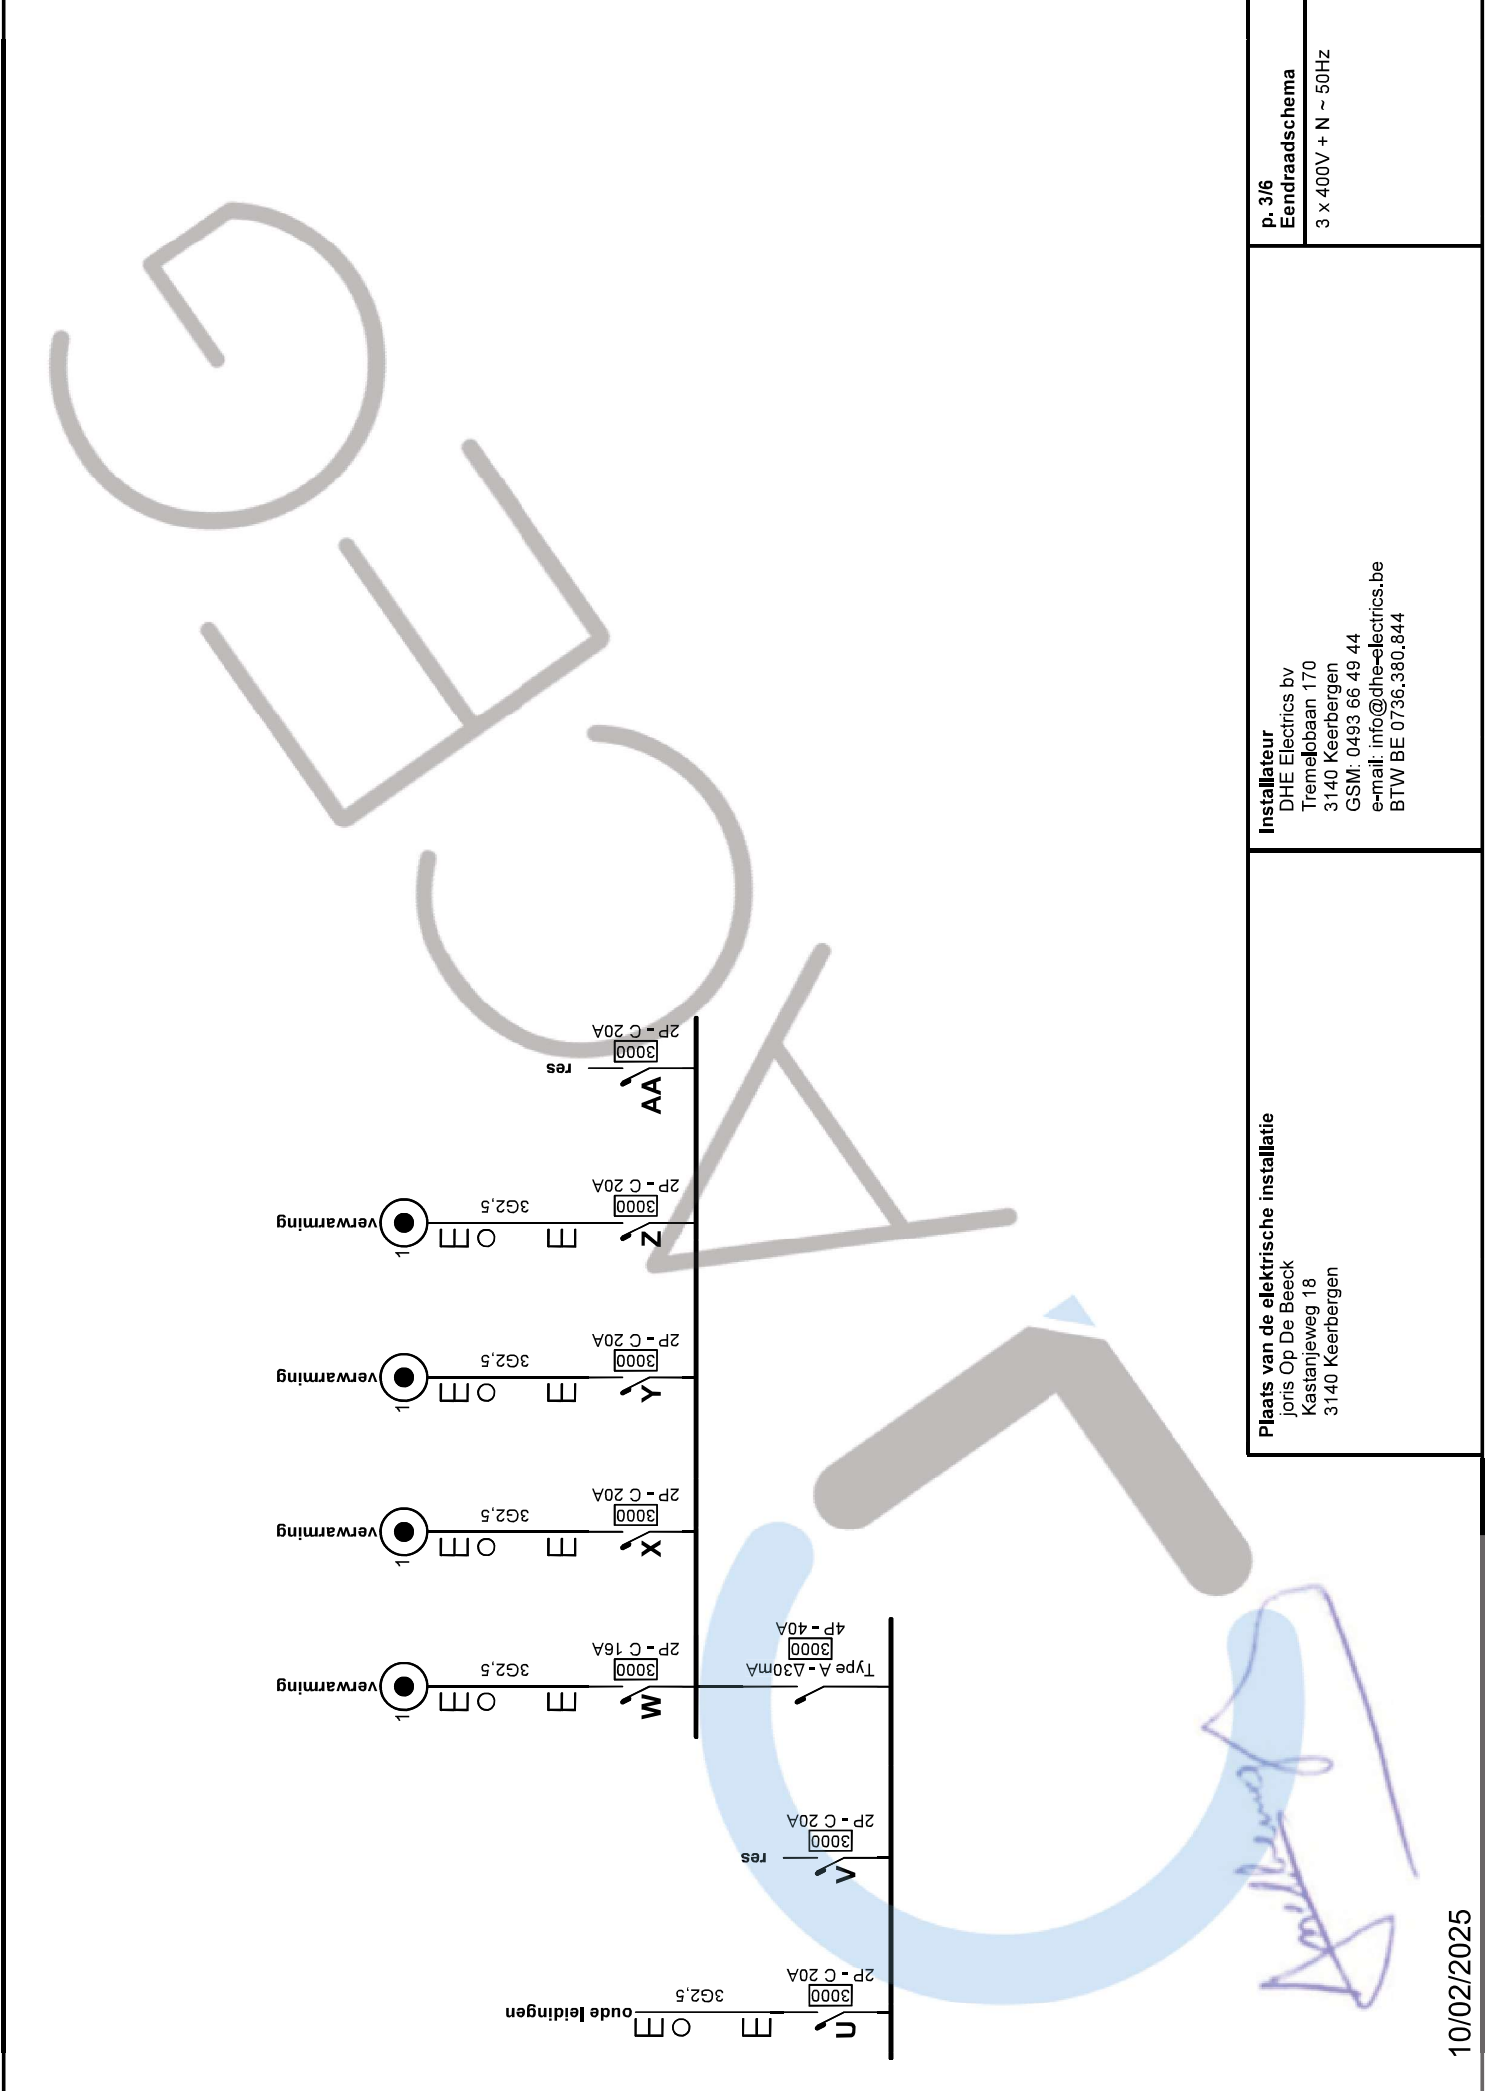

Plaats van de elektrische installatie

Joris Op De Beeck
Kastanjeweg 18
3140 Keerbergen

Installateur


DHE Electrics bv
Tremelobaan 170
3140 Keerbergen
GSM: 0493 66 49 44
e-mail: info@dhe-electrics.be
BTW BE 0736.380.844

p. 3/6
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

10/02/2025

 $3 \times 400V + N \sim 50Hz$

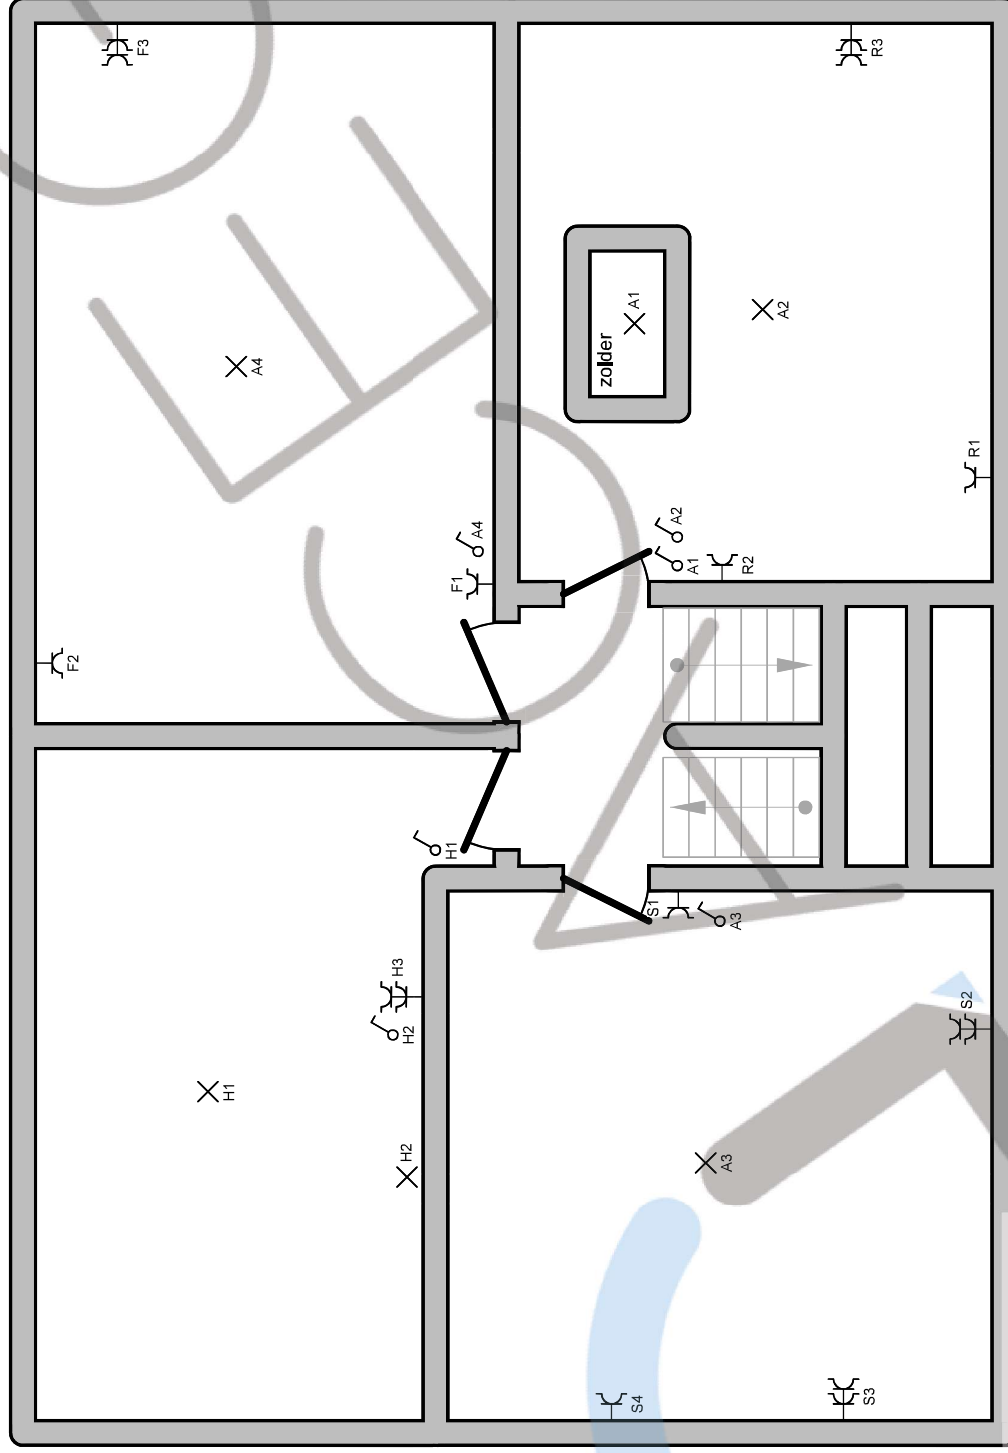

Plaats van de elektrische installatie

Joris Op De Beeck
Kastanjeweg 18
3140 Keerbergen

Installateur

DHE Electrics bv
Tremelobaan 170
3140 Keerbergen
GSM: 0493 66 49 44
e-mail: info@dhe-electrics.be
BTW BE 0736.380.844

p. 5/6
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

10/02/2025

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	oude leidingen
L	oude leidingen
M	res
N	res
O	
P	oude leidingen
Q	
R	airco
S	
T	
U	oude leidingen

Plaats van de elektrische installatie

Joris Op De Beeck
Kastanjeweg 18
3140 Keerbergen

Installateur

DHE Electrics bv
Tremelobaan 170
3140 Keerbergen
GSM: 0493 66 49 44
e-mail: info@dhe-electrics.be
BTW BE 0736.380.844

p. 6/6
Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz
