

STROOMVERDELER

Meter nr. : FC187015

Index : Dag : 8245 KWh ; Nacht : 1 KWh

VERSLAG NR. 65-17-503 N.O.
ADRES INSTALLATIE: Jan de Corderestraat 81
2820 Bonheiden
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER : Pelgoms Ivo
Adres : Heerengen 6191
BEHEERDER/UITBATER :
Adres :
EAN-code :

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 5-7-17 ; Aanvulling van verslag nr. : ✓ ; Type der lokalen : Woning
Aard installatie: Bestaande - Verzwaring - Overdracht van eigendom - Tijdelijk
Elektrische installatie vóór - nr 1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art 86-87
Aansluiting: Spanning 3 x 400/230 V ; Bescherming v/d aansluiting: EX A ; Alg. schakelaar: type: HDS 60A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXUS 6x15 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 6 x 12 mm²
Type aardelektrode: IUS - baren - pennen - horizontale geleider - diepte aarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; Spreidingsweerstand hms = 11,5 Ω ; Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 2 MOhm
BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage
Loods : 8 Ω

HDS 60A/300mA : DS 60A/300mA : A B C
D : DS 60A/300mA : DS 60A/300mA :
E ↔ N

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 - 275-275bis
en de technische procedure(s) TPR-E12P -
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a - b - c - d - e - f - g - h

Legende :

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- de controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: 1

3.2. OPMERKINGEN / NOTAS :

zie keerzijde: De stopcontacten zonder aarding mogen
aan de draad en om te vervangen Klasse II te worden.
Nog te plaatsen : keurmerk + lichtarmaturen.

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATER: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ✓ voldoet □ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - neen - ja - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór 5-7-2012

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTOLEORGANISME
2820 BONHEIDEN
SIEF VAN VLIET
AGENT-ONDERZOEKER



240V 4x16 mm²

EXVB 4x25mm²

Verantw. uitvoering

Pelgrims Ivo
Lozenhoekstraat 14
3140 Keerbergen

Hubert
Jan de Cordesstraat 81
2580 Beersel -Putte

Afaev. erkend organisme



5/7/2017

Woning gebouwd voor 1981
CONTROLEORGANISME

FILE

~~2820 BONHEIDEN~~

Agnes Onderzoeker

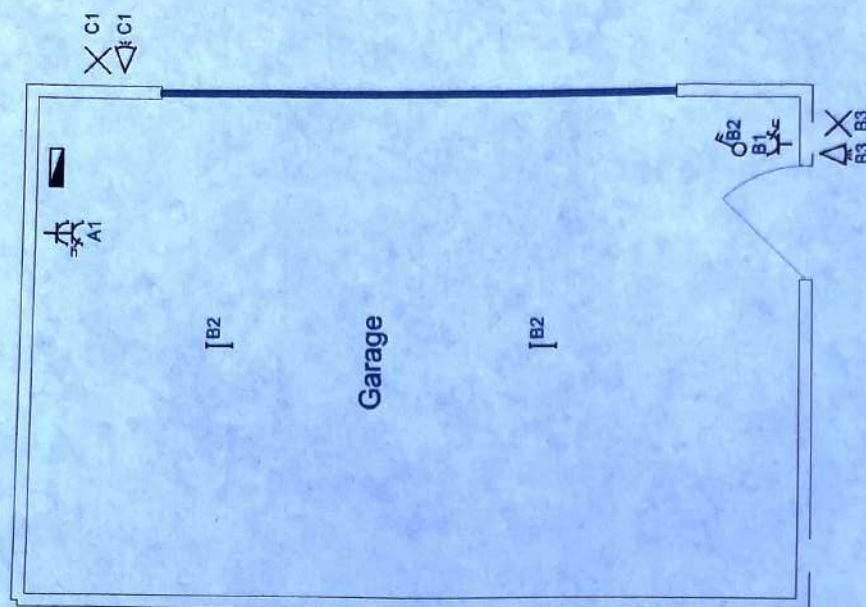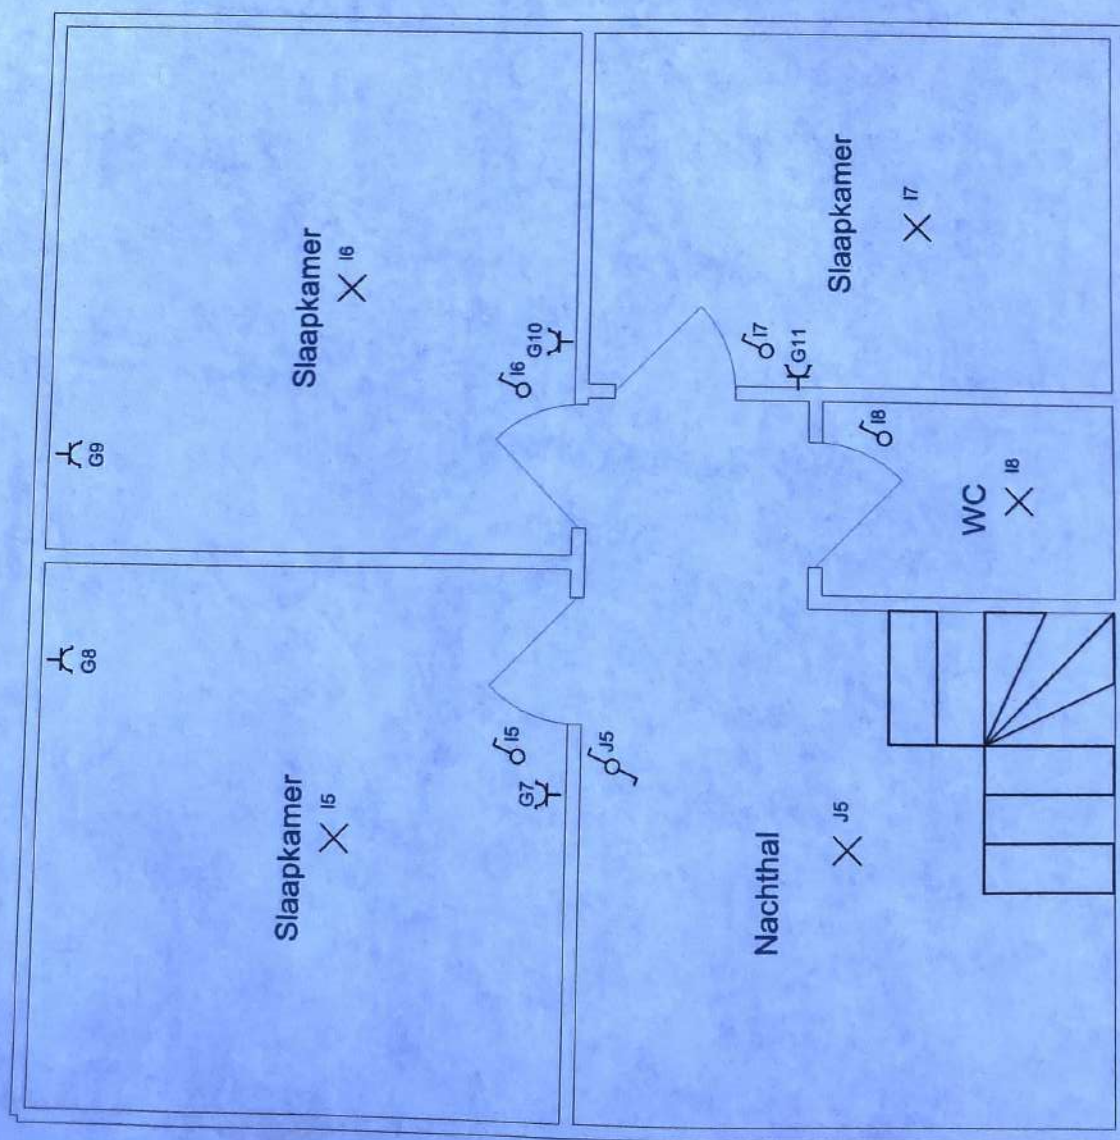

Afgev. erkend organisme

5/7/2017

Woning gebouwd voor 1981

Jan de Cordesstraat 81
2580 Beersel -Putte


Verantw. uitvoering

[Signature]

Pelgrims Ivo
Lozenhoekstraat 14
3140 Keerbergen

CONTROLEORGANISME

2520 BOMMELEN
Sint-Godis
Agent-Of
onderzoeker

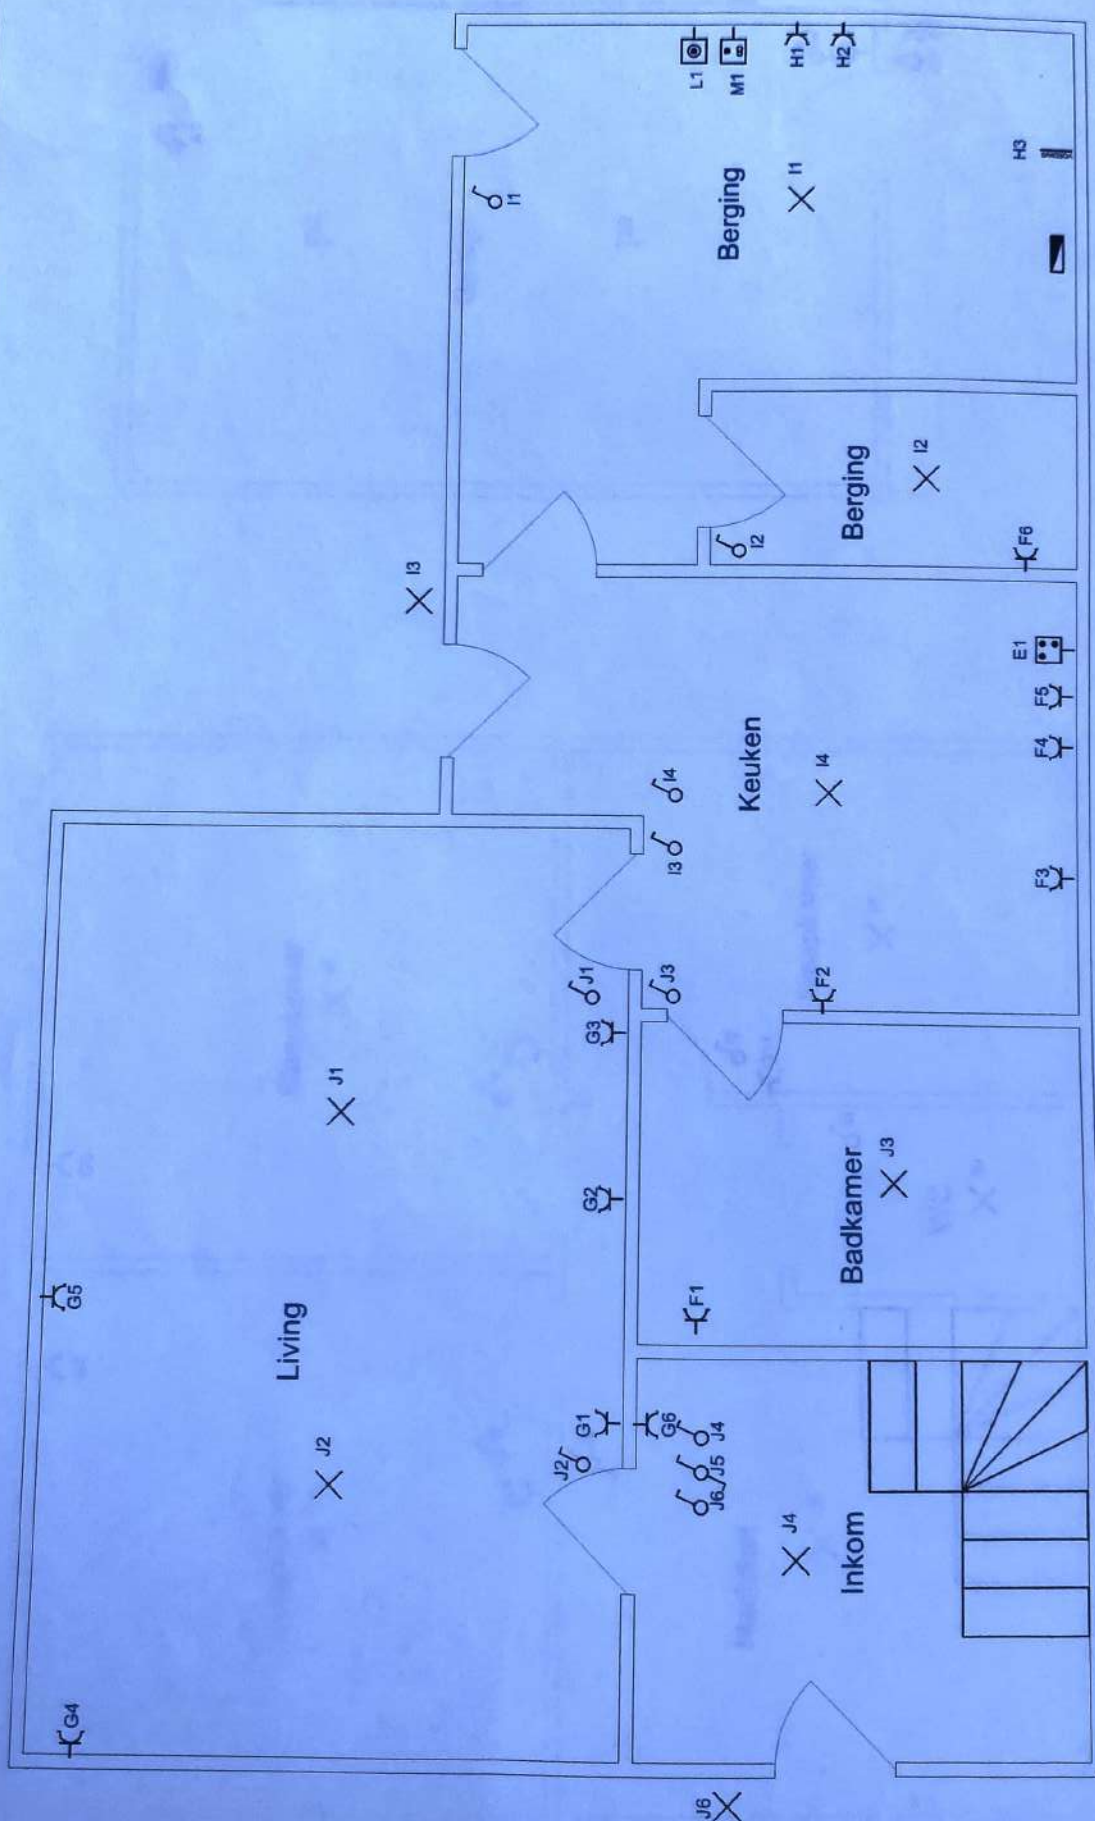

Afgev. erkend organisme 17. / 2017	Jan de Cordesstraat 81 2580 Beersel -Putte	Verantw. uitvoering 	Pelgrims Ivo Lozenhoekstraat 14 3140 Keerbergen
Woninggebouwd voor 1981			

2820 p...
 Agentschap
 15-01-2018
