


Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/11/2024	Inspecteur: Robby De Smet	Mentor:	Installateur: EnergyKing
ID-label:	B.T.W. nr.:BE 0806 516 101	Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel MI3155	Serienummer: 21251306		
Datum verslag: 21/11/2024			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Heidelaan	Naam	
Huisnummer	23	Straatnaam	
Busnummer		Huisnummer	
Postcode	2580	Busnummer	
Gemeente	Putte	Postcode	
Land	België	Gemeente	
		Land	
		Installateur	
		Naam	EnergyKing
		BTW nr.	BE 0806 516 101
		Telefoonnummer	+32 16 41 62 10
		E-mail	info@energyking.be
Type : Laadpaal	EAN : 541448860022747178	Teller Nr.:	1SAG3200162131
Afbeelding schakel- en verdeelbord:			

Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidscontrole voor de aansluiting van een elektrische laadpaal in een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, 7.22 en 4.2.4.3.		
Netbeheerder: FLUVIUS	Spanning: 3N400V	Meter / bord verbinding: 10 mm²	Max beveiliging: 32 A
Aantal borden: 1	Aantal kringen: 1		
Aardelektrode: Aardingslus			
Ri algemeen: 10,02 MΩ	RE: 4,38 Ω		
OK	OK		



Kan de laadinrichting energie terugleveren aan de vaste stroomopwaartse elektrische installatie: Nee

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	32	C LP	4	10
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 6.1 Deze keuring betreft enkel de laadpaal.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/11/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid...

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:52 tot 16:23

De inspecteur Robby De Smet

ROBBY DE SMET
ACEG VZW - #227

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/11/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

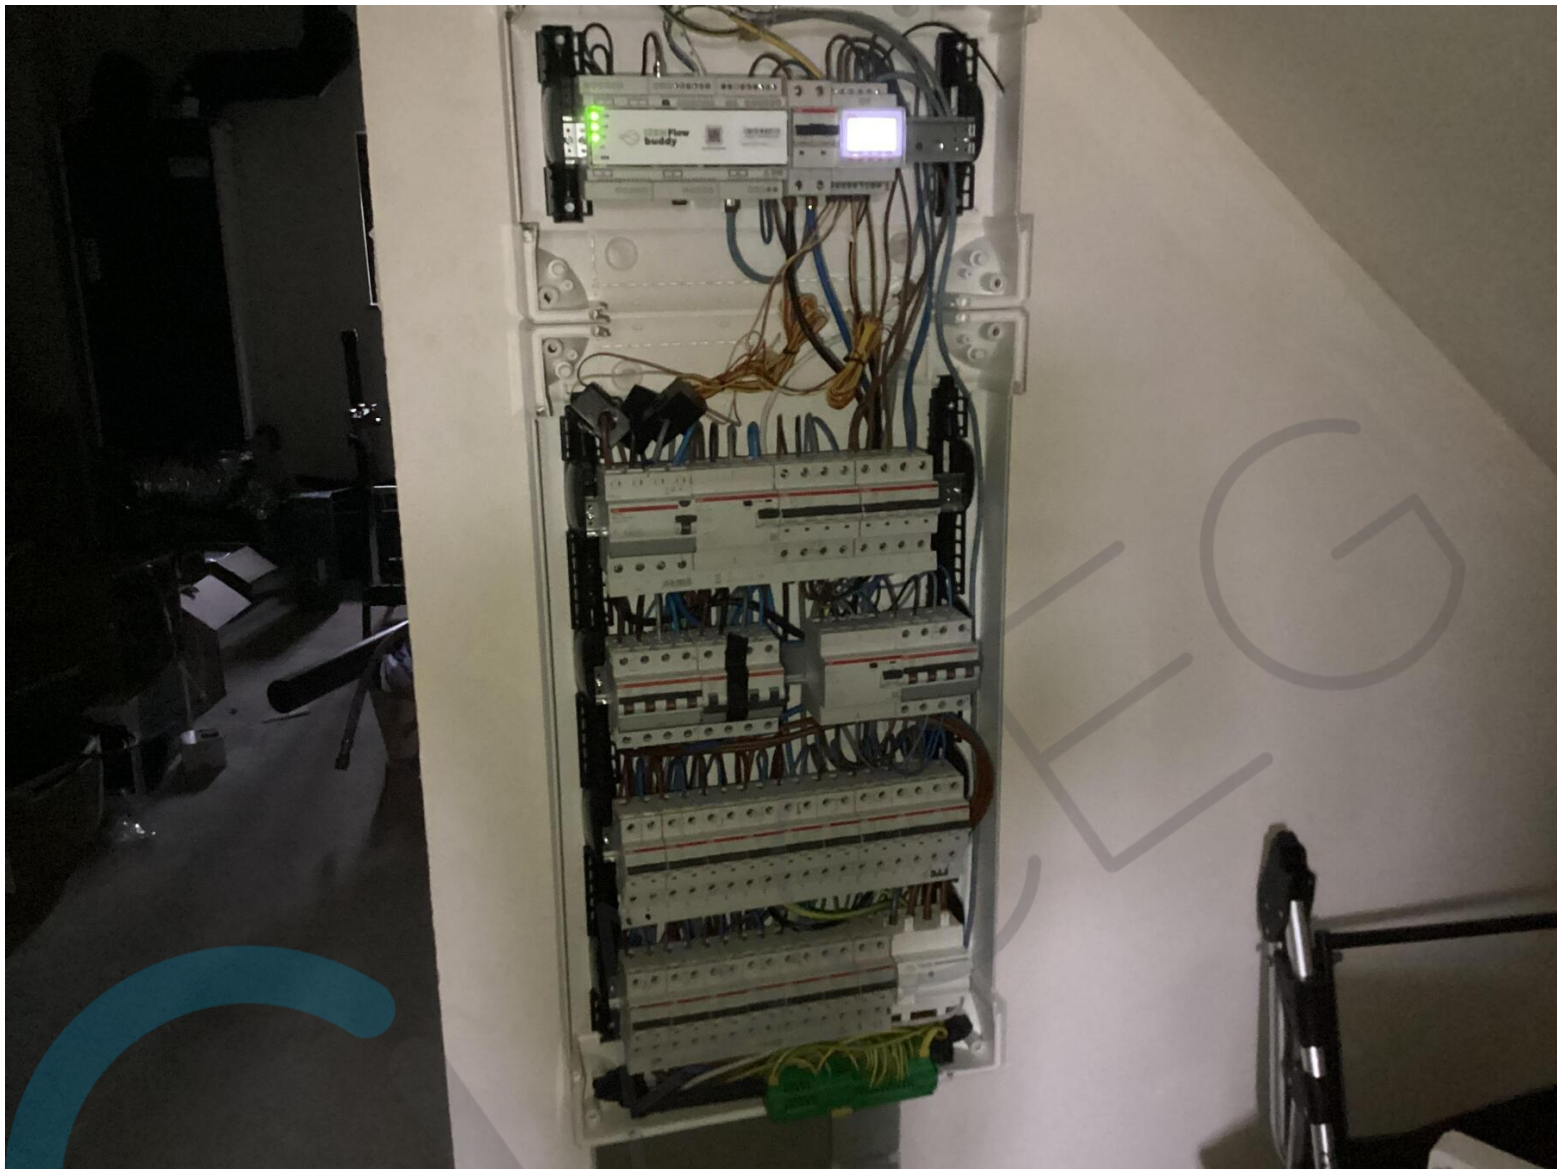



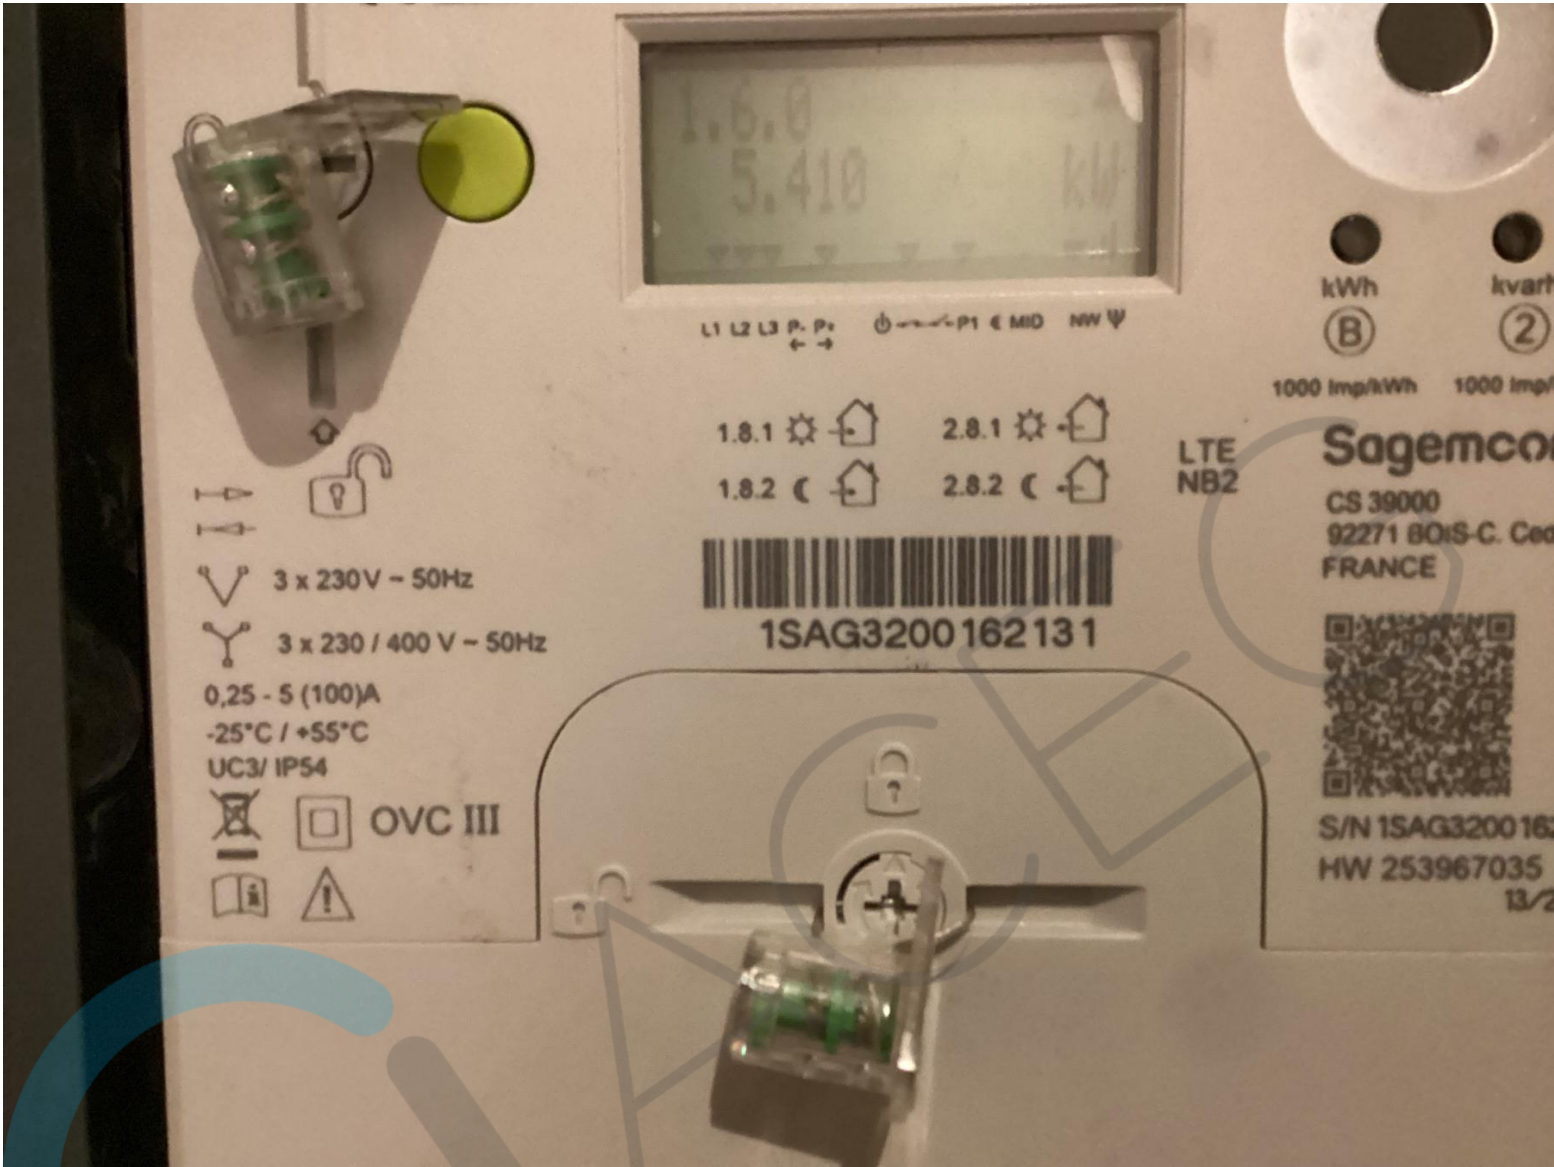

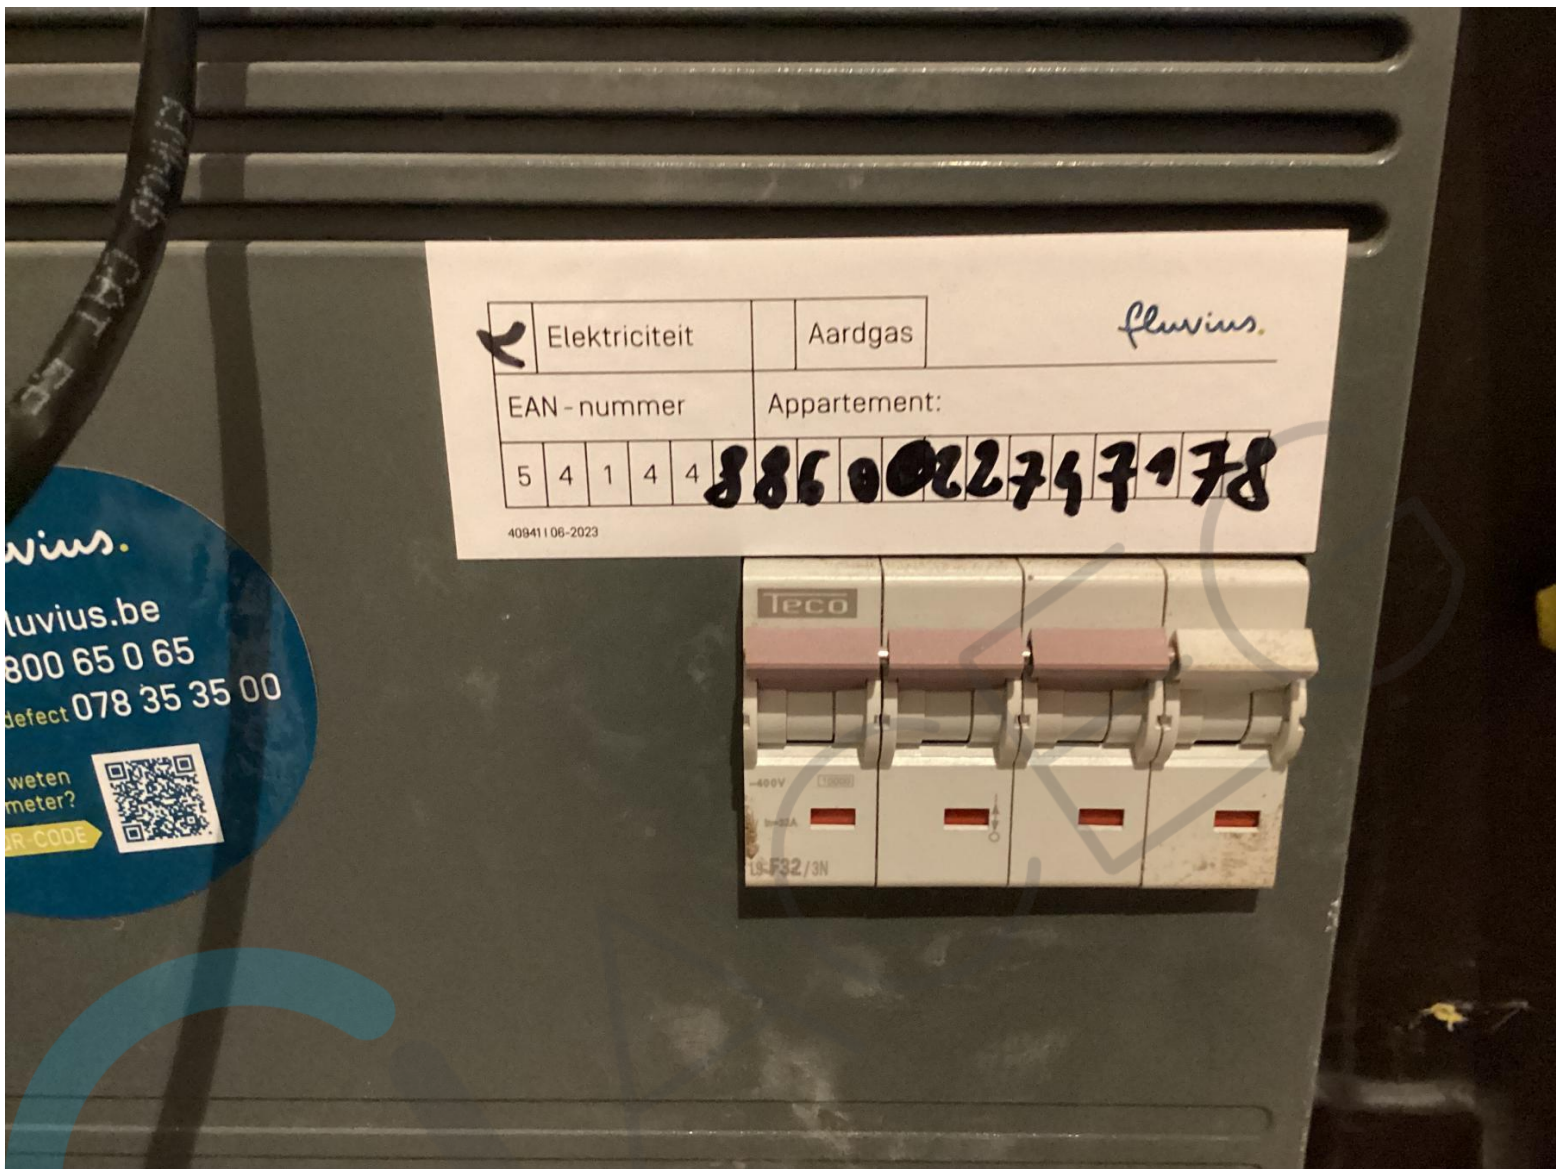

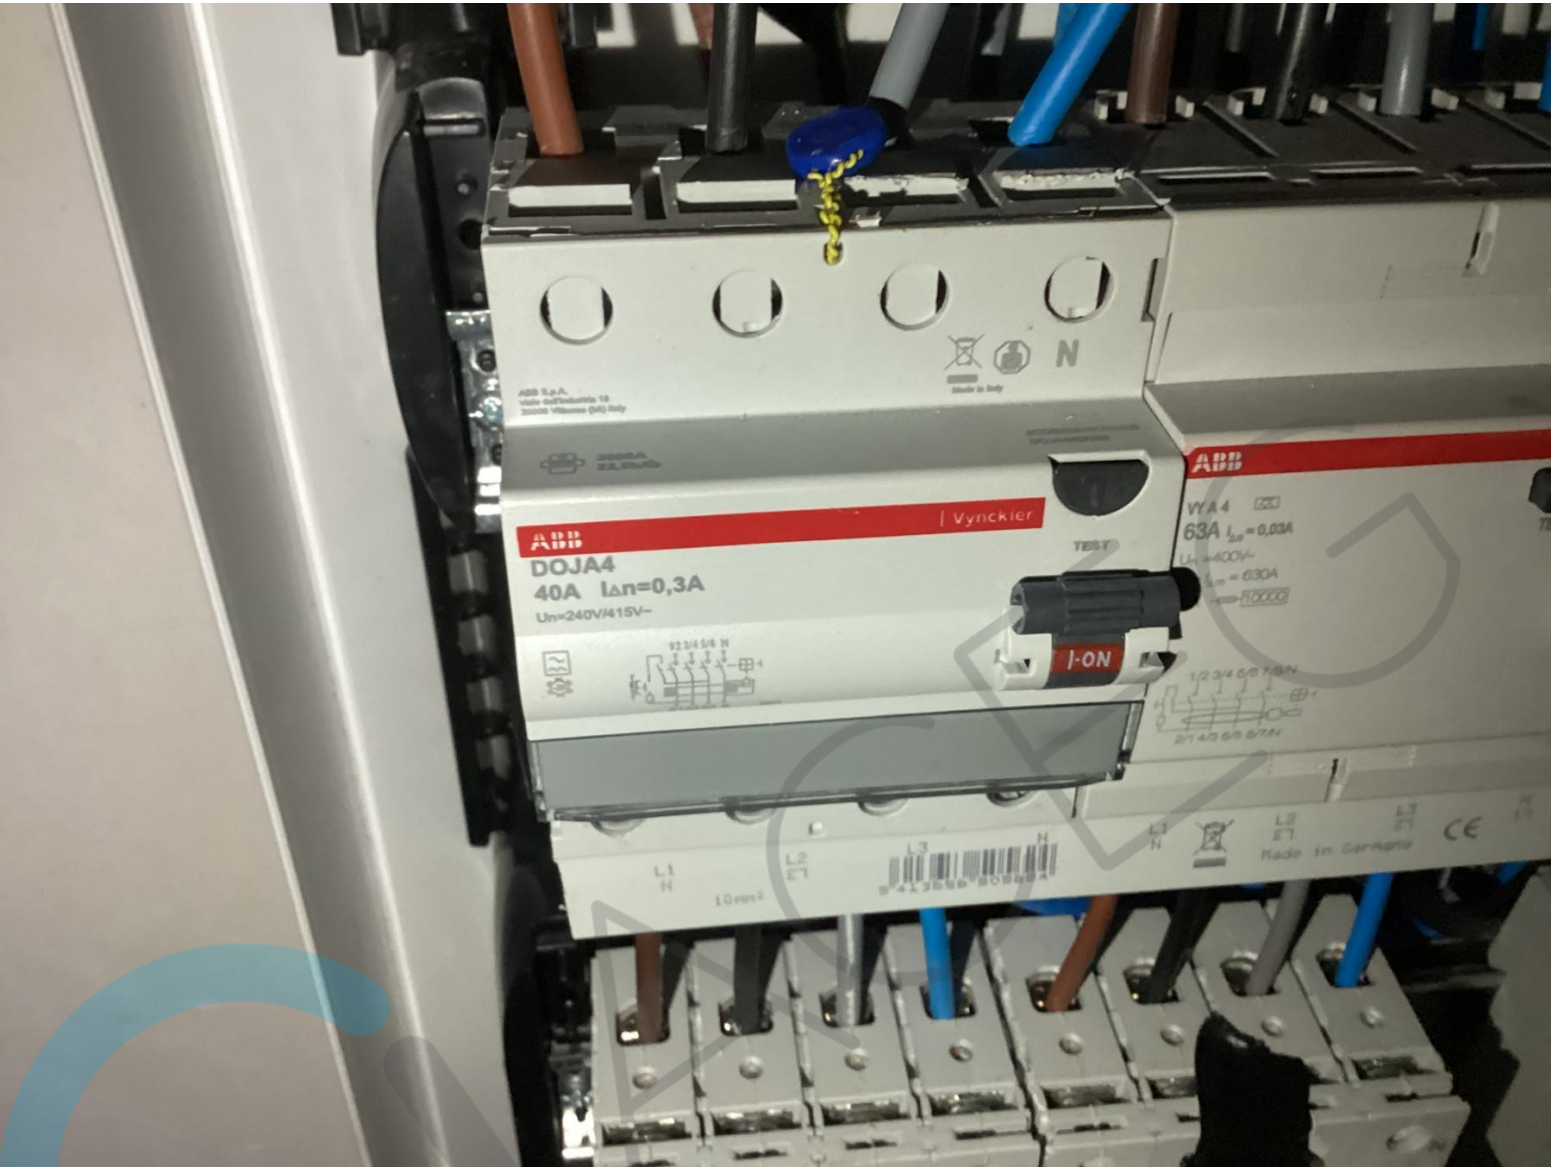















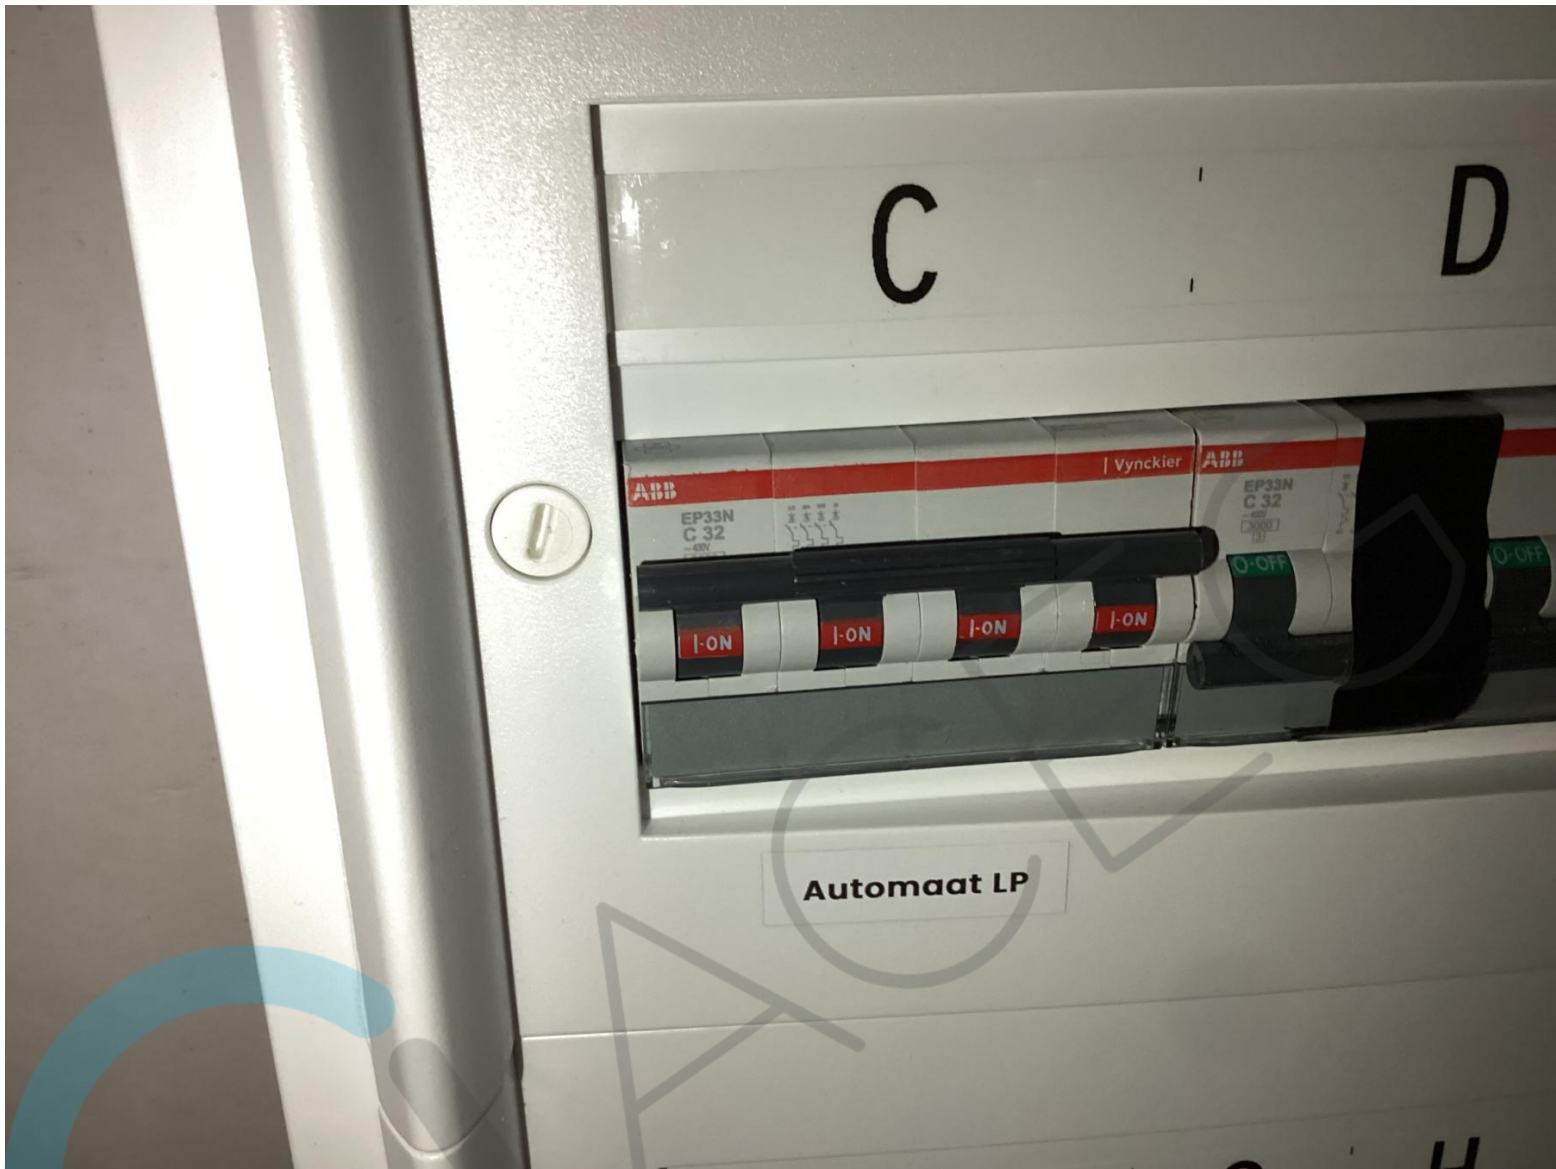

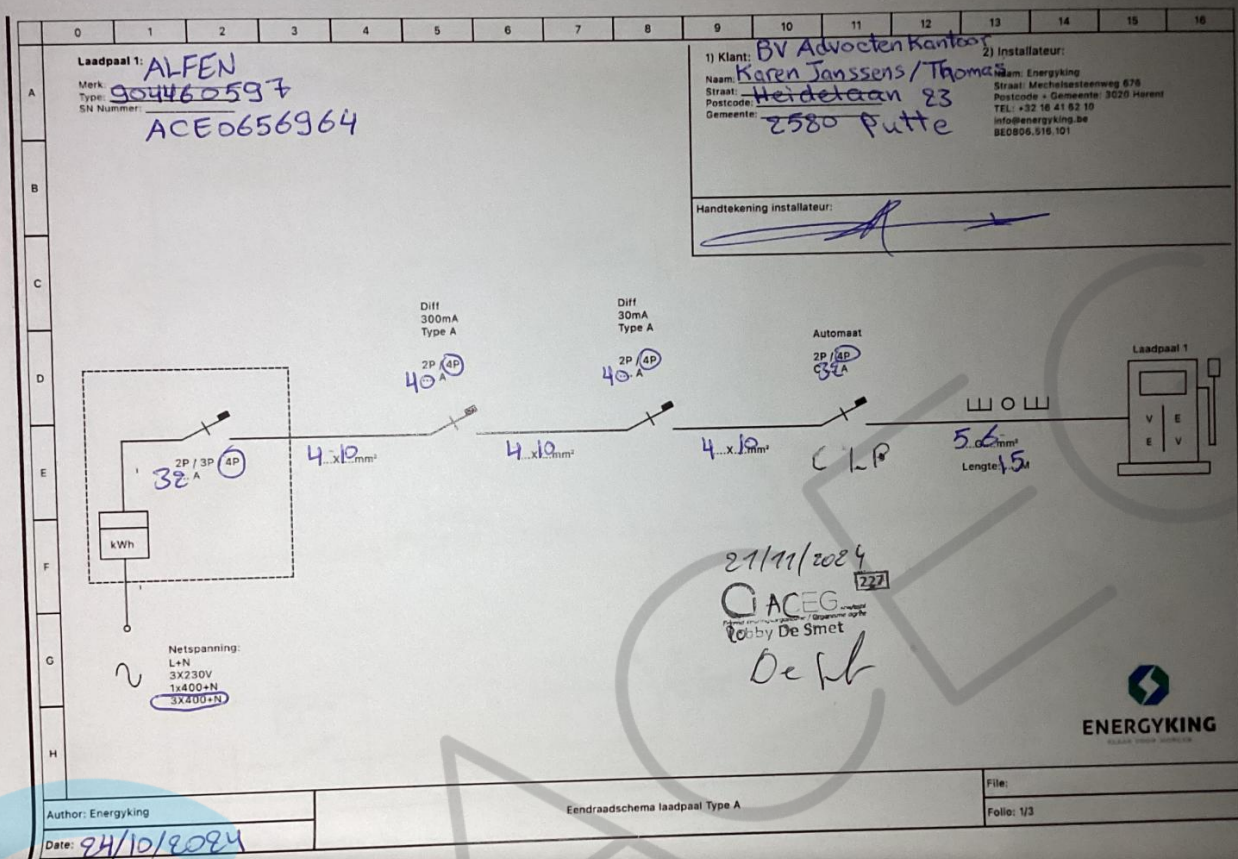

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Ruimte: <u>Berging</u> Gelieve de symbolen te schrappen die niet passen! Buitenmuur: <u>Parking</u> Locatie: <u>Pasimontse</u> Ruimte: <u>Zolder</u> Gelieve de symbolen te schrappen die niet passen!																			
B																				
C																				
D																				
E																				
F																				
G																				
H																				
I																				
J																				
1) Klant: <u>BV Advocaten Kantoor</u> Naam: <u>Karen Janssens</u> Straat: <u>Heidelaan</u> NR: <u>23</u> Postcode: <u>2580</u> Gemeente/Stad: <u>Putte</u>										2) Installateur: Naam: <u>Energiking / Koning BV</u> Straat: <u>Mechelsesteenweg 676</u> Postcode + Gemeente: <u>3020, Herent</u> TEL: <u>+32 16 41 63 10</u> info@energiking.be BE0806.516.101										
Author: Energiking Date: <u>9/11/2024</u>										Handtekening medewerker Energiking: 										
Situatieschema laadpalen										Plaats: <u>Putte</u>										

27/11/2024

GACE
Robb De Smet
De M

Date: 29/10/24



