



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. XS 13 / 110 - NO
ADRES INSTALLATIE: Theodor Van De putteweg 11
Putte
EIGENAAR: Claes Herman
Adres: op adres
OPDRACHTGEVER: André Wauters
Adres: Hollandsstraat 163, Scherpenheuvel
BEHEERDER/UITBATER:
Adres:
EAN-code:

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 28.03.13 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen : Woning
Aard installatie: Bestaande Verzekering - Overdracht van eigendom - Tijdelijk - Renovatie
Elektrische installatie: voor na 1.10.81 ; niet Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning: mono 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 300mA
Netaftakkabel (type & sectie): bestaande mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 4x10 mm²
Type aardelektrode: bus-baren pennen horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT TN IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand : 20 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 300mA ; DS 40A 30mA : 1 - 81

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 - 276 - 276bis.
en de technische procedure(s) TPR-E12P - E12P
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht: a b c d e f g h
Legende : a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen : ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

Aarding bus voldoet niet meer vervangen door pennen

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATER: zie keerzijde.


4. BESLUIT : De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór 28.03.13
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Xavier Schueremans
agent-onderzoeker



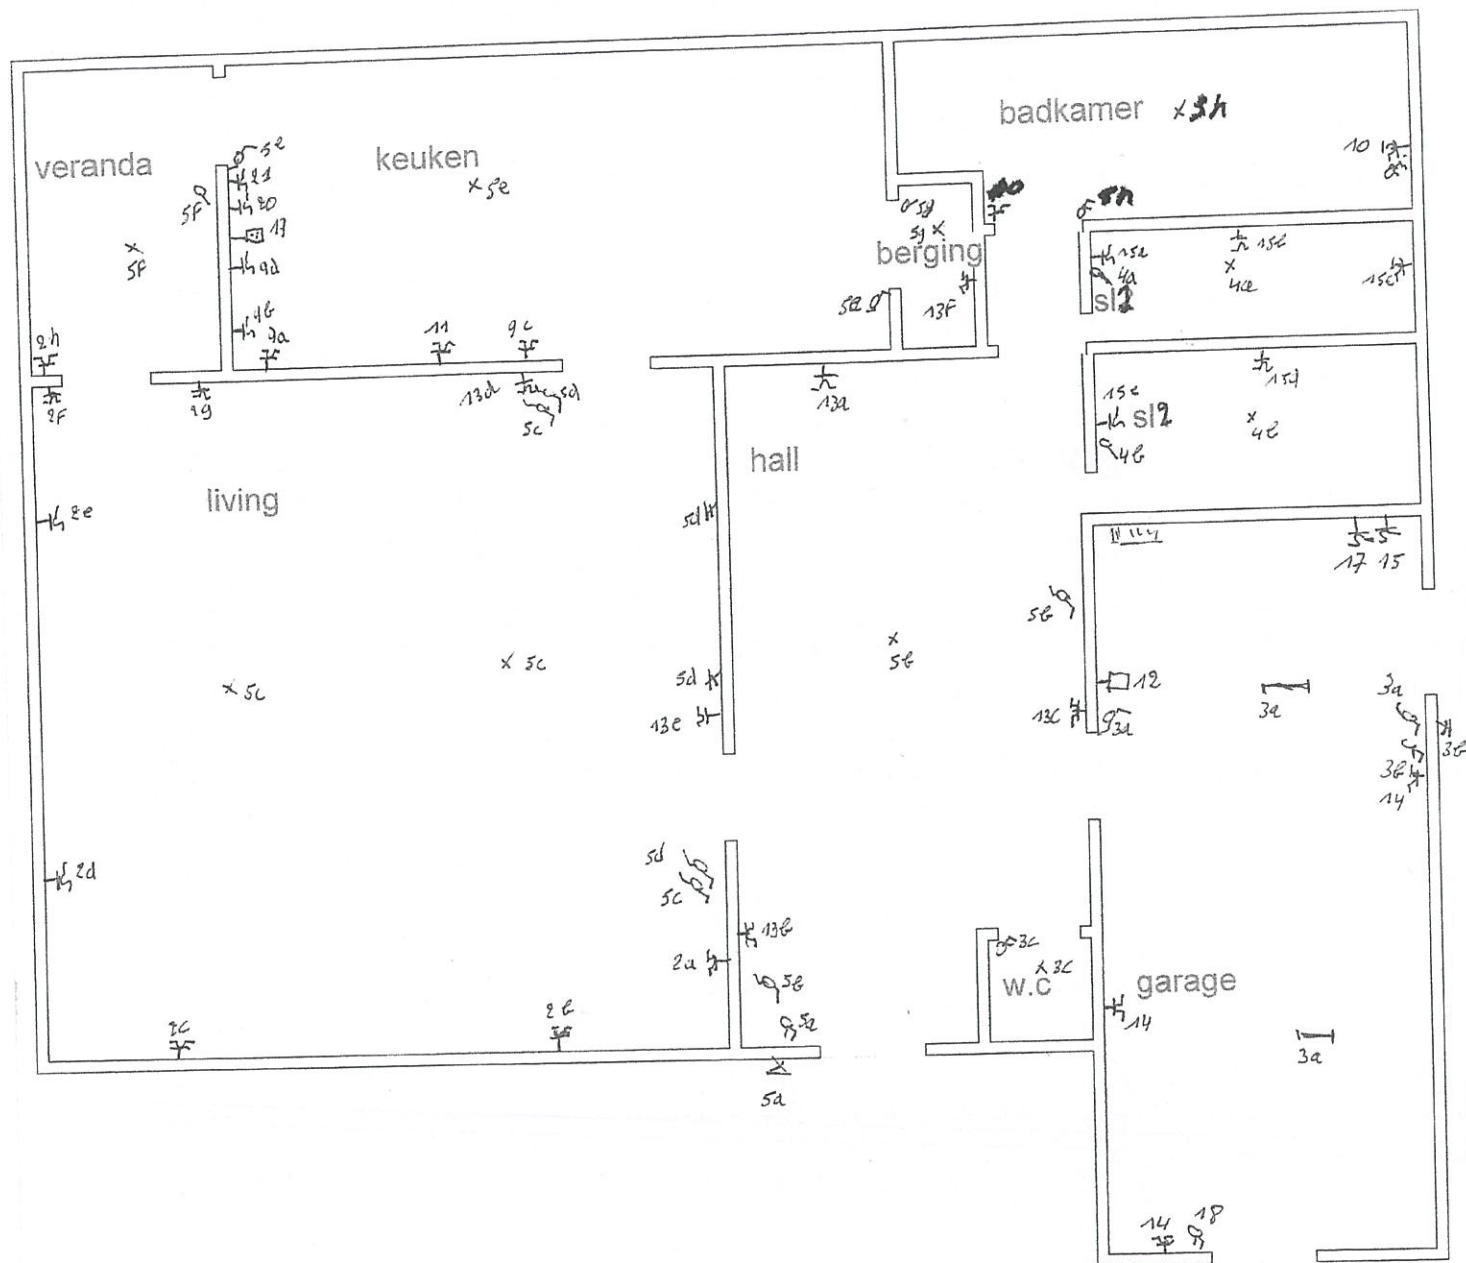

claes herman
theodoor van den putte
2580 putte

Helleg

CONTROLEORGANISME
2820 BOINHEIDEN
Xavier Schuermans
agent-onderzoeker

ANDRE WOUTERS
ELEKTRICITEITSELEKTRO
HOLLANDSTRAAT 163
SCHRIEK 015/75.46.85

zolder

Na QF
Na
Na

UP

claes herman
theodoor van den putteweg 11
2580 putte

ELECTRO - ANDRE
WOUTERS 2223
HOLLANDSTRAAT: 163
SCHRIEK 015 754685

Heerey

CONTROLEORGANISME
RTR
2820 BOKKELDEN
Xavier Schreijns
spont-onderzoeker
